

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 30.12.0243

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
07.12.0004	07/12/2021	30/12/2021	359.967,41

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 11.13.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	12.598,86
1000.60.00.0.	ISS	10.799,02
1000.70.00.0.	IRRF	5.399,51

Total da Retenção: (R\$) 28.797,39

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	331.170,02

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0010924

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
07/12/2021	07.12.0004	359.967,41	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 11.13.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 30/12/2021	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 359.967,41	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 787	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 29/12/2021	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 29/12/2021	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 301114601		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	811.634,400	1.811.634,40	0

Jaguaribe, 30 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 30.12.0243

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
07120004	07/12/2021	GLOBAL	359.967,41	06.08.01/2015	060801/2015	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 11.13.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **TELEFONE:** 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
30120243	359.967,41	359.967,41	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
30/12/2021	359.967,41	28.797,39	331.170,02

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	12.598,86
1000.60.00.0.	ISS	10.799,02
1000.70.00.0.	IRRF	5.399,51
Total da Retenção: (R\$)		28.797,39

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	331.170,02

Jaguaribe, 30 de Dezembro de 2021


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:09:20
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.917.000.113.231
VALOR TOTAL	331.170,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR.AUTENTICACAO	9.471.612.885.D2D.250
-----------------	-----------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência 2917-3
Conta corrente 113231-8
Valor 331.170,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 30/12/2021 18:59:55
JE689885 IVONETE S S PAULO 30/12/2021 19:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE S S PAULO.

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 81452021

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**Conta:** 1-1**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 103**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil**Proj\Atividade:** 1007 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1113000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015**Nº Empenho:** 07120004 - Global**Nº Nota Fiscal:** 787**Dt Emissão NF:** 29/12/2021**Dt Liquidação:** 30/12/2021**Data Expedição:****Mês Referência:** DEZEMBRO/2021**Vlr. Liquidação:** R\$359.967,41

(TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** E**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	0	1,00	1.811.634,40	359.967,41

Flavio de Macieiros Soares
 Controlador e Chefe Geral do Município
 PORTARIA: 277/2021 CBE: 062.075.403.44

Responsável pela elaboração

Ordenador de Despesa

Avaliação e Visto

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 07.12.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
07/12/2021	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 06.08.01/2015	060801/2015	81452021

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 11.13.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
103	419.165,49	359.967,41	59.198,08

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRR	UND	1	1.811.634,40	359.967,41
Total dos Itens: (R\$)					359.967,41

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **07120004**. A(os) **7 de Dezembro de 2021**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 81452021

Data: 07/12/2021

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 103**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil**Proj\Atividade:** 1007 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infantil**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1113000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$359.967,41**Histórico**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	1,00	1.811.634,40	359.967,41

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
NFS-e
787

Data e Hora da Emissão	29/12/2021 11:47:57	Competência	12/2021	Código de Verificação	301114601
Número do RPS		No. NFS-e substituída	786	Local da Prestação	JAGUARIBE - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	WM CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	WM CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA-CE
Endereço e CEP	R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I,784 - CAJAZEIRAS CEP: 60.864-205				
Complemento		Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	P.M. DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE
Endereço e CEP	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AO PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE - CEI: 51.235.55060/74.

VALOR DA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 359.967,41
 VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 359.967,41
 BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5% DE 60% DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 BASE DE CÁLCULO DO ISS (I) (60%): R\$ 215.980,44
 VALOR DO ISS (5% DE I): R\$ 10.799,02
 VALOR DO INSS (3,5%) SOBRE O TOTAL: R\$ 12.598,86
 VALOR DO IR (1,5%) R\$ 5.399,51

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	CE20160014859
----------------	--	------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)	5.399,51	INSS(R\$)	12.598,86	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	359.967,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	359.967,41
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	143.986,97
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	17.998,37	0-Nenhum	Base de Cálculo	215.980,44
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	10.799,02	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	331.170,02	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

AVISOS

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://nfs.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://nfs.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação
 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 5.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura

PORTARIA Nº 2021/2021 CPF 343.347.003-49



WM CONSTRUÇÕES

RECIBO

R\$ 359.967,41

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de **Trezentos e cinquenta e nove mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos.**

Referente ao pagamento da 15ª medição conforme a NFS-e 787

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição: Valor Bruto R\$ 359.967,41

Valor do IR R\$ 5.399,51

Valor do ISS 5% de 60% do serviço R\$ 10.799,02

Valor do INSS 3,5% sobre o total R\$ 12.598,86

Liquido da Nota Fiscal R\$ 331.170,02

CEI: 51.235.55060/74

CONTRATO Nº 06.08.01/2015

CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE

Fortaleza-CE _____ de _____ de 20__.

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 2917-3

C/C: 113231-8

WM CONSTRUÇÕES LTDA

José Márcio Pinheiro Loureiro

WM CONSTRUÇÕES

Administrador


ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 06.08.01/2015	Modalidade da Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Nº da Licitação 06.08.01/2015	Data do Contrato 02 de Dezembro de 2015
Contratado(a) WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Endereço Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza - CE.	
Nº do CNPJ/ CPF. 02.364.381/0001-13	Nº do Telefone/Fax (85) 3099.8250 / (85) 3295.0550
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.	
Valor Global R\$ 1.811.634,40 (um milhão oitocentos e onze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 240 (duzentos e quarenta) dias

Jaguaribe-CE, 02 de Dezembro de 2015.



Maria Aparecida Lima de Assis
Secretária de Educação
CONTRATANTE



Lisandra Dellga Araújo Peixoto Machado
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 15ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I			
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 29/12/21	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 06.08.01/2015	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE		INÍCIO DA OBRA: 01/04/2016	PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/02/2022
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SUPERESTRUTURA	100,00%		
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	88,01%		
ESQUADRAS	0,86%	PREVISTO:	
SISTEMAS DE COBERTURA	92,83%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	49,08%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	52,32%		
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	32,55%		
PINTURA	0,00%		
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	41,40%		
DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	93,44%		
INSTALAÇÃO SANITARIA	86,41%		
LOUÇAS E METAIS	0,00%		
INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	62,43%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	18,08%		
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V	14,90%		
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	0,00%		
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	94,90%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,06%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 29 de dezembro de 2021.			

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 2021 CPF 743.347.003-49

Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 29 DE DEZEMBRO DE 2021



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 15ª MEDIÇÃO

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.2b	Telha sanduiche metálica		
	Área projetada =	1.104,16	m ²
	Percentual executado no período =	90,00%	
	Área da medição =	993,74	m²
7.3	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado		
	Quantidade projetada =	83,40	m
	Percentual executado no período =	90,00%	
	Quantidade da medição =	75,06	m
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr,24, desenvolvimento 25 cm		
	Quantidade projetada =	258,90	m
	Percentual executado no período =	90,00%	
	Quantidade da medição =	233,01	m

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rafael Pinheiro Figueiredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEIREDO
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0

Francisco Eder Cavalcante Barroso
Francisco Eder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal de
Educação e Cultura
PORTARIA 201/2021 CPF 743.347.003-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO

DADOS DA OBRA

Nº DA OBRA 104

TÍTULO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I							
Nº ALVARÁ 104	Nº CEI	Nº PROCESSO	INSC. CREA 20210844848	INSC. EMPRESA 0	DATA DO ALVARÁ 01/12/2021	VAL. DO ALVARÁ 31/12/2022	DATA DE APROV. / /
ENDEREÇO DA OBRA							
LOGRADOURO RUA SÁTIRO COSTA, Nº SN			BAIRRO JOÃO PAULO II			CEP 63475000	
LOTEAMENTO		ÁREA DA LOC.		QUADRA		LOTE	
DADOS DO CONTRIBUINTE							
CONTRIBUINTE 447591 WM CONSTRUÇÕES LTDA							
ENDEREÇO RUA CENTRAL			, 784		BAIRRO CAJAZEIRAS		
RESPONSÁVEL PELA OBRA							
PROJETO (AUTOR)			CREA/CAU		ART 20210844848		
CÁLCULO (RESPONSÁVEL)			CREA/CAU		ART		
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)			CREA/CAU		ART		
ESPECIFICAÇÕES DA OBRA							
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	DESTINO ESPECIAL	PADRÃO	QTD. CASAS 0	QTD. APT. 0	QTD. SALAS 0	QTD. LOJAS 0	QTD. UND. 1
PATRIMÔNIO PÚBLICO	ELEVADOR NÃO	PAVIMENTOS 1	ZONEAMENTO	TX. OCUP. 0,00	TX. PERM. 0,00	IND. APROV. 0,00	CATEG. DE USO
LATITUDE	LONGITUDE	ÁREA TÉRREO 0,00	ÁREA COBERTURA 0,00	ÁREA GARAGEM 0,00	ÁREA SUBSOLO 0,00	ÁREA PLAYG. 0,00	
ÁREA PAV. 0,00	ÁREA TERRENO 2400,00	ÁREA CONSTRUÍDA 1.311,97	ÁREA TOT. CONST. 0,00	ÁREA TERR. OBR. 2.400,00	ÁREA CONST. OBR. 1.311,97		
VALOR OBRA 2.955.759,74	INÍCIO DA OBRA 15/03/2016	INÍCIO PRORR. / /	FIM DA PRORR. / /	FINAL DA OBRA 31/12/2022	VENCIMENTO / /	CÓD. VALIDAÇÃO 01201134M13530000104	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II

Contribuinte: WM CONSTRUCOES LTDA

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.235.55060/74

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	<input type="text" value="WM CONSTRUCOES LTDA"/>
Endereço	
Logradouro (Av, Rua, etc) *	<input type="text" value="CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1"/>
Bairro	<input type="text" value="JOAO PAULO II"/>
CEP *	<input type="text" value="63475000"/>
Telefone	(<input type="text"/>) <input type="text"/>
Fax	(<input type="text"/>) <input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av, Rua, etc)	<input type="text" value="RUA CENTRAL 784 SALAS 04 E 05"/>
Bairro	<input type="text" value="CAJAZEIRAS"/>
CEP	<input type="text" value="80864205"/>
Vínculo do Responsável *	<input type="text" value="Construtora"/>
Vínculo com o Governo *	<input type="text" value="Outros"/>
FPAS *	<input type="text" value="507 - INDUSTRIAS,INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL"/>
CNAE *	<input type="text" value="45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)"/>
Natureza Jurídica *	<input type="text" value="2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA"/>
Dados da Obra	
A.R.T./C.R.E.A.	<input type="text" value="00000000"/>
Local	<input type="text"/>
Alvará	<input type="text"/>
Data do Início da Obra *	<input type="text" value="02/12/2015"/> (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/>
Tipo da Obra	<input type="text"/>
Uso da Obra	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Demolição	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/>
Tipo da Demolição	<input type="text"/>
Uso da Demolição	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>

Comercial

Área Existente	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Reforma	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Demolição	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área Resultante	<input type="text" value="0,00"/>	m ²

Residencial

Área Existente	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Reforma	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Demolição	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área Resultante	<input type="text" value="0,00"/>	m ²

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REALIZADO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74



VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REALIZADO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74

ORÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 1 NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
VHM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

PAR 11081/2014/FNDE

DATA: quinta-feira, 29 de dezembro de 2021
PERÍODO: 01/12/2021 a 29/12/2021

VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REALIZADO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74

VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REALIZADO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO					
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERC. (%)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
10.2	Camada requadrada e=2,0cm - preço fixado	m ²	667,22	22,34	14.905,65		667,22	667,22	100,00%						
10.3	Camada requadrada e=2,0cm - preço reajustado	m ²	517,86	32,76	16.965,06		-	-	0,00%						
10.4	Camada requadrada e=2,0cm - preço reajustado	m ²	285,83	65,89	25.423,24		-	-	0,00%						
10.5	Preo cerâmico antiderroçante PEV V - 40x40cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m ²	23,72	54,96	1.303,85		-	-	0,00%						
10.6	Preo cerâmico antiderroçante PEV V - 40x40cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m ²	214,48	105,65	22.659,81		-	-	0,00%						
10.7	Piso vinílico em resina e=2,0mm	m ²	345,77	105,50	36.078,74		-	-	0,00%						
10.8	Piso vinílico em resina e=2,0mm	m ²	394,54	121,96	48.130,29		-	-	0,00%						
10.9	Piso portatiel de alvenaria, borniza integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	27,90	196,11	5.472,47		-	-	0,00%						
10.10	Soliera em granito cinza anodizada, 1x15cm, E=2CM	m	22,88	196,11	4.447,77		-	-	0,00%						
10.11	Soliera em granito cinza anodizada, 1x15cm, E=2CM	m	95,70	94,55	9.248,44		-	-	0,00%						
10.12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	m ²	1,77	146,25	258,86		-	-	0,00%						
10.13	Pavimento em concreto desarmado com junta plástica a cada 1,20m e=7cm	m ²	492,41	36,18	17.815,39		492,41	492,41	100,00%						
10.14	Superfície em bloco intertravado de concreto, e=6,0cm, fck 15mpa, alvenarias sobre cimento de areia	m ²	28,22	26,78	755,73		28,22	28,22	100,00%						
10.15	Piso laje de alvenaria em placas pré-moldadas - Simpa	m ²	4,86	124,65	603,80		4,86	4,86	100,00%						
10.16	Mezuzo (Guaia) de concreto pré-moldado, requadrado com argamassa, incluindo esquadro e reatiro	m	6,84	124,65	1.076,98		-	-	0,00%						
10.17	Escudo de área e=13cm	m ²	330,28	39,65	13.095,60		330,28	330,28	100,00%						
10.18	Granel Moladas em placas	m ²	7,60	88,94	675,94		7,60	7,60	100,00%						
10.19	Granel Moladas em placas	m ²	416,68	19,25	8.021,09		-	-	0,00%						
11	PINTURA				163.214,52										
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	2.489,11	30,91	76.523,52		-	-	0,00%						
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m ²	2.489,11	15,61	38.855,01		-	-	0,00%						
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m ²	498,03	13,44	6.693,52		-	-	0,00%						
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demão em esquadros de madeira	m ²	165,75	23,61	3.913,36		-	-	0,00%						
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demão em rodamento de madeira	m ²	24,25	576,18	13.971,21		-	-	0,00%						
11.6	Pintura esmalte 02 demãos	m ²	239,76	59,94	14.272,24		-	-	0,00%						
11.7	Aplicação de tinta esmalte acrílico em teto, uma demão af. 04/2014	m ²	498,03	7,34	3.655,54		-	-	0,00%						
11.8	Emassamento de paredes externas, 2 demãos, cinzenta acrílica (fresca a 1,14 x 2,50m D x 11,43m A)	m ²	2.489,11	6,28	15.631,61		-	-	0,00%						
11.9	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m ²	229,76	78,24	18.279,20		-	-	0,00%						
11.10	Calafate em tres demãos em paredes	m ²	651,40	7,54	4.911,56		-	-	0,00%						
11.11	CAIXA D'AGUA 30.000L				1.876,25										
11.12	Emassamento de paredes externas, 2 demãos, cinzenta acrílica (fresca a 1,14 x 2,50m D x 11,43m A)	m ²	89,73	20,91	1.876,25		-	-	0,00%						
12	TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS				42.733,94										
12.1	TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS				42.733,94										
12.2	Bola de lodo de concreto armado 11,2"	und	36,00	3,73	134,88		-	-	0,00%						
12.3	Conex. flexível plástico 1,2" - 30cm	und	18,00	3,10	55,80		-	-	0,00%						
12.4	Tubo de descarga VDE 80mm	und	36,00	20,64	742,24		-	-	0,00%						
12.5	Capo de bacia siso cromado com console para sanitário	und	28,00	7,85	220,20		-	-	0,00%						
12.6	Luva soldável com fresa 35mm - 3/4"	und	15,00	4,25	63,75		-	-	0,00%						
12.7	Cap soldável 20mm	und	1,00	1,50	1,50		-	-	0,00%						
12.8	Adaptador soldável com flange 1/2" para caixa d'água - 100mm - 3/4" - fornecimento e instalação soldável com flange 1/2" para caixa d'água - 80mm - 3/4" - fornecimento e instalação	und	4,00	502,36	2.009,44		-	-	0,00%						
			4,00	359,05	1.350,20		-	-	0,00%						
					17.694,90										

Francisco Elder Cavalcante Barros
Secretário Municipal da Educação e Cultura
Rua: ... nº 7340/003-49

PD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONVENIO: 15
DATA: 01/12/2021 A 29/12/2021



OBRA: CRIAR E PROLONGAR A TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:
VM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.254.381/0001-13

PAR 11681/2014/FNDE
PERÍODO: quarta-feira, 29 de dezembro de 2021

DATA: 01/12/2021 A 29/12/2021

VALORES (R\$)	VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.993,76	RECURSOS RESQUILIBRO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74	TOTAL: 2.955.759,74
VALOR DA MEDIÇÃO: 1.504.946,47	VALOR DA MEDIÇÃO: 1.504.946,47
PERÍODO: 1.504.946,47	PERÍODO: 1.504.946,47
VALORES (R\$) <td>VALORES (R\$)</td>	VALORES (R\$)
ACUM. ANTERIOR: 2.136.993,76	ACUM. ANTERIOR: 2.136.993,76
ACUM. ATUAL: 359.967,41	ACUM. ATUAL: 359.967,41

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATO		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)					
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
12.52	Te. redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	5,00	60,59	302,95	-	-	5,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.53	Te. redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	3,00	60,59	181,77	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.54	Te. redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	3,00	113,38	340,14	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.55	Te. redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	113,38	226,76	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.56	Joelho 90 soldavel com bucha de sítalo - 28mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	6,00	13,55	81,30	-	-	6,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.57	Joelho de redução 90 soldavel - com bucha de sítalo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	81,00	14,61	1.183,41	81,00	81,00	81,00	100,00%	1.183,41	1.183,41	1.183,41	1.183,41	1.183,41	1.183,41
12.58	Univ. de redução soldavel com bucha sítalo - 25mm 1/2", fornecimento e instalação	und	11,00	6,30	69,30	11,00	11,00	11,00	100,00%	69,30	69,30	69,30	69,30	69,30	69,30
12.59	Te. redução 90 soldavel com bucha central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	22,00	11,55	254,10	22,00	22,00	22,00	100,00%	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10
12.60	Te. soldavel com bucha tubo sítalo central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	2,00	8,39	16,78	2,00	2,00	2,00	100,00%	16,78	16,78	16,78	16,78	16,78	16,78
12.61	Coar. de tampa - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	4,41	4,41	1,00	1,00	1,00	100,00%	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
12.62	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2" fornecimento e instalação	und	3,00	3,09	9,27	3,00	3,00	3,00	100,00%	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
12.63	Te. soldavel 1/2" fornecimento e instalação	und	2,00	12,42	24,84	2,00	2,00	2,00	100,00%	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
12.64	Te. soldavel 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	12,42	12,42	1,00	1,00	1,00	100,00%	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42
12.65	Tubo PVC soldavel O 20mm, fornecimento e instalação	m	46,19	3,86	176,38	46,19	46,19	46,19	100,00%	176,38	176,38	176,38	176,38	176,38	176,38
12.66	Tubo PVC soldavel O 25mm, fornecimento e instalação	m	219,27	7,83	1.717,79	219,27	219,27	219,27	100,00%	1.717,79	1.717,79	1.717,79	1.717,79	1.717,79	1.717,79
12.67	Tubo PVC soldavel O 32mm, fornecimento e instalação	m	57,32	12,98	743,96	57,32	57,32	57,32	100,00%	743,96	743,96	743,96	743,96	743,96	743,96
12.68	Tubo PVC soldavel O 50mm, fornecimento e instalação	m	111,79	14,95	1.671,82	111,79	111,79	111,79	100,00%	1.671,82	1.671,82	1.671,82	1.671,82	1.671,82	1.671,82
12.69	Tubo PVC soldavel O 50mm, fornecimento e instalação	m	14,95	20,50	306,46	14,95	14,95	14,95	100,00%	306,46	306,46	306,46	306,46	306,46	306,46
12.70	Tubo PVC soldavel O 50mm, fornecimento e instalação	m	27,16	16,55	450,96	27,16	27,16	27,16	100,00%	450,96	450,96	450,96	450,96	450,96	450,96
12.71	Tubo PVC soldavel O 50mm, fornecimento e instalação	m	47,05	29,50	1.388,81	47,05	47,05	47,05	100,00%	1.388,81	1.388,81	1.388,81	1.388,81	1.388,81	1.388,81
12.72	Tubo PVC soldavel O 110mm, fornecimento e instalação	m	121,92	32,55	3.969,12	121,92	121,92	121,92	100,00%	3.969,12	3.969,12	3.969,12	3.969,12	3.969,12	3.969,12
12.73	Tubo PVC soldavel O 110mm, fornecimento e instalação	m	59,15	35,99	2.118,81	59,15	59,15	59,15	100,00%	2.118,81	2.118,81	2.118,81	2.118,81	2.118,81	2.118,81
12.74	Registro de esfera 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	153,95	153,95	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.75	Registro de esfera com canoale cromada - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	210,89	210,89	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.76	Registro esfera borboim bruto PVC - fornecimento e instalação	und	1,00	11,09	11,09	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.77	Registro bruto de esfera 2" fornecimento e instalação	und	8,00	184,95	1.479,60	-	-	8,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.78	Registro bruto de esfera 2" fornecimento e instalação	und	2,00	396,01	792,02	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.79	Registro bruto de esfera 3" fornecimento e instalação	und	1,00	614,74	614,74	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.80	Registro de esfera com canoale cromada - 1/2" fornecimento e instalação	und	2,00	1.029,00	2.058,00	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.81	Registro de esfera com canoale cromada - 1/2" fornecimento e instalação	und	5,00	210,89	1.054,45	-	-	5,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
12.82	Registro de esfera com canoale cromada - 3/4" fornecimento e instalação	und	21,00	143,09	3.004,89	-	-	21,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
13	Registro de esfera com canoale cromada 3/4" fornecimento e instalação	und	15,00	101,76	1.526,40	-	-	15,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
13.1	DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS				12.066,18										
13.2	Tubo de PVC Ø100mm fornecimento e instalação	m	237,27	18,69	4.417,83	237,27	237,27	237,27	100,00%	4.417,83	4.417,83	4.417,83	4.417,83	4.417,83	4.417,83
13.3	Tubo de PVC Ø150mm fornecimento e instalação	m	107,14	37,12	3.978,11	107,14	107,14	107,14	100,00%	3.978,11	3.978,11	3.978,11	3.978,11	3.978,11	3.978,11
13.4	Caixa curta 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	372,00	10,45	3.883,50	372,00	372,00	372,00	100,00%	3.883,50	3.883,50	3.883,50	3.883,50	3.883,50	3.883,50
13.5	Boleto 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	28,00	37,30	1.044,40	28,00	28,00	28,00	100,00%	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40
13.6	Boleto 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	4,00	15,87	63,48	4,00	4,00	4,00	100,00%	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48
13.7	Te. sanitário - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	und	4,00	48,41	193,64	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
13.8	Capo sanitário (formato abelha) de ferro fundido Ø 100mm	und	24,00	37,96	909,84	24,00	24,00	24,00	100,00%	909,84	909,84	909,84	909,84	909,84	909,84
13.9	Caixa de areia sem grelha Ø800mm	und	1,00	77,45	77,45	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				36.113,05										
14.1	Caixa esfondada 150x150x50mm	und	19,00	20,28	385,32	-	-	19,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
14.2	Caixa esfondada 150x185x75mm	und	1,00	70,86	70,86	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-	-

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO E CULTURA
Eduardo S. S. S. S.
FONE: 3377-3377
E-MAIL: 3377-3377

7M 4

RD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DE MEDIÇÃO



OBRA: CRIARTE PROLIFERANÇA TIPO 1 NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:
NM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO: 116931/2014/FNDE

VALORES (R\$)

CONTRATO:	REQUISITO	REQUISITO	VALORES (R\$)
116931/2014/FNDE	116931/2014/FNDE	116931/2014/FNDE	2.136.983,76
DATA:	DATA:	DATA:	819.365,98
01/12/2013 a 29/12/2021	01/12/2013 a 29/12/2021	01/12/2013 a 29/12/2021	2.955.759,74
PERIODO:	PERIODO:	PERIODO:	1.450.814,27
01/12/2013 a 29/12/2021	01/12/2013 a 29/12/2021	01/12/2013 a 29/12/2021	1.504.945,47
VALOR DA MEDIÇÃO:	VALOR DA MEDIÇÃO:	VALOR DA MEDIÇÃO:	359.967,31
VALORES (R\$)	VALORES (R\$)	VALORES (R\$)	359.967,31

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERIODO	ACUM. ANTERIOR
14.3	Bata higienico, PVC 100x100x40mm	und	30,00	11,68	350,40	-	-	0,00%	-	-	-
14.4	Tubo PVC de ventilação sere normal 50mm	m	29,00	8,99	260,71	30,00	30,00	100,00%	131,11	311,11	311,11
14.5	Tubo PVC de ventilação sere normal 50mm	m	12,00	3,69	44,28	185,60	185,60	100,00%	6.679,74	6.679,74	6.679,74
14.6	Tubo PVC nudo 40mm - fornecimento e instalação	m	118,87	11,89	1.411,47	118,87	118,87	100,00%	1.533,42	1.533,42	1.533,42
14.7	Tubo PVC nudo 50mm - fornecimento e instalação	m	169,90	19,06	3.238,29	169,90	169,90	100,00%	3.238,29	3.238,29	3.238,29
14.8	Tubo PVC nudo 75mm - fornecimento e instalação	m	166,99	24,33	4.062,87	166,99	166,99	100,00%	4.062,87	4.062,87	4.062,87
14.9	Tubo PVC nudo 100mm - fornecimento e instalação	m	78,01	37,13	2.911,31	78,01	78,01	100,00%	1.411,31	1.411,31	1.411,31
14.10	CABA DE ABRIGAMENTO SINTÉTICO	und	7,00	123,48	864,36	7,00	7,00	100,00%	864,36	864,36	864,36
14.11	CABA DE ESPECIÇÃO ESPECIO	und	17,00	315,35	5.360,95	17,00	17,00	100,00%	5.360,95	5.360,95	5.360,95
14.12	CABA DE PASSAGEM MODULAR	und	1,00	124,28	124,28	1,00	1,00	100,00%	124,28	124,28	124,28
14.13	Sanitário em alvenaria 2.40x2,40m	und	1,00	2.106,20	2.106,20	-	-	0,00%	-	-	-
14.14	Fora caixa 120x220mm	und	1,00	1.801,72	1.801,72	-	-	0,00%	-	-	-
14.15	Bacia sanitaria PVC - caixa 50mm - 40	und	1,00	2,96	2,96	38,00	38,00	100,00%	218,50	218,50	218,50
14.16	Canos PVC 90 curva - 50mm - fornecimento e instalação	und	97,00	2,01	195,97	97,00	97,00	100,00%	485,97	485,97	485,97
14.17	Canos PVC 90 curva - 75mm - fornecimento e instalação	und	15,00	7,88	118,20	15,00	15,00	100,00%	118,20	118,20	118,20
14.18	Canos PVC 90 curva - 100mm - fornecimento e instalação	und	24,00	20,72	497,52	24,00	24,00	100,00%	497,52	497,52	497,52
14.19	Meio PVC 45 - 100mm - fornecimento e instalação	und	7,00	14,55	101,85	7,00	7,00	100,00%	101,85	101,85	101,85
14.20	Meio PVC 45 - 75mm - fornecimento e instalação	und	9,00	11,84	106,56	9,00	9,00	100,00%	106,56	106,56	106,56
14.21	Meio PVC 45 - 50mm - fornecimento e instalação	und	23,00	7,03	162,15	23,00	23,00	100,00%	162,15	162,15	162,15
14.22	Meio PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	50,00	5,21	260,50	50,00	50,00	100,00%	260,50	260,50	260,50
14.23	Meio PVC 90 - 100mm - fornecimento e instalação	und	26,00	15,01	390,26	26,00	26,00	100,00%	390,26	390,26	390,26
14.24	Meio PVC 90 - 75mm - fornecimento e instalação	und	34,00	8,44	286,96	34,00	34,00	100,00%	286,96	286,96	286,96
14.25	Meio PVC 90 - 50mm - fornecimento e instalação	und	24,00	6,55	157,20	24,00	24,00	100,00%	157,20	157,20	157,20
14.26	Meio PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	5,27	99,57	19,00	19,00	100,00%	99,57	99,57	99,57
14.27	Meio PVC 90 - 30mm - fornecimento e instalação	und	65,00	5,03	326,95	65,00	65,00	100,00%	326,95	326,95	326,95
14.28	Juvelco PVC emolas 100mm 50mm - fornecimento e instalação	und	23,00	48,93	1.123,25	23,00	23,00	100,00%	1.123,25	1.123,25	1.123,25
14.29	Juvelco PVC emolas 100mm 75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	44,29	88,58	2,00	2,00	100,00%	88,58	88,58	88,58
14.30	Juvelco PVC emolas 100mm 100mm - fornecimento e instalação	und	19,00	45,56	865,64	19,00	19,00	100,00%	865,64	865,64	865,64
14.31	Juvelco PVC emolas 75mm 50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	30,39	151,95	5,00	5,00	100,00%	151,95	151,95	151,95
14.32	Juvelco PVC emolas 75mm 75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	30,39	60,78	2,00	2,00	100,00%	60,78	60,78	60,78
14.33	Juvelco PVC emolas 50mm 50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	8,43	42,15	5,00	5,00	100,00%	42,15	42,15	42,15
14.34	Juvelco PVC emolas 50mm 75mm - fornecimento e instalação	und	5,00	9,43	47,15	5,00	5,00	100,00%	47,15	47,15	47,15
14.35	Revestimento PVC 20mm 20mm - fornecimento e instalação	und	1,00	11,53	11,53	1,00	1,00	100,00%	11,53	11,53	11,53
14.36	Revestimento PVC 20mm 50mm - fornecimento e instalação	und	15,00	11,53	172,95	15,00	15,00	100,00%	172,95	172,95	172,95
14.37	Revestimento PVC 50mm 50mm - fornecimento e instalação	und	21,00	27,56	576,76	21,00	21,00	100,00%	576,76	576,76	576,76
14.38	Revestimento PVC 100mm 100mm - fornecimento e instalação	und	2,00	87,78	175,52	2,00	2,00	100,00%	175,52	175,52	175,52
14.39	Revestimento PVC 150mm 100mm - fornecimento e instalação	und	18,00	11,98	215,64	18,00	18,00	100,00%	215,64	215,64	215,64
14.40	Revestimento PVC 20mm 75mm - fornecimento e instalação	und	4,00	28,84	115,36	4,00	4,00	100,00%	115,36	115,36	115,36
15	LOUÇAS E METAIS				58.790,47				0,00	0,00	0,00
15.1	Bacia sanitaria vogue plus - Linha conforto com abertura, cor branco gelo, codigo 15114747 - 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	1.307,24	2.614,48	-	-	0,00%	-	-	-
15.2	Bacia sanitaria convencional - pl - 40mm - fornecimento e instalação	und	4,00	313,98	1.255,92	-	-	0,00%	-	-	-
15.3	Bacia sanitaria convencional, codigo 17111 DECA ou equivalente com assessoria, fornecimento e instalação	und	20,00	569,86	11.397,20	-	-	0,00%	-	-	-
15.4	Bacia sanitaria convencional, codigo 17111 DECA ou equivalente com assessoria, fornecimento e instalação	und	26,00	386,75	10.053,50	-	-	0,00%	-	-	-
15.5	Assento potelcer com abertura frontal vogue plus, linha conforto, cor branco gelo, codigo 15114747 - 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	991,76	1.983,52	-	-	0,00%	-	-	-
15.6	Assento potelcer com abertura frontal vogue plus, linha conforto, cor branco gelo, codigo 15114747 - 40mm - fornecimento e instalação	und	4,00	341,00	1.364,00	-	-	0,00%	-	-	-
15.7	Assento potelcer com abertura frontal vogue plus, linha conforto, cor branco gelo, codigo 15114747 - 40mm - fornecimento e instalação	und	26,00	648,96	16.672,96	-	-	0,00%	-	-	-
15.8	Assento potelcer com abertura frontal vogue plus, linha conforto, cor branco gelo, codigo 15114747 - 40mm - fornecimento e instalação	und	4,00	148,45	593,80	-	-	0,00%	-	-	-

PROF. EIDER CAVALANTE BARRAO
SECRETARIO MUNICIPAL DA
Educação e Cultura
13/12/2021 13:37:003-49



PROF. EIDER CAVALANTE BARRAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:
VWV CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
PAR 11681/2014/FNDE

CONTRATO:
REAJUSTE
TOTAL

OBRA: CEECHE PROVAJANCA TIPO I NO BAIRRO SOLO FAUZO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 02.394.281/0001-13

DATA:
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021

RECURSOS ACUMULADOS:
TOTAL

PERÍODO
01/12/2021 A 29/12/2021

PERÍODO ANTERIOR

VALORES (R\$)
REAJUSTE
TOTAL

CONTRATUAL
P. UNIT.
R\$

P. TOTAL R\$

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERC. N%
VALORES (R\$)
ACUM. ANTERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. N%	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
15.9	Lavatório de canto suspenso com meia, linha 1/2 código 101.17. DECA ou equivalente, com ventosa eixo e encaixe fixação cromados	und	4,00	113,78	455,04			4,00	0,00%	-	-
15.10	Como suporte para 1/2" x 1/2" com colina suspensa, código 1915 DECA ou equivalente	und	6,00	133,45	800,70			6,00	0,00%	-	-
15.11	Cabo de emboar oval cor branco gelo, código 137. DECA ou equivalente em Danubia e complementos (valvula, selo e engate fixação cromados) exceto torneira	und	22,00	156,59	3.444,98			22,00	0,00%	-	-
15.12	Cabo industrial 5/8x30 profundidade 30" - HD80MON, ou equivalente, com selão em metal cromado 1,12x1,12", valvula em metal cromado tipo americana 3,1,27x1,12", para 1/2" - fornecimento e instalação	und	3,00	160,18	480,54			3,00	0,00%	-	-
15.13	Caba inox embutir 40x34x17cm, caba 3, baseço aço inoxidável, com valvula, FRANJE, ou equivalente, com selão em metal cromado 1,12x1,12", valvula em metal cromado tipo americana 3,1,27x1,12", para 1/2" - fornecimento e instalação	und	15,00	208,33	3.124,95			15,00	0,00%	-	-
15.14	Dispenser saboneteiro linha excelence, código 7099, melhoramento ou equivalente	und	26,00	18,30	475,80			26,00	0,00%	-	-
15.15	Decorar tábua linha excelence, código 7007, melhoramento ou equivalente	und	26,00	18,99	493,74			26,00	0,00%	-	-
15.16	Barra de apoio, linha confort, código 23101.080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	und	8,00	29,71	237,68			8,00	0,00%	-	-
15.17	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, caba ou equivalente	und	4,00	14,30	57,20			4,00	0,00%	-	-
15.18	Barra de apoio de diâmetro 1/2", em 1", linha confort código 2315.1ESC	und	1,00	76,31	76,31			1,00	0,00%	-	-
15.19	Barra metálica com pintura azul para proteção dos esbochos e crivete infantil 8x1,14"	und	20,60	105,94	2.282,26			20,60	0,00%	-	-
15.20	Barreira embutir em plástico tipo PVC, 27x45x20cm, burguete ou equivalente	und	4,00	540,95	2.163,80			4,00	0,00%	-	-
15.21	Torneira elétrica Kenway, LORENZETTI ou equivalente	und	2,00	243,46	486,92			2,00	0,00%	-	-
15.22	Torneira elétrica font metal, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	und	4,00	251,54	1.006,16			4,00	0,00%	-	-
15.23	Torneira acabamento para registro pequeno linha 1/2", código 4900.027 80 DECA ou equivalente (Barra chusato) dica ou equivalente	und	15,00	148,99	2.248,85			15,00	0,00%	-	-
15.24	Torneira para colônia de mesa boca movei 1/2" código 1167.027 DECA ou equivalente	und	15,00	141,18	2.117,70			15,00	0,00%	-	-
15.25	Torneira de parede de teto geral para lavatório ou banheiro	und	11,00	211,06	2.321,66			11,00	0,00%	-	-
15.26	Torneira para lavatório de mesa boca boca 1/2", código 1193, Dica ou equivalente	und	32,00	70,54	2.257,28			32,00	0,00%	-	-
15.27	Chuveiro mixer ducha, LORENZETTI, com mangueira padrão/destaquer para ducha (tubo grande 40 x 1/2" cor branco gelo, código 19.03, DECA ou equivalente incluso torneira cromada)	und	15,00	88,49	1.327,35			15,00	0,00%	-	-
15.28		und	7,00	516,61	3.616,27			7,00	0,00%	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL										
16.1	Abrigo para Central de GP, em concreto	m ²	1,42	412,80	586,30			1,42	100,00%	0,00	2.065,17
16.2	Tra metálica para ventilação com encaixe em alumínio	m ²	0,15	680,83	102,13			0,15	100,00%	-	586,30
16.3	Idoc em aço galvanizado O 3/4" x 7' encaixe em alumínio	m	43,00	18,20	782,60			43,00	100,00%	-	782,60
16.4	Pré-moldado de concreto 1,70m	m	42,00	13,34	560,28			42,00	100,00%	-	560,28
16.5	Forma para concreto 1,70m	und	3,00	80,26	240,78			3,00	100,00%	-	240,78
16.6	Valvula esfera O 3/4" NPT 300	und	4,00	62,43	249,72			4,00	100,00%	-	249,72
16.7	União 3/4" NPT 300	und	3,00	52,28	156,84			3,00	100,00%	-	156,84
16.8	Modelo 3/4" NPT 300	und	6,00	53,28	319,68			6,00	100,00%	-	319,68
16.9	Modelo 1/2" NPT 300	und	4,00	11,28	45,12			4,00	100,00%	-	45,12
16.10	Modelo 1/4" NPT 300	und	6,00	25,48	152,88			6,00	100,00%	-	152,88
16.11	Te redudo 3/4" x 1/2"	und	1,00	7,06	7,06			1,00	100,00%	-	7,06
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	und	1,00	4,78	4,78			1,00	100,00%	-	4,78
16.13	Linha de redução 1/4" x 1/2"	und	2,00	6,24	12,48			2,00	100,00%	-	12,48
16.14	Linha de redução 1/4" x 1/2"	und	2,00	0,75	1,50			2,00	100,00%	-	1,50
16.15	União 1/2" x 1/4"	und	2,00	5,00	10,00			2,00	100,00%	-	10,00
16.16	Reduzidor 1/2" escudo com manometro	und	2,00	49,23	98,46			2,00	100,00%	-	98,46

Francisco Edo Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 241, CPF 743.347.003-49

5/14

ND

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REAJUSTE: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74



ORÇ. CANCEL. RECONFINANÇ. TPO: NO BARRIO SOLO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
WVA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001.11

CONVENIO: PAR 11681/2014/FNDE

DATA: quarta-feira, 29 de dezembro de 2021

VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REAJUSTE: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74

PERÍODO: 01/12/2021 A 29/12/2021

VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REAJUSTE: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74

PERÍODO: 01/12/2021 A 29/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R\$%	VALOR DA MEDIÇÃO:	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERC. R\$%	PERÍODO
16.17	Manometro HP7 1,4" 0,4 200 Psi	und	1,00	74,54	74,54	-	-	2,00	0,00%	-	-
16.18	Mangueira flexível	m	2,00	17,56	35,12	-	-	2,00	0,00%	-	-
16.20	Regulador 2º estágio com regulagem	und	2,00	45,23	90,46	-	-	2,00	0,00%	-	-
16.21	Peca de sinalização em PVC cod 1 - (248x248) modelo Sumar	und	1,00	88,58	88,58	-	-	1,00	0,00%	-	-
16.22	Peca de sinalização em PVC cod 5 - (248x248) modelo infravermelho	und	1,00	88,58	88,58	-	-	1,00	0,00%	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO				50.954,18					0,00	9.138,93
17.1	Extintor CO2 6kg	und	7,00	257,51	1.802,57	-	-	7,00	0,00%	-	-
17.2	Extintor CO2 12kg	und	1,00	87,70	87,70	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.3	Calhota 45 galvanizado 2 1/2"	und	2,00	37,61	75,22	2,00	2,00	100,00%	0,00%	75,22	75,22
17.4	Calhota 45 galvanizado 2 1/2"	und	7,00	37,61	263,27	7,00	7,00	100,00%	0,00%	263,27	263,27
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	und	1,25	175,10	218,88	-	-	1,25	0,00%	-	-
17.6	Regulador duplo com regulagem 2 1/2"	und	10,00	61,63	616,30	-	-	10,00	0,00%	-	-
17.7	7º acm galvanizado 2 1/2"	und	4,00	119,40	477,60	4,00	4,00	100,00%	0,00%	477,60	477,60
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 1,2"	und	90,96	91,50	8.322,84	90,96	90,96	100,00%	0,00%	8.322,84	8.322,84
17.9	Adaptador 1/2" - 3/4" - 1/2"	und	3,00	109,04	327,12	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.10	Chave para comando de manobra tipo Eroz Espado - dupla 1 1/2 x 1 1/2"	und	2,00	662,63	1.325,26	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.11	Extintor CO2 12kg	und	2,00	232,73	465,46	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.12	Extintor CO2 12kg	und	4,00	69,20	276,80	-	-	4,00	0,00%	-	-
17.13	Manobra 1 1/2" 15mm	und	1,00	51,63	51,63	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.14	Manobra 1 1/2" 15mm	und	1,00	177,28	177,28	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.15	Manobra 1 1/2" 15mm	und	3,00	533,24	1.599,72	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.16	Manobra 1 1/2" 15mm	und	2,00	248,64	497,28	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.17	Regulador duplo com regulagem 2 1/2"	und	3,00	97,16	291,48	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.18	Regulador duplo com regulagem 2 1/2"	und	5,00	304,54	1.522,70	-	-	5,00	0,00%	-	-
17.19	Manobra 1 1/2" 15mm	und	2,00	480,00	960,00	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.20	Manobra 1 1/2" 15mm	und	4,00	474,90	1.899,60	-	-	4,00	0,00%	-	-
17.21	Manobra 1 1/2" 15mm	und	4,00	26,56	106,24	-	-	4,00	0,00%	-	-
17.22	Manobra 1 1/2" 15mm	und	3,00	26,56	79,68	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.23	Manobra 1 1/2" 15mm	und	2,00	3.627,98	7.255,96	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.24	Manobra 1 1/2" 15mm	und	2,00	86,58	173,16	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.25	Manobra 1 1/2" 15mm	und	15,00	86,58	1.298,70	-	-	15,00	0,00%	-	-
17.26	Manobra 1 1/2" 15mm	und	3,00	86,58	259,74	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.27	Manobra 1 1/2" 15mm	und	8,00	86,58	692,64	-	-	8,00	0,00%	-	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				238.742,66					0,00	35.572,70
18.1	Quadro de distribuição de embudo completo (para 08 disjuntor monofases, com 12 pontos de distribuição e para proteção contra eletrocussão para cozinha, sala, banheiro e acessórios)	und	2,00	449,80	899,60	-	-	2,00	0,00%	-	-
18.2	Quadro de distribuição de embudo completo (para 18 disjuntor monofases, com barramento para as fases neutro e terra protegido, pintura eletrolítica epoxi, conexão C, porta, trinco e acessórios)	und	3,00	446,80	1.340,40	-	-	3,00	0,00%	-	-
18.3	Quadro de distribuição de embudo completo (para 24 disjuntor monofases, com barramento para as fases neutro e terra protegido, pintura eletrolítica epoxi, conexão C, porta, trinco e acessórios)	und	2,00	487,95	975,90	-	-	2,00	0,00%	-	-
18.4	Quadro de medição - fornecimento e instalação	und	1,00	820,76	820,76	-	-	1,00	0,00%	-	-
18.5	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	23,00	14,18	326,14	-	-	23,00	0,00%	-	-
18.6	Disjuntor unipolar termomagnético 15A	und	7,00	14,18	99,26	-	-	7,00	0,00%	-	-
18.7	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	und	19,00	14,18	269,42	-	-	19,00	0,00%	-	-
18.8	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	und	26,00	14,18	368,68	-	-	26,00	0,00%	-	-
18.9	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	und	4,00	14,18	56,72	-	-	4,00	0,00%	-	-
18.10	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	und	2,00	14,18	28,36	-	-	2,00	0,00%	-	-
18.11	Disjuntor unipolar termomagnético 50A	und	3,00	14,18	42,54	-	-	3,00	0,00%	-	-
18.12	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	und	3,00	14,18	42,54	-	-	3,00	0,00%	-	-
18.13	Disjuntor unipolar termomagnético 80A	und	2,00	14,18	28,36	-	-	2,00	0,00%	-	-

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação e Cultura
PORTARIA Nº 271/2021 DE 27/12/2021

10/14

201

201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)
CONTRATO: 2.136.393,76
REALIZADO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74

EMPRESA EXECUTORA:
WVI CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11681/2014/FNDE

VALORES (R\$)
PERÍODO: 01/12/2011 A 28/12/2011
SALDO: 1.504.945,47
ACUM. ANTERIOR: 359.967,43
ACUM. ATUAL: 1.450.814,27

OBRA: OBRAS DE PROVA/ANCA TIPO I NO BALDEO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-11

DATA: Quarta-feira, 29 de dezembro de 2011

PERÍODO: 01/12/2011 A 28/12/2011

VALOR DA MEDIÇÃO: 1.504.945,47

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R\$	VALOR DA MEDIÇÃO		
				P. UNIT. R\$	R\$			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18.14	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	und	8,00	126,40	1.011,20	0,00	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
18.15	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	und	82,30	40,79	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.16	Disjuntor unipolar termomagnético 100A	und	73,03	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.18	Disjuntor bipolar termomagnético 100A	und	3,00	92,30	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.19	Interruptor bipolar 20 - 25A	und	2,00	72,30	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.20	Interruptor bipolar 25 - 32A	und	1,00	72,30	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.21	Interruptor tripolar 20 - 25A	und	1,00	311,29	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.22	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	und	14,00	1.124,31	15.463,36	14,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.23	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	und	8,00	1.208,50	9.688,00	8,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.24	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
18.24	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 3,4") inclusive conexões	m	572,20	5,53	3.164,27	572,20	-	-	-	-	100,00%	3.164,27	3.164,27	3.164,27
18.25	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 1,7") inclusive conexões	m	386,20	7,01	2.281,08	386,20	-	-	-	-	100,00%	2.281,08	2.281,08	2.281,08
18.26	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 1,1") inclusive conexões	m	463,40	9,59	4.400,35	463,40	-	-	-	-	100,00%	4.400,35	4.400,35	4.400,35
18.27	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 2,7") inclusive conexões	m	12,80	22,56	288,27	12,80	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.28	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 2,7") inclusive conexões	m	21,60	29,79	643,46	21,60	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.29	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 4") inclusive conexões	m	18,80	50,53	949,96	18,80	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.30	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 5,7") inclusive conexões	m	5,50	86,56	476,19	5,50	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.31	Eletroduto PVC flexível corrugado ref:090 (DN 6,7") inclusive conexões	m	27,20	115,41	3.139,15	27,20	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.32	Eletroduto ferro galvanizado DN 25mm (1,7") inclusive conexões	m	45,70	35,18	1.607,73	45,70	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.33	Eletroduto ferro galvanizado DN 32mm (1,7") inclusive conexões	m	29,50	39,30	1.169,55	29,50	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.34	Eletroduto ferro galvanizado DN 37mm (1,7") inclusive conexões	m	80,60	33,35	2.688,82	80,60	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.35	Eletroduto ferro galvanizado DN 100mm (4") inclusive conexões	m	14,70	109,28	1.603,46	14,70	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.36	Ceratas PVC flexível corrugado e instalado	und	2,00	17,49	34,98	2,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.37	Ceratas PVC flexível corrugado e instalado	und	3,00	20,91	62,73	3,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.38	Caixa de passagem 20x30cm em alumínio com tampa de ferro fundido tipo leve	und	2,00	194,28	388,56	2,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.39	Caixa de passagem 40x40cm em alumínio com tampa de ferro fundido tipo leve	und	2,00	212,83	425,66	2,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.40	Caixa invencível atarrumado 250x250x600mm	und	2,00	60,75	121,50	2,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)													
	Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70C, camara de proteção em PVC não inflamável, com isolamento de 2,5mm, tensão nominal de 250V, encontrado classe 3, flexível com as seguintes características:													
18.41	#2,5 mm² - preço instalado	m	2.565,15	2,89	7.413,57	2.565,15	-	-	-	-	100,00%	7.413,57	7.413,57	7.413,57
18.42	#4 mm² - preço instalado	m	253,20	4,19	1.063,13	253,20	-	-	-	-	100,00%	1.063,13	1.063,13	1.063,13
18.43	#6 mm² - preço instalado	m	2.019,80	8,90	2.254,37	2.019,80	-	-	-	-	100,00%	2.254,37	2.254,37	2.254,37
18.44	#10 mm² - preço instalado	m	628,48	10,61	6.664,08	628,48	-	-	-	-	100,00%	6.664,08	6.664,08	6.664,08
18.45	#16 mm² - preço instalado	m	1.902,22	13,94	26.528,86	1.902,22	-	-	-	-	100,00%	26.528,86	26.528,86	26.528,86
18.46	#25 mm² - preço instalado	m	186,93	18,71	3.486,50	186,93	-	-	-	-	100,00%	3.486,50	3.486,50	3.486,50
18.47	#35 mm² - preço instalado	m	42,50	25,10	1.076,75	42,50	-	-	-	-	100,00%	1.076,75	1.076,75	1.076,75
18.48	#50 mm² - preço instalado	m	15,30	32,88	5.130,40	15,30	-	-	-	-	100,00%	5.130,40	5.130,40	5.130,40
18.49	#70 mm² - preço instalado	m	51,30	48,03	2.462,94	51,30	-	-	-	-	100,00%	2.462,94	2.462,94	2.462,94
18.50	#95 mm² - preço instalado	m	52,00	60,99	3.171,48	52,00	-	-	-	-	100,00%	3.171,48	3.171,48	3.171,48
18.51	#120 mm² - preço instalado	m	153,00	83,18	12.789,09	153,00	-	-	-	-	100,00%	12.789,09	12.789,09	12.789,09
18.52	Estracalha flex tipo U 100x100mm com Tampa, inclusive conexões	m	0,70	96,16	67,31	0,70	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.53	Estracalha flex tipo U 100x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	18,70	11,15	212,25	18,70	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
18.54	Estracalha flex tipo U 100x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	3,90	11,71	45,16	3,90	-	-	-	-	0,00%	-	-	-

Secretaria Municipal da Educação e Cultura
Rua...
Portaria 209...
11/14

11/14

41

41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 2.136.993,76
REQUISIÇÃO: 819.365,98



EMPRESA EXECUTORA: WVI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.281/0001-13

CONVÊNIO: PAR 11681/2014/FNDE

MEDICAO No. 13
DATA: 02/12/2021 A 20/12/2021

PERÍODO: 2.955.759,74

VALORES (R\$)
TOTAL: 1.450.814,27
SALDO: 1.504.945,47

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PENC. R\$%	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. UNIT. R\$			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
18.55	Eletrocabla fixa tipo U 150x50mm com Tampa. Inclusive conexões	m	6,00	15,80	15,80	94,80	-	-	6,00	0,00%	-	-	
18.56	Eletrocabla fixa tipo U 200x50mm com Tampa. Inclusive conexões	m	4,30	19,03	19,03	81,83	-	-	4,30	0,00%	-	-	
18.57	Eletrocabla fixa tipo U 300x75mm com Tampa. Inclusive conexões	m	4,50	24,24	24,24	108,66	-	-	4,50	0,00%	-	-	
18.58	Eletrocabla fixa tipo U 500x50mm com Tampa. Inclusive conexões	m	4,50	35,20	35,20	158,40	-	-	4,50	0,00%	-	-	
18.59	Eletrocabla fixa tipo U 50x20mm com Tampa. Inclusive conexões	m	6,00	5,80	5,80	34,80	-	-	6,00	0,00%	-	-	
18.60	Eletrocabla fixa tipo U 75x20mm com Tampa. Inclusive conexões	m	1,20	7,03	7,03	8,43	-	-	1,20	0,00%	-	-	
18.61	Eletrocabla fixa tipo U 75x75mm com Tampa. Inclusive conexões	m	2,00	8,45	8,45	16,90	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.62	Soporte vertical eletrocabla 120x150mm	und	2,00	9,40	9,40	18,80	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.63	Soporte vertical eletrocabla 120x200mm	und	2,00	9,40	9,40	18,80	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.64	Soporte vertical eletrocabla 120x150mm	und	3,00	9,40	9,40	28,20	-	-	3,00	0,00%	-	-	
18.65	Soporte vertical eletrocabla 70x125mm	und	3,00	5,79	5,79	17,37	-	-	3,00	0,00%	-	-	
18.66	Soporte vertical eletrocabla 70x154mm	und	4,00	5,79	5,79	23,16	-	-	4,00	0,00%	-	-	
18.67	Soporte vertical eletrocabla 70x157mm	und	3,00	5,79	5,79	17,37	-	-	3,00	0,00%	-	-	
18.68	Soporte vertical eletrocabla 70x187mm	und	20,00	5,79	5,79	115,80	-	-	20,00	0,00%	-	-	
18.69	Soporte vertical eletrocabla 70x90mm	und	11,00	5,79	5,79	63,69	-	-	11,00	0,00%	-	-	
18.70	Soporte vertical eletrocabla 90x114mm	und	4,00	8,12	8,12	32,52	-	-	4,00	0,00%	-	-	
18.71	Tua caixa perfurada 50mm	und	29,00	5,41	5,41	151,48	-	-	29,00	0,00%	-	-	
18.72	Tua caixa perfurada 75mm	und	4,00	5,79	5,79	23,16	-	-	4,00	0,00%	-	-	
18.73	Iluminação e tomadas	und	128,00	21,57	21,57	3.361,24	-	-	128,00	0,00%	-	-	
18.74	Tombada universal circular 2P+1-10A cor branca completa	und	18,00	18,04	18,04	684,72	-	-	18,00	0,00%	-	-	
18.75	Tombada universal ocular 2P+1-20A cor branca completa	und	35,00	17,29	17,29	605,24	-	-	35,00	0,00%	-	-	
18.76	Interruptor simples 10A completa	und	111,00	192,43	192,43	21.359,72	-	-	111,00	0,00%	-	-	
18.77	Luminária 2x36w completa	und	17,00	178,56	178,56	3.035,52	-	-	17,00	0,00%	-	-	
18.78	Luminária 2x36w completa	und	40,00	93,00	93,00	3.720,00	-	-	40,00	0,00%	-	-	
18.79	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálica 70w	und	15,00	135,10	135,10	2.026,50	-	-	15,00	0,00%	-	-	
18.80	Projeto com lâmpada de vapor metálica 150w	und	4,30	822,09	822,09	3.535,96	-	-	4,30	0,00%	-	-	
18.81	Arredos de laboratório com 1 unidade fluorescente compacta de 90w	und	1,00	822,09	822,09	822,09	-	-	1,00	0,00%	-	-	
18.82	Arredos de laboratório com 1 unidade fluorescente compacta de 90w	und	16,00	92,38	92,38	1.478,08	-	-	16,00	0,00%	-	-	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1.784,70								
19.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				3,86								
19.2	Tubo PVC Soldavel O 25mm, inclusive conexões	m	146,00	3,86	3,86	575,14	-	-	146,00	100,00%	-	-	
19.3	Tubo 45 - 25mm, fornecimento e instalado	und	37,00	5,34	5,34	123,58	-	-	37,00	100,00%	-	-	
19.4	Caixa de arca 60x20x60cm em Avenara - ENECIDO	und	14,00	5,64	5,64	78,96	-	-	14,00	100,00%	-	-	
20	INSTALAÇÃO DE BARRA ESTRUTURADA				138.826,39								
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				865,11								
20.2	Panel Panel 10" - 24 portas, categoria 6	und	2,00	429,05	429,05	858,10	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.3	Panel Panel 10" - 48 portas, categoria 7	und	1,00	1.012,06	1.012,06	1.012,06	-	-	1,00	0,00%	-	-	
20.4	Switch de 24 portas	und	1,00	9.013,90	9.013,90	9.013,90	-	-	1,00	0,00%	-	-	
20.5	Switch de 48 portas	und	2,00	16.279,20	16.279,20	32.558,40	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.6	Barras 110 para rack 10" 100 portas	und	18,00	757,56	757,56	13.636,08	-	-	18,00	0,00%	-	-	
20.7	Caixa de cabos simples	und	2,00	35,89	35,89	71,78	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.8	Caixa de cabos vertical, fechada	und	2,00	35,89	35,89	71,78	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.9	Caixa de cabos vertical, fechada	und	2,00	35,89	35,89	71,78	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.10	Caixa de cabos superior, fechado	und	2,00	35,89	35,89	71,78	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.11	Panel gerenciador de cabos	und	1,00	52,79	52,79	52,79	-	-	1,00	0,00%	-	-	
20.12	Panel gerenciador de cabos	und	1,00	64,37	64,37	64,37	-	-	1,00	0,00%	-	-	
20.13	Barras de desmontamento perfuradas	und	2,00	290,26	290,26	580,52	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.14	Kit cas. mteadores	und	2,00	88,34	88,34	176,68	-	-	2,00	0,00%	-	-	
20.15	CABOS EM PAR TRANÇADOS				13.873,44								
20.16	Cabo UTP categoria 5e	m	1.44,00	9,63	9,63	1.386,72	-	-	1.44,00	0,00%	-	-	
20.17	Cabo UTP categoria 5e	m	3.191,30	13,73	13,73	43.807,41	-	-	3.191,30	0,00%	-	-	
20.18	Cabo coaxial	m	450,00	12,18	12,18	5.481,00	-	-	450,00	0,00%	-	-	

Francisco Elder Carneiro Barroso
Secretário Municipal da Educação e Cultura
PORTARIA 289/2021 CPF 733.347.003-49

12/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:
WVY CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
PAR 11681/2014/FNDE

MEDIÇÃO No. 13

REALIZANTE
818.365,98

1.450.815,27

OBRA: CRECHE PROVISÓRIA TIPO I NA BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 02.364.183/0001-13

DATA:
QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO:
01/12/2011 A 29/12/2011

TOTAL
2.955.759,24

1.504.945,47

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

PERÍODO

PERÍODO

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC R%	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
20 16	Cabo de concreto - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	und	100,00	57,73	5.773,00					100,00	0,00%	-	-
20 17	Rioche UTP IDC - 4 pares/m	und	96,00	167,94	16.122,24					96,00	0,00%	-	-
20 18	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 -	und	72,00	4,49	323,28					72,00	0,00%	-	-
20 19	Pilha 2x4" - 1 modulo R-45	und	24,00	10,68	256,32					24,00	0,00%	-	-
20 20	Pilha 2x4" - 2 modulo R-45	und	16,00	7,28	116,48					16,00	0,00%	-	-
20 21	Conector de tv tipo F (caxaxi)	und	16,00	10,68	170,88					16,00	0,00%	-	-
20 22	Pilha 2x4" para tv/tel	und	1,00	34,06	34,06					1,00	0,00%	-	-
20 23	CAIXAS E ACESSÓRIOS	und	7,00	194,28	1.359,96					7,00	0,00%	-	-
20 24	Caixa de passagem em alumínio 20x30x12 com Tampa de ferro (unidade)	und	48,00	9,46	454,08					48,00	0,00%	-	-
20 25	Caixa de passagem PVC 4x2" - CORNICHIMENTO E INSTALAÇÃO	und	48,00	10,29	494,08					48,00	0,00%	-	-
20 26	ETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1" - INCLUSIVE CONEXÕES	m	14,70	8,10	119,13					14,70	0,00%	-	-
20 27	ETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1,1/2" - INCLUSIVE CONEXÕES	m	154,70	8,10	1.253,07					154,70	0,00%	-	-
20 28	ETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1,1/2" - INCLUSIVE CONEXÕES	m	5,30	14,21	75,31					5,30	0,00%	-	-
20 29	ETRODUTO FERRO GALVANIZADO, O 1" - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,80	35,18	204,04					5,80	0,00%	-	-
20 30	ETRODUTO FERRO GALVANIZADO, O 2 1/2" - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,00	92,00	2.024,32					22,00	0,00%	-	-
20 31	Linha aço 2 1/2" - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	22,24	22,24					1,00	0,00%	-	-
20 32	Linha aço 1 1/2" - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	7,92	47,52					6,00	0,00%	-	-
20 33	ETRODUTO GALVANIZADO 100x100mm - INCLUSIVE CONEXÕES	m	8,20	8,20	67,24					8,20	0,00%	-	-
20 34	ETRODUTO GALVANIZADO 50x50mm - INCLUSIVE CONEXÕES	m	61,35	11,35	696,32					61,35	0,00%	-	-
20 35	ETRODUTO GALVANIZADO 75x50mm - INCLUSIVE CONEXÕES	m	-	4,01	0,00					-	100,00%	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	und	1,00	1.533,25	6.768,03					1,00	0,00%	0,00	0,00
21 1	Caixa de abastecimento em aço no de 1200x900x600	und	1,00	1.533,25	1.533,25					1,00	0,00%	-	-
21 2	Caixa de abastecimento em aço no de 1200x900x600	und	5,00	272,20	1.361,00					5,00	0,00%	-	-
21 3	Chave em alumínio	und	2,00	686,89	1.373,78					2,00	0,00%	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				27.116,92							0,00	23.733,87
22 1	Painéis Frontais em aço inox portais em haste de 3 m x 1,1/2" tipo simples	m	3,00	66,91	200,73					3,00	0,00%	-	-
22 2	Vincalho CV- 25 x 10 MM/2	m	42,00	0,95	39,90					42,00	100,00%	291,90	291,90
22 3	Conector metal-que em bronze esmalhado 1x1/8"	und	12,00	8,81	105,72					12,00	100,00%	105,72	105,72
22 4	Parafuso fenda em aço inox 4,2x22mm e bucha de nylon	q	24,00	0,35	8,40					24,00	100,00%	8,40	8,40
22 5	Parafuso em aço	und	24,00	6,38	153,12					24,00	100,00%	153,12	153,12
22 6	Caixa de equalização de potência 200x200mm em aço com barramento, espessura 2mm	und	1,00	270,55	270,55					1,00	0,00%	-	-
22 7	Escarifica de vista para aterramento	und	39,00	4,00	156,00					39,00	100,00%	156,00	156,00
22 8	Haste tipo cocoonwood 5/8" x 2,40m.	und	12,00	48,15	577,80					12,00	100,00%	577,80	577,80
22 9	Condutores de cobre nu 16 mm2	m	5,00	28,85	144,25					5,00	100,00%	144,25	144,25
22 10	Condutores de cobre nu 35 mm2	m	37,20	37,20	1.392,00					37,20	100,00%	1.392,00	1.392,00
22 11	Condutores de cobre nu 50 mm2	m	280,00	49,38	13.926,00					280,00	100,00%	13.926,00	13.926,00
22 12	Caixa de inspeção, PVC de 1,27", com Tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	und	4,00	227,83	911,32					4,00	0,00%	-	-
22 13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo 50mm	und	12,00	18,29	219,48					12,00	100,00%	219,48	219,48
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				118.145,98							0,00	23.452,50
23 1	Conjunto de materiais para trabalhos em tubo ferro galvanizado telescópico (até = 7m 3x4" + fino 1,1/2")	und	1,00	4.099,79	4.099,79					1,00	0,00%	-	-
23 2	Balancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m2	48,53	486,03	23.587,04					48,53	0,00%	-	-
23 3	Prateleira, acabamento em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m2	56,76	486,03	27.344,05					56,76	0,00%	-	-
23 4	Prateleira e escarifica em már	m2	61,37	174,31	10.697,40					61,37	0,00%	-	-
23 5	Bateria em aço	mp	7,22	158,14	1.152,74					7,22	0,00%	-	-
23 6	Banco e acabamento em granito	m2	3,42	300,29	1.037,01					3,42	0,00%	-	-
23 7	Bancor em granito cinza, largura = 17	m	130,75	94,55	12.362,41					130,75	0,00%	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Secretaria Municipal da Educação e Cultura
PONTARIA, 2011 CPF 743.347.003-49

13/14



WB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA EXECUTORA: **W.M CONSTRUCOES LTDA**
 CNPJ: 02.394.381/0001-13
 CONTRATO: **2.136.393,76**
 REAJUSTE: **819.365,98**
 VALORES (R\$)
 VALORES (R\$)
 VALORES (R\$)
 VALORES (R\$)

CONTRATUAL: **2.955.759,95**
 PERIODO: **01/12/2021 a 29/12/2021**
 VALOR DA MEDIÇÃO: **359.967,41**
 VALORES (R\$)
 VALORES (R\$)

CONTRATUAL: **2.955.759,95**
 PERIODO: **01/12/2021 a 29/12/2021**
 VALOR DA MEDIÇÃO: **359.967,41**
 VALORES (R\$)
 VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R\$	VALORES (R\$)		
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
22.8	CALÇA D'ÁGUA - 30.000L Reservatório em anéis pré-moldados de concreto, ø 2,50m, cap. 200lt, com sistema de 10m³, h=11,43m, escada metálica com guarda-corpo e abrigo p/ microbomba com jorro de ferro - (folhe 5,70m)	und	1,00	34.612,50	34.612,50		1,00	1,00	100,00%		34.612,50	34.612,50
24	SERVIÇOS FINAIS Limpeza final da obra	m²	1.510,23	2,90	4.379,67 4.279,67			1.510,23	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$					2.955.759,95				12,18%	359.967,41	1.090.846,86	1.450.814,27

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
 Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

José Márcio Pinheiro Landim
 José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio-Administrador

Rafael Pinheiro Figueiredo
 Rafael Pinheiro Figueiredo
 Engº Civil-CREA-CE48758
 WM CONSTRUCOES LTDA

Francisco Eiler Cavalcante Barros
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA Nº 011/2021
 RNP: 743.347.003-49

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015


CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE – RECEBIMENTO DO MATERIAL.

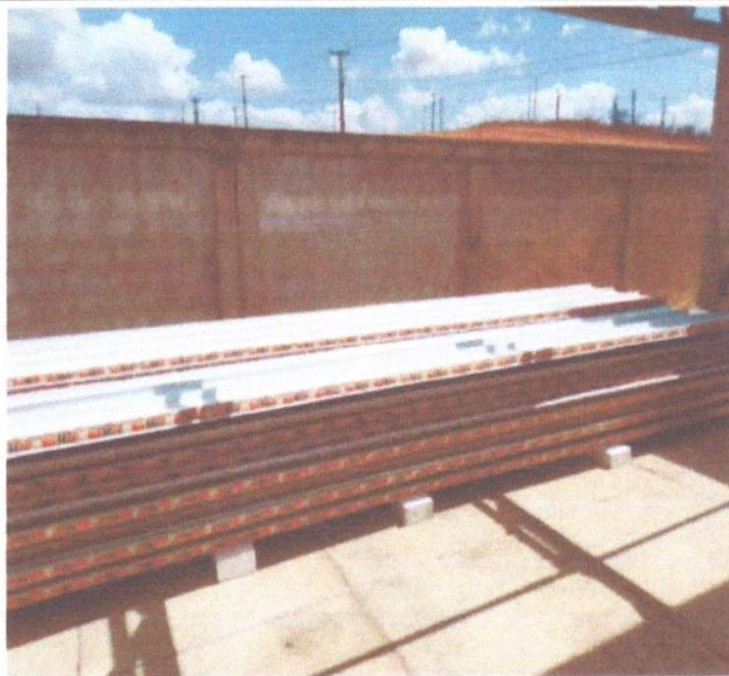

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE – RECEBIMENTO DO MATERIAL.

10

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PROCURADORIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

101

1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015


CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE – RECEBIMENTO DO MATERIAL.

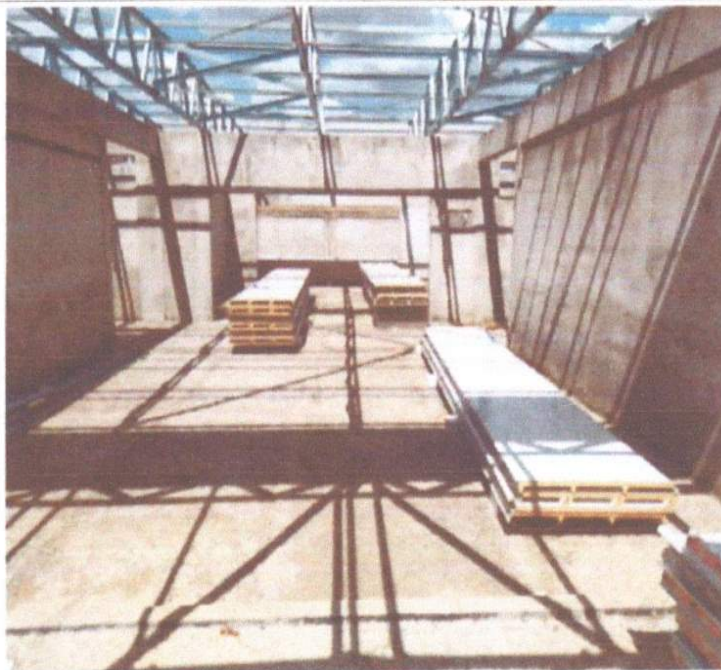

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE – RECEBIMENTO DO MATERIAL.

PA

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

PA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE – RECEBIMENTO DO MATERIAL.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE – RECEBIMENTO DO MATERIAL.

PD

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
POR Nº 269/2021 CPF 743.347.003-49

PD

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

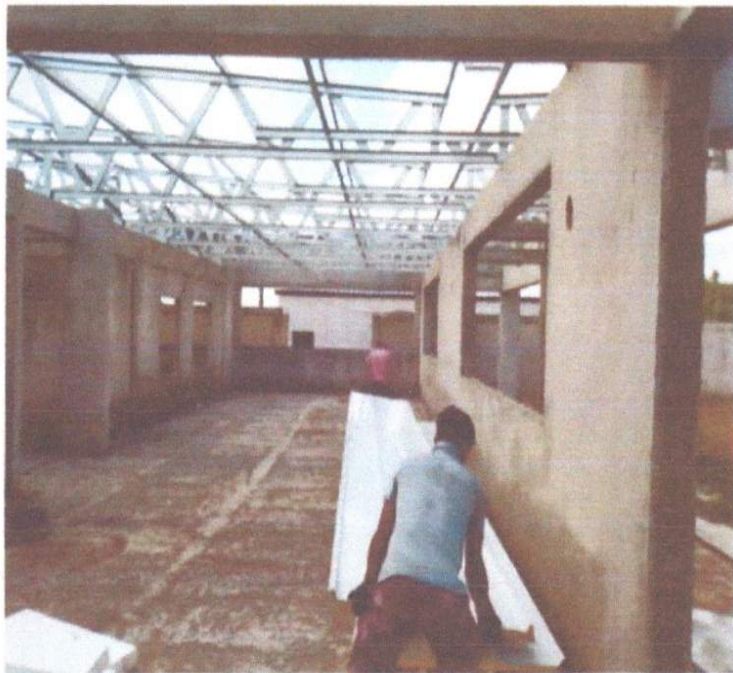

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE – RECEBIMENTO DO MATERIAL.



RECEBIMENTO DO MATERIAL PARA RUFOS DA COBERTURA.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



RECEBIMENTO DO MATERIAL PARA COBERTURA, RUFOS E TELHAS.



SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DAS TELHAS PARA MONTAGEM – COLOCAÇÃO DA FITA TACKY TAPE.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 149/2021 CPF 743.347.003-49

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DAS TELHAS PARA MONTAGEM – COLOCAÇÃO DA FITA TACKY TAPE.



EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE MONTAGEM DA COBERTURA COM TELHA SANDUICHE.

RS

Francisco Eder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTAL 269/2021 CPF 743.347.003-49

PA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DAS TELHAS PARA MONTAGEM – COLOCAÇÃO DA FITA TACKY TAPE.



EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DA COBERTURA COM TELHA SANDUICHE.

10

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTAL Nº 269/2021 CPF 743.347.003-49

7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DA COBERTURA COM TELHA SANDUICHE E CUMEEIRA.



EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DA COBERTURA COM TELHA SANDUICHE.

MA

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

EA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DA COBERTURA COM TELHA SANDUICHE.



EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DA COBERTURA COM TELHA SANDUICHE.

RS

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.

RM

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 03-49

10

EH

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.

PA

Francisco Elden Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTA Nº 001/2021 - 003-49

PA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.

10

Francisco Alder Cavalcanti Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 005/2021 CPM/2021 103-49

12

11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.




EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.

11)

Francisco  Barroso
Secretaria Municipal de Educação
Rua R. F. ...
Jaguaribe - Ceará - CEP: 033-49

13



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2021 A 27/12/2021

MEDIÇÃO: 15º (DÉCIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.



EXECUÇÃO DA MONTAGEM DE TELHAS SANDUICHE.

Francisco Barroso - Coordenador Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 2021/2021 CPF 743.347.093-44



14

Engenheiro CIVIL
RNP: 211878363-9







Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 2021/2021 CPF 743.347.093-44







WM CONSTRUÇÕES LTDA







THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637















CHICAGO, ILLINOIS
MAY 1964







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 01 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	quinta-feira, 02 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 03 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 04 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 05 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 06 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 07 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 08 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 09 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO.			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 11 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 12 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda, 13 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 14 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO.			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			


DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 18 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 19 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO.			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 21 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Sexta-feira, 24 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
RECESSO NATAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 25 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 26 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			



DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

DIA POUCO PRODUATIVO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Terça-feira, 28 de dezembro de 2021		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	

DIÁRIO DE OBRA



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.

DATA:

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021

WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ	TARDE	NOITE
BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior**
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210844848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20160014859

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0610465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 06.08.01/2015

Celebrado em: 02/12/2015

Valor: R\$ 1.811.634,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO -

Nº: -

Complemento: -

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 02/12/2015

Previsão de término: 21/02/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a Contratação da Prestação dos Serviços de Construção de uma Creche Proinfância (Tipo 1), no Bairro João Paulo II
Aditivo: 10º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

Rafael Pinheiro Figueredo

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 816.524.073-91

José Carlos C. Barroso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 25/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ca.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zY79
Impresso em: 25/08/2021 às 15:50:52 por: ip: 177.22.46.51

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210805685

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2118783639
Registro: 351920CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Jaguaribe**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
Nº: **S/N**
CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 10.000,00**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**
Data de Início: **01/06/2021**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

Nº: **S/N**
CEP: **63475000**
Coordenadas Geográficas: **-5.888942, -38.623393**

Finalidade: **Escolar**

Previsão de término: **31/12/2021**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #1.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98Yxy
Impresso em: 23/06/2021 às 11:22:59 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5900

faleconosco@crea-ce.org.br
FAX: (85) 3453-5900

CREA-CE





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210805685**

	QUANTIDADE	UNIDADE
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210805685

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JAGUARIBE, 09 de JULHO de 2021
Local data

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14
[Assinatura]
Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 155,38 Registrada em: 18/06/2021 Valor pago: R\$ 155,38 Nosso Número: 8214750224

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98Yxy
Impresso em: 23/06/2021 às 11:22:59 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
 Nº 0000003575246
 INICIAL
 EQUIPE - RRT PRINCIPAL



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: VIVIAN MAURER BORTOLOTTI

Registro Nacional: A47733-8

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação

CNPJ: 00.378.257/0001-81

Contrato: 54/2011

Valor: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 21/12/2011 Data de Início: 21/12/2011

Previsão de término: 22/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA SBS QUADRA 2

Nº: 2

Complemento: Bloco F Ed. FNDE

Bairro: ASA SUL

UF: DF CEP: 70070120 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1.510,23

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Projeto Arquitetônico Creche Prolifância Tipo 1 Modelo Padrão FNDE

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 75,32

Pago em: 03/06/2015

Total Pago: R\$ 75,32

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Brasília, 08 de junho de 2015

Local Dia Mês Ano

Fábio Lúcio de Almeida Cardoso
 Coordenador Geral de
 Infraestrutura Educacional
 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
 Educação - Ministério da Educação
 CNPJ: 00.378.257/0001-81

Vivian Maurer Bortolotto

VIVIAN MAURER BORTOLOTTI
 CPF: 969.230.400-00

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sigh/externo?form=Servicos>, com a chave: 9222wZ Impresso em: 10/08/2015 às 10:59:32 por: , ip: 200.130.5.2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150043229

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
RUDYBERT BARROS VON EYE
 Título profissional: Engenheiro Civil
 RNP: 1204409706
 Registro: 02674/D-MT

2. Dados do Contrato
 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
 QUADRA SBS QUADRA 2 BLOCO F
 Número 0
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF Barro: ASA SUL CEP: 70070-120
 Complemento
 E-Mail: obras@fnde.gov.br Fone: (61)20224359
 Contrato: Celebrado em: 03/08/2015 Valor Obra/Serviço R\$: 1.000,00
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público


3. Dados de Obra/Serviço
 QUADRA SBS QUADRA 2 BLOCO F
 Número: 0 Barro: ASA SUL CEP: 70070-120
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF Complemento
 Data de início: 03/08/2015 Previsão término: 21/08/2015 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: Escolar Código/Obra pública:
 Proprietário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81
 E-Mail: obras@fnde.gov.br Fone: (61) 20224359

4. Atividade Técnica
Realização

Projeto	Quantidade	Unidade
Projeto Estrutura Concreto Armado	1.510.2300	metros quadrados
Projeto Estrutura Aço	1.510.2300	metros quadrados

 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 Projeto de Estrutura em Concreto armado(exceto fundações) e de estrutura metálica em aço de uma Unidade Escolar denominada Tipo 1.

6. Declarações
 Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

 Profissional
 Contratante

Acessibilidade: Não. Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
 ABENC-DF

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: Brasília de 03 de agosto de 2015
 Data

 RUDYBERT BARROS VON EYE - CPF: 274.217.401-04
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

9. Informações
 - A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 www.creadf.org.br - informacao@creadf.org.br
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4615

www.creadf.org.br

Registrada em: 05/08/2015 Valor Pago: R\$ 67,68 Nosso Número/Baixa: 0115033767

CREA-DF

22/06/2015

ART 0720150030267 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150030267

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

CARLOS BRUNO PEDROSA
Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 0712785680
Registro: 21106/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE** CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81
 QUADRA SBS QUADRA 2 BL. F ED. FNDE Número: 0
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF Bairro: ASA SUL CEP: 70070-120
 E-Mail: bruno@minasprojetos.eng.br Complemento:
 Contrato: Fone: (61)82137647
 Vinculada a ART: Celebrado em: 01/01/2015 Valor Obra/Serviço R\$: 1.000,00
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Tipo de contratante: Pessoa física

3. Dados da Obra/Serviço

QUADRA SBS QUADRA 2 BL. Número: 0 Bairro: ASA SUL CEP: 70070-120
 F ED. FNDE UF: DF Complemento:
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF Coordenadas Geográficas:
 Data de Início: 01/01/2015 Previsão término: 21/12/2016 Código/Obra pública:
 Finalidade: **Escolar** CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81
 Proprietário: **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE** Fone: (61) 82137647
 E-Mail: bruno@minasprojetos.eng.br

4. Atividade Técnica

Realização	Quantidade	Unidade
Projeto Elétrica de baixa tensão	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Redes de Dados	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Ligação de esgoto	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Ligação de água	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Instalação sanitária	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Instalação pluvial	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Instalação hidráulica	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Hidrantes	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Extintores	1.510,2300	metros quadrados
Projeto Instalação telefônica	1.510,2300	metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Carlos Bruno Pedrosa
Engenheiro Civil
CREA-DF 21.196/D-DF

Local: _____ Data: _____

CARLOS BRUNO PEDROSA - CPF: 075.525.016-9

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

Coordenador Geral de Infraestrutura Educacional
GESTÃO DE OBRAS

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site .. ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

Registrada em: 08/06/2015 Valor Pago: R\$ 67,68 Nosso Número/Baixa: 0115023311



10
11
12
13
14

1

100



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Alteração)

Nº Inscrição AF00031678/2019	Data Emissão 12/04/2019	Data de Validade 11/04/2020
Concedido a WM CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia WM CONSTRUCOES	CNPJ/CPF 02364381000113	
Endereço (Conforme IPTU Indicado) RUA CENTRAL LOT CAJAZEIRAS I, 784 - SL-04 - CAJAZEIRAS, CEP: 60864205		
Área do Terreno 196.56	Área Construída 27.00	Área do Estabelecimento 27.00
Inscrição IPTU 6525067	Nº de Vagas de Estacionamento 4	Nº Plano de Resíduos/Iseção ISP2019052391
Atividades autorizadas para funcionamento exercidas no local (Conforme IPTU(s) Indicado(s)) 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	Risco Sanitário ISENTO	Licenciamento Ambiental POSSIBILIDADE DE ISEÇÃO
Observações O Alvará de Funcionamento deverá ser afixado em local visível e de fácil acesso. Nº do alvará anterior: AF00014851/2018 Este documento não é hábil à comprovação da regularidade da edificação ou da posse do imóvel. Alvará concedido de acordo com a Consulta Prévia de Adequabilidade Locacional número: FOR2019240866 O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.		
DECRETO LEI 2848/40 - CÓDIGO PENAL <i>Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.</i> <i>PENA - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.</i> <i>Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.</i> <i>PENA - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público; e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.</i>		



100

100

100



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Alteração)

Nº Inscrição AF00031678/2019		Data Emissão 12/04/2019	Data de Validade 11/04/2020
Concedido a WM CONSTRUCOES LTDA			
Nome Fantasia WM CONSTRUCOES		CNPJ/CPF 02364381000113	
Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA CENTRAL LOT CAJAZEIRAS I, 784 - SL-04 - CAJAZEIRAS, CEP: 60864205			
Área do Terreno 196.56	Área Construída 27.00	Área do Estabelecimento 27.00	
Inscrição IPTU 6525067	Nº de Vagas de Estacionamento 4		
Atividades constantes no CNPJ não autorizadas para funcionamento no local		Risco Sanitário	Licenciamento Ambiental
412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
421200001 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
382200001 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS		BAIXO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		BAIXO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
370290001 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES		BAIXO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
370110001 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
421110201 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS		ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
813030002 - OUTRAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS VOLTADAS À MANUTENÇÃO DO SOLO NÃO-AGRÍCOLA E NÃO-FLORESTAL		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
812800099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
773909901 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, EXCETO LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VÍDEO		ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
773220201 - ALUGUEL DE ANDAIMES		ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
773220101 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES		ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
712010001 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA		DEPENDENTE DE INFORMAÇÃO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
711979999 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
711970301 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
711970201 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
711970101 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
711110001 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA		ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
493020201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL		DEPENDENTE DE INFORMAÇÃO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR



11
12
13



439910901 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
439910401 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
439910201 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
439910301 - OBRAS DE ALVENARIA	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
439910102 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
439160001 - OBRAS DE FUNDAÇÕES	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
433040501 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
433040301 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
433040201 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
433040101 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
432230201 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
432230101 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
432160001 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
431930001 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
431280001 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
431180201 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
431180101 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
429950101 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
429280101 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
429100001 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
422360001 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
422270201 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
422190401 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
422190101 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR
422190201 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	ISENTO	LICENÇA AMBIENTAL REGULAR



1
2
3





11
12
13





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:59:17 do dia 02/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2022.

Código de controle da certidão: **82E0.3097.E0AE.1928**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202123727460

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2021 ÀS 17:10:17
VÁLIDA ATÉ 28/02/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2021/276592

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 6 de Dezembro de 2021 (09:01:02)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 06/03/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13

Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/12/2021 a 11/01/2022

Certificação Número: 2021121300313408785409

Informação obtida em 30/12/2021 17:12:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão nº: 58099142/2021
Expedição: 30/12/2021, às 17:12:44
Validade: 27/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
