

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 16.02.0028

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
22.01.0004	22/01/2024	16/02/2024	23.028,60

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.266,57
1000.60.00.0.	ISS	690,86
1000.70.00.0.	IRRF	345,43
		Total da Retenção: (R\$) 2.302,86

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	OUTROS	5521990000	20.725,74

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE



Entre contas correntes

G3371612532470261
16/02/2024 13:01:01

Debitado

Nome	PM JAGUARIBE-PAC I
Agência	2199-7
Conta corrente	19704-1

Creditado

Nome	WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência	2917-3
Conta corrente	113231-8
Valor	20.725,74
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **305902050**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 1642024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA **CNPJ:** 02.364.381/0001-13
Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 **Bairro:** CAJAZEIRAS
Cidade: Fortaleza **UF:** CE **CEP:** 60000000
Telefone: 8534970740 **E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**
Agência: 1-1
Conta: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
U. Funcional: Depto. Financeiro
Função: 12 - Educação **Dotação:** 132
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil
Proj\Atividade: 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015
Nº Empenho: 22010004 - Global

Nº Nota Fiscal: 900
Dt Emissão NF: 23/01/2024 **Dt. Solicitação** 23/01/2024 **Data Expedição:**
Liquidação:
Mês Referência: 01/12/2023 A 31/12/2023
Vlr. Liquidação: R\$ 23.028,60 (VINTE E TRÊS MIL E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	0	1,00	23.028,60	23.028,60

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliador de Vistos
Márcio de Sá
Secretaria de Educação e Cultura do Município
FORTALEZA - CE - 12 de Janeiro de 2024
Técnico Data

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:55
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JAGUARIBE-PAC I
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.704-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.917.000.113.231
VALOR TOTAL	20.725,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC	
AGENCIA: 2917-3	CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO	552.199.000.019.704

=====

NR.AUTENTICACAO	1.596.5F9.4FC.1B2.D7D
-----------------	-----------------------

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 16.02.0028

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
22010004	22/01/2024	GLOBAL	23.028,60	06.08.01/2015	060801/2015	

FUNCIONAL: PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
16020028	23.028,60	23.028,60	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
16/02/2024	23.028,60	2.302,86	20.725,74

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.266,57
1000.60.00.0.	ISS	690,86
1000.70.00.0.	IRRF	345,43

Total da Retenção: (R\$) 2.302,86

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	OUTROS	5521990000	20.725,74

Jaguaribe, 18 de Fevereiro de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000723

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
22/01/2024	22.01.0004	23.028,60	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
23/01/2024	23.028,60	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 900	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 23/01/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 23/01/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 217242790		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIO
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	23.028,600	23.028,60	0

Jaguaribe, 23 de Janeiro de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



G335161336371411018
16/02/2024 13:45:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM JAGUARIBE-PAC I
Agência 2199-7
Conta corrente 19704-1

Creditado

Nome WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência 2917-3
Conta corrente 113231-8
Valor 20.725,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	16/02/2024 13:00:58
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	16/02/2024 13:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 22.01.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIID
22/01/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 06.08.01/2015	060801/2015	1642024
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES
TIPO CRÉDITO: 1 VINCULADOS À EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
132	501.681,00	23.028,60	478.652,40

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62) 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J 02.364.381/0001-13 C G F 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
42608	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRR	UND	1	23.028,60	23.028,60
Total dos Itens: (R\$)					23.028,60

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **22010004**. A(os) **22 de Janeiro de 2024**



Responsável pelo Setor



FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 1642024**Data:** 22/01/2024**Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 132**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil**Proj\Atividade:** 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 23.028,60**Histórico**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	1,00	23.028,60	23.028,60

Ordenador


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Responsável pelo preenchimento

Reilson Venicius Sena Sampaio


Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 900					
Data e Hora da Emissão	23/01/2024 11:00:31	Competência	01/2024	Código de Verificação	217242790					
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		WM CONSTRUCOES LTDA								
Nome Fantasia		WM CONSTRUCOES								
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205								
Complemento	SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE					
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000								
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
REF. AO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE - CEI: 51.235.55060/74. VALOR DA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 23.028,60 VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 23.028,60 BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5% DE 60% DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL BASE DE CÁLCULO DO ISS (I) (60%): R\$ 13.817,16 VALOR DO ISS (5% DE I): R\$ 690,86 VALOR DO INSS (11% SOB 50% DA MÃO DE OBRA): R\$ 1.266,57 VALOR DO IR (1,5%) R\$ 345,43 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2917-3 CONTA CORRENTE: 113231-8 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUCOES LTDA										
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>PAR 11681/2014</u> CEDENTE <u>FNDE</u>										
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE										
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS										
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL										
Código da Obra		Código ART		CE20160014859						
TRIBUTOS FEDERAIS										
PIS		COFINS		IR(R\$)	345,43	INSS(R\$)	1.266,57	CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	23.028,60		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		23.028,60			
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		9.211,44			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	1.612,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		13.817,16			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido	690,86		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$	20.725,74		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,00			
				2 - Não						
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).								

Atesto o recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços

Em: 23 / 01 / 24





WM CONSTRUÇÕES

RECIBO

R\$ 23.028,60

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de VINTE E TRÊS MIL E VINTE E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS.

Referente ao PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 900

Descrição do serviço

Descrição: Valor Bruto: R\$ 23.028,60

Valor IR 1,5%: R\$ 345,43

Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 690,86

Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 1.266,57

VALOR LÍQUIDO DA NF: R\$ 20.725,74

CEI: 51.235.55060/74

CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE

CONTRATO: 06.08.01/2015

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE 16 de FEVEREIRO de 2024.

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 2917-3

C/C: 113231-8



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 06.08.01/2015	Modalidade da Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Nº da Licitação 06.08.01/2015	Data do Contrato 02 de Dezembro de 2015
Contratado(a) WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Endereço Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza - CE.	
Nº do CNPJ/CPF 02.364.381/0001-13	Nº do Telefone/Fax (85) 3099.8250 / (85) 3285.0550
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.	
Valor Global R\$ 1.811.634,40 (um milhão oitocentos e onze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 240 (duzentos e quarenta) dias

Jaguaribe-CE, 02 de Dezembro de 2015.


Maria Aparecida Lima de Assis
Secretária de Educação
CONTRATANTE


Lisandra Delge Araújo Peixoto Machado
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

**DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 06.08.01/2015 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM A
EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação e Cultura, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria De Educação e Cultura, Sr. Francisco Elder Cavalcante Barroso denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Cajazeiras, Fortaleza -CE, inscrito no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, representada por **José Márcio Pinheiro Landim**, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.


CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. Portanto, terá vigência de **15 de fevereiro de 2024** até **15 de agosto de 2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 15 de fevereiro de 2024.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CONTRATANTE

WM
CONSTRUC
OES LTDA.
0236438100

Assimilado regularmente por meio de
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66
DE CUIABÁ, S/Nº 2, LAFORTALEZA,
CIDADE NOVA DO CARVALHO,
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DE
ALAGOAS, CEP: 57.000-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66
CNPJ: 07.443.708/0001-66
CNPJ: 07.443.708/0001-66

0113
José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. Natalia Diniz Lima
Nome:
CPF: 06592345359

2. Josely Lomate Marques de Lima
Nome:
CPF: 04491368333

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015

DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.08.01/2015 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DO OUTRO LADO A EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Cajazeiras, Fortaleza -CE, inscrito no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, representada por **José Márcio Pinheiro Landim**, doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com o Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 06.08.01/2015** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O aditivo do contrato em questão encontra amparo nos artigos Arts. 40, XI; 57, inciso II, § 1º e 65, II, alínea D, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual **R\$ 77.128,02 (Setenta e sete mil, Cento e vinte e oito reais e Dois centavos)** gerando uma repercussão percentual na ordem de **12,91% (doze inteiros e noventa e um centésimos por cento)**, no valor do contrato.

Tal alteração contratual modificou o valor global anteriormente pactuado, saindo de **R\$ 2.955.759,74 (Dois milhões, Novecentos e cinquenta e cinco mil, Setecentos e cinquenta e nove reais e Setenta e quatro centavos)** global, para **R\$ 3.032.887,76 (Três milhões, Trinta e dois mil, Oitocentos e oitenta e sete reais e Setenta e seis centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

3.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, terá vigência de **15 de agosto de 2023 à 15 de fevereiro de 2024**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS JUSTIFICATIVAS

4.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio,

qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

4.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

4.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

4.4 - Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, ~~destarte~~ que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o aumento de valor do contrato na ordem de **12,91% (doze inteiros e noventa e um centésimos por cento)**, baseando-se nas inflações e deflações do índice INCC no período entre Outubro de 2021 à Junho de 2023.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.


E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe - CE, 04 de Julho de 2023.


FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:743347003
49


Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.07.04 17:24:49
-05'00

Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA


José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:

01. 
Nome: CARLOS BEZERRA DA SILVA
CPF/MF: 039.660.963-71

02. 
Nome: FELIPE BARBOZA SILVA
CPF/MF: 039.592.393-00

Contribuinte: WM CONSTRUÇOES LTDA

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.235.55080774

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *

Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) *

Bairro

CEP *

Telefone ()

Fax ()

E-mail

Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc)

Bairro

CEP

Vínculo do Responsável *

Vínculo com o Governo *

FPAS *

CNAE *

Natureza Jurídica *

Dados da Obra

A.R.T./C.R.E.A.

Local

Alvará

Data do início da Obra * (dd/mm/aaaa)

Construção

Pré-Fabricado?

Tipo da Obra

Uso da Obra

Quantidade de Unidades

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Demolição

Pré-Fabricado?

Tipo da Demolição

Uso da Demolição

Quantidade de Unidades

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Comercial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²

Residencial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²



FATURA 34ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Fortaleza, 22 de JANEIRO de 2024

Valor da medição	100,00%	23.028,60
Valor dos serviços de construção civil	100,00%	23.028,60
Base de cálculo do ISS	60,00%	13.817,16
Retenção do ISS	5,00%	690,86
IR (Sobre o Total)	1,50%	345,43
INSS (11% Sobre 50% do total)	5,50%	1.266,57
Total a Reter de Impostos		2.302,86
Valor Líquido a Receber		20.725,74

PIS 0,65% R\$ 149,69

COFINS 3,00% R\$ 690,86


CSLL 1,08% R\$ 248,71

SALDO LÍQUIDO 19.636,48

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

FLORENCE FERREIRA BARROS
Diretora Municipal de Engenharia
e Obras Públicas
CNPJ nº 07.007.207/0001-11
Insc. Est. nº 07.007.207-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 34	CONTRATO:	1.811.634,40	
WM CONSTRUÇÕES LTDA			DATA:	ADITIVO:	324.759,36	
CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/PNDE	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	REALISTE / REEQUILIBRIO:	819.365,98	
OBRA: CRECHE PROFINCÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				REALISTE:	77.128,02	
				TOTAL:	3.032.887,76	
				PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADO:	2.860.527,98
				01/12/2023 A 31/12/2023	SALDO:	172.359,78
				VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES				43.830,54						0,00	43.830,54	43.830,54
1.1	74209/0001 Praça da Obra - Padrão Governo Federal	m²	6,00	318,39	1.910,34		6,00	6,00	-	100,00%	-	1.910,34	1.910,34
1.2	C2161 Instalação Provisória de Água	und	1,00	1.079,96	1.079,96		1,00	1,00	-	100,00%	-	1.079,96	1.079,96
1.3	71960/0001 Instalação Provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00	1.468,89	1.468,89		1,00	1,00	-	100,00%	-	1.468,89	1.468,89
1.4	C2149 Instalação Provisória de esgoto	und	1,00	253,38	253,38		1,00	1,00	-	100,00%	-	253,38	253,38
1.5	73885/0001 Barracões Provisórios (deposto escritório vestiário refeitório) com piso omentado	m²	40,00	364,46	14.578,40		40,00	40,00	-	100,00%	-	14.578,40	14.578,40
1.6	74077/0001 Locação de Obra (execução de obra)	m²	1.510,23	11,18	16.884,37		1.510,23	1.510,23	-	100,00%	-	16.884,37	16.884,37
1.7	C2290 Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00	62,20	3.483,20		56,00	56,00	-	100,00%	-	3.483,20	3.483,20
1.8	74220/0001 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	52,15	4.172,00		80,00	80,00	-	100,00%	-	4.172,00	4.172,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACIONES				26.472,83						0,00	26.472,83	26.472,83
2.1	Ateno aplicados em camadas de 0,20m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	2.136,43	6,38	13.630,42		2.136,43	2.136,43	-	100,00%	-	13.630,42	13.630,42
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	370,09	25,35	9.381,78		370,09	370,09	-	100,00%	-	9.381,78	9.381,78
2.3	Regularização e Compactação do fundo de valas	m³	208,17	11,69	2.433,51		208,17	208,17	-	100,00%	-	2.433,51	2.433,51
2.4	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	327,55	1,60	524,08		327,55	327,55	-	100,00%	-	524,08	524,08
	MURETA												
2.5	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	11,26	25,35	285,44		11,26	11,26	-	100,00%	-	285,44	285,44
2.6	Regularização e Compactação do fundo de valas	m³	17,74	11,69	207,38		17,74	17,74	-	100,00%	-	207,38	207,38
2.7	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	6,39	1,60	10,22		6,39	6,39	-	100,00%	-	10,22	10,22
3	FUNDACIONES				132.791,94						0,00	132.791,94	132.791,94
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - SAPATAS												
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecanico	m²	208,17	17,84	3.713,75		208,17	208,17	-	100,00%	-	3.713,75	3.713,75
3.2	Forma de madeira comum para fundações	m²	410,35	32,20	13.213,27		410,35	410,35	-	100,00%	-	13.213,27	13.213,27
3.3	Armação aço CA-50 Diam. 5,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda 10% dobra colocação	kg	1.432,20	0,24	11.801,33		1.432,20	1.432,20	-	100,00%	-	11.801,33	11.801,33
3.4	Armação aço CA-50 Diam. 3,4 à 6,0 Fomecimento/corte perda 10% dobra colocação	kg	166,80	8,10	1.351,08		166,80	166,80	-	100,00%	-	1.351,08	1.351,08
3.5	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	42,54	439,76	18.707,39		42,54	42,54	-	100,00%	-	18.707,39	18.707,39
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - VIGAS BALDRAMES												
3.6	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecanico (Largura (0,30m) x Compromisso das vigas do tel 0,00 (674,20m))	m²	202,28	17,84	3.608,68		202,28	202,28	-	100,00%	-	3.608,68	3.608,68
3.7	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10x	m²	539,42	32,20	17.369,32		539,42	539,42	-	100,00%	-	17.369,32	17.369,32
3.8	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda 10% dobra/colocação	kg	1.373,30	0,24	11.315,99		1.373,30	1.373,30	-	100,00%	-	11.315,99	11.315,99
3.9	Armação de aço CA-60 Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda 10%/dobra/colocação	kg	619,40	8,10	5.017,14		619,40	619,40	-	100,00%	-	5.017,14	5.017,14
3.10	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	40,93	439,76	17.999,38		40,93	40,93	-	100,00%	-	17.999,38	17.999,38
	MURETAS - BLOCOS												
3.11	Estaca a trado (broca) (e=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7m	m	52,50	48,33	2.537,33		52,50	52,50	-	100,00%	-	2.537,33	2.537,33
3.12	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecanico	m²	27,97	17,84	498,98		27,97	27,97	-	100,00%	-	498,98	498,98
3.13	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	m²	21,39	42,39	906,72		21,39	21,39	-	100,00%	-	906,72	906,72
3.14	Armação de aço CA-50, Diam 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2)-fomecimento/corte perda 10% dobra/colocação	kg	34,36	0,24	283,13		34,36	34,36	-	100,00%	-	283,13	283,13
3.15													
3.16	Armação de aço CA-60, Diam 3,4 a 6,0mm (1/2)-fomecimento/corte perda 10%/dobra/colocação	kg	37,91	8,10	307,07		37,91	37,91	-	100,00%	-	307,07	307,07
3.17	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38	439,76	1.046,63		2,38	2,38	-	100,00%	-	1.046,63	1.046,63
	MURETAS - VIGAS BALDRAME												
3.18	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10x	m²	28,49	32,20	917,38		28,49	28,49	-	100,00%	-	917,38	917,38

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 JAGUARIBE - CE
 21/01/2024
 247.013-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 34	CONTRATO:	1.811.634,40	
		CNPJ: 02.364.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	DATA:	REAJUSTE PREEQUILIBRIO	
segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	REAJUSTE			77.128,02		
PERÍODO:	TOTAL:			3.032.887,76		
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		01/12/2023 A 31/12/2023		MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.860.527,98	
				SALDO:	172.359,78	
				VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.19	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fomecimento/corte perda 10% dobra/cobocação	kg	62,91	0,24	518,38		62,91	62,91	-	100,00%	-	518,38	518,38
3.20	Armação de aço CA-60 Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda 10%/dobra/cobocação	kg	26,82	0,10	217,24		26,82	26,82	-	100,00%	-	217,24	217,24
3.21	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	1,52	439,76	668,44		1,52	1,52	-	100,00%	-	668,44	668,44
FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTORNO (ARÇIMO)													
3.22	Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/areopos adquiridos	m³	51,99	357,69	18.596,30		51,99	51,99	-	100,00%	-	18.596,30	18.596,30
3.23	alvenaria de embasamento em tijolo ceramico furado com argamassa de cimento e areia 1:1,4 (V = 60,00m + 60,00m + 40,0m - 14,00m (56,00 pilares de 0,25m)) X 0,20m x 0,20m	m³	5,84	376,20	2.197,01		5,84	5,84	-	100,00%	-	2.197,01	2.197,01
4	SUPERESTRUTURA				133.357,43						0,00	133.357,43	133.357,43
CONCRETO ARMADO - PILARES													
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastica - pelares	m²	579,60	31,30	18.141,48		579,60	579,60	-	100,00%	-	18.141,48	18.141,48
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2)-fomecimento/corte/ perda de 10% dobra colocação	kg	2.248,56	0,24	18.528,13		2.248,56	2.248,56	-	100,00%	-	18.528,13	18.528,13
4.3	Armação aço CA-60, Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte/ perda de 10% dobra colocação	kg	820,34	0,10	6.644,75		820,34	820,34	-	100,00%	-	6.644,75	6.644,75
4.4	Concreto Bombeado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	32,60	439,76	14.336,18		32,60	32,60	-	100,00%	-	14.336,18	14.336,18
CONCRETO ARMADO - VIGAS													
4.5	Forma madeira comp. Plastica 12mm p/ estrutura corte/ montagem/ escamamento/ desforma - vigas	m²	842,44	31,30	26.368,37		842,44	842,44	-	100,00%	-	26.368,37	26.368,37
4.6	Armação aço CA-50 Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda de 10% dobra/cobocação	kg	1.581,70	0,24	13.033,21		1.581,70	1.581,70	-	100,00%	-	13.033,21	13.033,21
4.7	Armação aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra/cobocação	kg	830,22	0,10	6.724,78		830,22	830,22	-	100,00%	-	6.724,78	6.724,78
4.8	Concreto Bombeado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	52,71	439,76	23.179,75		52,71	52,71	-	100,00%	-	23.179,75	23.179,75
CONCRETO ARMADO PARA VEGAS													
4.9	Verge e contra verges pré-moldadas em concreto armado fck 15mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	18,85	4.940,59		262,10	262,10	-	100,00%	-	4.940,59	4.940,59
CONCRETO ARMADO - MURETAS - PILARES													
4.10	Forma madeira comp. Plastica 12mm p/ estrutura corte/ montagem/ escamamento/ desforma - vigas	m²	17,29	31,30	541,18		17,29	17,29	-	100,00%	-	541,18	541,18
4.11	Armação aço CA-50 Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda de 10% dobra/cobocação	kg	48,82	0,24	402,28		48,82	48,82	-	100,00%	-	402,28	402,28
4.12	Armação aço CA-60, Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte/ perda de 10% dobra colocação	kg	20,36	0,10	164,92		20,36	20,36	-	100,00%	-	164,92	164,92
4.13	Concreto bombeado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	439,76	351,81		0,80	0,80	-	100,00%	-	351,81	351,81
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				143.650,47						0,00	143.650,46	143.650,46
ELEMENTOS VAZADOS													
5.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento areia)	m²	6,10	139,65	851,87		6,10	6,10	-	100,00%	-	851,87	851,87
ALVENARIA DE VEDAÇÃO													
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo ceramico de 08 furos (dimensões nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	1.323,07	50,98	67.450,11		1.323,07	1.323,07	-	100,00%	-	67.450,11	67.450,11
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolo ceramico de 08 furos (dimensões nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	-	63,74	0,00		-	-	-	100,00%	-	-	-
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tijolo ceramico de 06 furos (dimensões nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	759,16	74,06	56.223,39		759,16	759,16	-	100,00%	-	56.223,39	56.223,39

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
JAGUARIBE - CE
24/01/2024
17.833-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 34	CONTRATO:	1.811.634,40
		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DATA:	ADITIVO	324.759,36
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO XÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		CNPJ: 02.364.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	REAJUSTE / REEQUILÍBRIO	819.365,98
					REAJUSTE	77.128,02
				TOTAL:	3.032.887,76	
		PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.860.527,98	
	01/12/2023 A 31/12/2023	SALDO:	172.359,78			
					VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.5	Encunhamento (perto de alvenaria) em tijolo cerâmico maduro 5x10x20cm 1 vez (esq. 20cm) assentamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	-	13,74	0,00		-	-	-	100,00%	-	-	-
5.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	804,39	18.203,35		22,63	22,63	-	100,00%	-	18.203,33	18.203,33
5.7	ALVENARIA DA MURETA Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:3 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	50,98	923,76		18,12	18,12	-	100,00%	-	923,76	923,76
6.	ESQUADRIAS				366.263,87						2.432,89	354.833,60	356.456,49
6.1	Porta de madeira - Pm1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadrias	und	10,00	1.081,99	10.819,90		10,00	10,00	-	100,00%	-	10.819,90	10.819,90
6.2	Porta de madeira - Pm2 - 80x210, com venezianas, incluso ferragens conforme projetos de esquadrias	und	5,00	1.311,88	6.559,40		5,00	5,00	-	100,00%	-	6.559,40	6.559,40
6.3	Porta de madeira - Pm3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadrias	und	4,00	1.197,11	4.788,44		4,00	4,00	-	100,00%	-	4.788,44	4.788,44
6.4	Porta de madeira - Pm4 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadrias	und	6,00	1.197,11	7.182,66		6,00	6,00	-	100,00%	-	7.182,66	7.182,66
6.5	Porta de madeira - Pm5 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadrias	und	10,00	1.197,11	11.971,10		10,00	10,00	-	100,00%	-	11.971,10	11.971,10
6.6	Porta de compensado de madeira - Pm5 - 80x210, folha lisa revertida com laminado melâmico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	16,00	214,64	3.434,24		16,00	16,00	-	100,00%	-	3.434,24	3.434,24
6.7	Chapa metálica (aluminio) 0,8", 5x1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	50,98	570,98		11,20	11,20	-	100,00%	-	570,98	570,98
6.8	FERRAGENS E ACESSÓRIOS Fechadura de embutir completa para portas internas	und	51,00	171,29	8.735,79		51,00	51,00	-	100,00%	-	8.735,79	8.735,79
6.9	PORTAS EM ALUMÍNIO Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	937,64	1.969,04		2,10	2,10	-	100,00%	-	1.969,04	1.969,04
6.10	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	937,64	1.575,24		1,68	1,68	-	100,00%	-	1.575,24	1.575,24
6.11	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	937,64	6.300,94		6,72	6,72	-	100,00%	-	6.300,94	6.300,94
6.12	Porta de Correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	937,64	106.328,38		113,40	113,40	-	100,00%	-	106.328,38	106.328,38
6.13	Porta de Correr - PA5 - 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	719,19	3.624,72		5,04	5,04	-	100,00%	-	3.624,72	3.624,72
6.14	Porta de Abir - PA6 - 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	1.058,69	4.700,58		4,44	4,44	-	100,00%	-	4.700,58	4.700,58
6.15	Porta de Abir - PA7 - 180x90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	1.058,69	5.558,12		5,25	5,25	-	100,00%	-	5.558,12	5.558,12
6.16	PORTAS DE VIDRO - PV Porta de vidro temperado - PV1 - 175x210, com ferragens conforme projeto de esquadrias	und	1,00	3.155,50	3.155,50		1,00	1,00	-	100,00%	-	3.155,50	3.155,50
6.17	Porta de vidro temperado - PV2 - 110x210, com ferragens conforme projeto de esquadrias	und	1,00	3.155,50	3.155,50		1,00	1,00	-	100,00%	-	3.155,50	3.155,50
6.18	Bandéras fixas de vidro para porta - jv2, conforme projeto 175x215	m²	0,61	536,43	327,22		0,61	0,61	-	100,00%	-	327,22	327,22
6.19	JANELA DE ALUMÍNIO - JA Janela de alumínio - JA - 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - oitohora	m²	1,75	671,45	1.175,04		1,75	1,75	-	100,00%	-	1.175,04	1.175,04
6.20	Janela de alumínio - JA - 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - oitohora	m²	1,60	671,45	1.074,32		1,60	1,60	-	100,00%	-	1.074,32	1.074,32
6.21	Vidro fixo - Jf - 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	589,48	1.898,13		3,22	3,22	-	100,00%	-	1.898,13	1.898,13
6.22	Janela de alumio - ja - 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias	m²	2,03	671,45	1.363,04		2,03	2,03	-	100,00%	-	1.363,04	1.363,04
6.23	Janela de alumio - ja - 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias	m²	2,10	589,48	1.237,91		2,10	2,10	-	100,00%	-	1.237,91	1.237,91

FOLHA Nº 01
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 JAGUARIBE - CE
 2024
 1-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 34	CONTRATO:	1.811.634,40
WM CONSTRUÇÕES LTDA		DATA:	ADITIVO	324.759,36	
CNPJ: 02.364.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	REAJUSTE / REEQUILIBRIO	819.365,98	
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			REAJUSTE	77.128,02	
			TOTAL:	3.032.887,76	
			PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.860.527,98
			01/12/2023 A 31/12/2023	SALDO:	172.359,78
				VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)		
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.24	Janela de alumínio - jã -86,210x50, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99		2,10	2,10	-	100,00%	-	1.505,99	1.505,99
6.25	Janela de alumínio - jã -87,210x75, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96		12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,96	9.035,96
6.26	Janela de alumínio - jã -88,210x100, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98		6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98	4.517,98
6.27	Janela de alumínio - jã -89,210x150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	717,14	13.553,95		18,90	18,90	-	100,00%	-	13.553,95	13.553,95
6.28	Janela de alumínio - jã -90,140x150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99		2,10	2,10	-	100,00%	-	1.505,99	1.505,99
6.29	Janela de alumínio - jã -11,140x75, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98		6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98	4.517,98
6.30	Janela de alumínio - jã -12,420x50, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	717,14	6.023,98		8,40	8,40	-	100,00%	-	6.023,98	6.023,98
6.31	Janela de alumínio - jã -13,420x150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96		12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,96	9.035,96
6.32	Janela de alumínio - jã -14,550x100, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	717,14	24.095,90		33,60	33,60	-	100,00%	-	24.095,90	24.095,90
6.33	Janela de alumínio - jã -15,560x150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	717,14	12.047,95		16,80	16,80	-	100,00%	-	12.047,95	12.047,95
6.34	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	20,25	67,70	1.370,93		-	-	20,25	0,00%	-	-	-
6.35	VIDROS												
6.35	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalação	m²	10,70	374,11	4.002,98		10,70	10,70	-	100,00%	-	4.002,98	4.002,98
6.36	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalação	m²	11,40	605,68	6.904,75		11,40	11,40	-	100,00%	-	6.904,75	6.904,75
6.37	Espeelho cristal, esp. 4mm com moldura de madeira	m²	21,28	622,13	13.238,93		21,28	21,28	-	100,00%	-	13.238,93	13.238,93
6.38	ESQUADRIA - GRADIL METALICO												
6.38	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	374,29	54.346,91	6,50	116,16	122,66	22,54	84,48%	2.432,89	43.477,53	45.910,41
6.39	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	226,04	3.051,54		13,50	13,50	-	100,00%	-	3.051,54	3.051,54
7	SISTEMAS DE COBERTURA				557.486,36						0,00	557.486,36	557.486,36
7.1	Estrutura metálica	m²	1.410,46	80,01	112.850,90		1.410,46	1.410,46	-	100,00%	-	112.850,90	112.850,90
7.2	Tela sanduiche metálica - preço licitado	m²	306,30	90,16	27.616,28		306,30	306,30	-	100,00%	-	27.616,01	27.616,01
7.2	Tela sanduiche metálica - preço reequilibrado	m²	1.104,16	349,13	385.495,38		1.104,16	1.104,16	-	100,00%	-	385.495,38	385.495,38
7.3	Cunheira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,40	61,23	5.106,58		83,40	83,40	-	100,00%	-	5.106,58	5.106,58
7.4	Calha em chapa metálica Nº22 desenvolvimento de 50cm	m²	186,15	48,58	9.043,17		186,15	186,15	-	100,00%	-	9.043,17	9.043,17
7.5	Ruífo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25 cm	m	258,90	36,16	9.361,82		258,90	258,90	-	100,00%	-	9.361,82	9.361,82
7.6	Pneodrã (chassi) em concreto	m	270,30	29,68	8.022,50		270,30	270,30	-	100,00%	-	8.022,50	8.022,50
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				5.767,51						0,00	5.767,51	5.767,51
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	8,15	5.767,51		707,67	707,67	-	100,00%	-	5.767,51	5.767,51
9	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS				407.220,92						0,00	407.220,92	407.220,92
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	4.164,46	3,10	12.909,83		4.164,46	4.164,46	-	100,00%	-	12.909,83	12.909,83
9.2	Empoco para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0cm	m²	1.023,95	24,05	24.626,00		1.023,95	1.023,95	-	100,00%	-	24.626,00	24.626,00
9.3	Empoco paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5cm	m²	3.140,51	38,30	120.281,53		3.140,51	3.140,51	-	100,00%	-	120.281,53	120.281,53
9.4	Reboco para paredes internas, externas, portões, vigas, traço 1:4:5 0,5cm	m²	3.140,51	15,84	49.745,68		3.140,51	3.140,51	-	100,00%	-	49.745,68	49.745,68
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30x40 cm - ind - rejunte - conforme projeto - branca	m²	804,38	110,66	89.012,69		804,38	804,38	-	100,00%	-	89.012,69	89.012,69
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,02	87,03	785,01		9,02	9,02	-	100,00%	-	785,01	785,01
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	87,03	651,85		7,49	7,49	-	100,00%	-	651,85	651,85
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - conforme projeto - branco	m²	22,01	87,03	1.915,53		22,01	22,01	-	100,00%	-	1.915,53	1.915,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 JAGUARIBE, 22 DE JANEIRO DE 2024.
 195-49


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO							VALORES (R\$)				
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 34			CONTRATO:	1.811.634,40					
OBRA: CRECHE PROFINCÂNCIA TIPO I NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		MM CONSTRUÇÕES LTDA	PAR 11681/2014/PNDE	DATA:	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024			ADITIVO	324.759,36				
		CNPJ: 02.364.381/0001-13		PERÍODO:	01/12/2023 A 31/12/2023			REALISTE /REEQULIBRO	819.365,98				
							REALISTE	77.128,02					
							TOTAL:	3.032.887,76					
							MEDIÇÃO ACUMULADO:	2.860.527,98					
							SALDO:	172.359,78					
							VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	181,05	87,03	15.756,78		181,05	181,05	-	100,00%	-	15.756,78	15.756,78
9.10	Roda mão em madeira (altura=10cm)	m	242,50	34,25	8.305,63		242,50	242,50	-	100,00%	-	8.305,63	8.305,63
9.11	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	83,09	41.381,31		498,03	498,03	-	100,00%	-	41.381,31	41.381,31
9.12	Forno mineral	m²	696,44	60,09	41.949,08		696,44	696,44	-	100,00%	-	41.949,08	41.949,08
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS				275.607,72						0,00	253.877,12	253.877,12
10.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.185,08	26,78	31.736,44		1.185,08	1.185,08	-	100,00%	-	31.736,44	31.736,44
10.2	Camada regularizada e=2,0cm - preço licitado	m²	667,22	22,34	14.905,69		667,22	667,22	-	100,00%	-	14.905,69	14.905,69
	Camada regularizada e=2,0cm - preço reajustado	m²	517,86	32,76	16.965,09		517,86	517,86	-	100,00%	-	16.965,09	16.965,09
10.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	385,83	65,89	25.422,34		385,83	385,83	-	100,00%	-	25.422,34	25.422,34
10.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	62,06	1.472,06		-	-	23,72	0,00%	-	-	-
10.5	Piso cerâmico antiderrapante PEV V - 40x40cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m²	214,98	105,65	22.659,81		214,98	214,98	-	100,00%	-	22.659,81	22.659,81
10.6	Piso cerâmico antiderrapante PEV V - 60x60cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m²	345,77	105,50	36.478,74		345,77	345,77	-	100,00%	-	36.478,74	36.478,74
10.7	Piso vinílico em mania e=2,0mm	m²	394,64	137,71	54.345,87		394,64	394,64	-	100,00%	-	54.345,87	54.345,87
10.8	Piso portati de alerta, borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fimecimento e assentamento)	m²	27,90	221,43	6.177,90		-	-	27,90	0,00%	-	-	-
10.9	Piso portati de alerta, borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fimecimento e assentamento)	m²	22,68	221,43	5.022,03		-	-	22,68	0,00%	-	-	-
10.10	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, E=2CM	m	95,70	94,55	9.048,44		95,70	95,70	-	100,00%	-	9.048,44	9.048,44
10.11	Soleira em granito cinza andorinha, l=30cm, E=2CM	m	1,77	146,25	258,86		1,77	1,77	-	100,00%	-	258,86	258,86
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA												
10.12	Passeio em concreto desempenado com junta plastica e cada 1,20m e=7cm	m²	492,41	36,18	17.815,39		492,41	492,41	-	100,00%	-	17.815,39	17.815,39
10.13	Rampa de acesso em concreto não estrutura	m²	28,22	26,78	755,73		28,22	28,22	-	100,00%	-	755,73	755,73
10.14	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, fck 35mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	140,93	55,44	7.813,16		140,93	140,93	-	100,00%	-	7.813,16	7.813,16
10.15	Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - Smpa	m²	4,86	140,74	684,00		4,86	4,86	-	100,00%	-	684,00	684,00
10.16	Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - Smpa	m²	8,64	140,74	1.215,99		8,64	8,64	-	100,00%	-	1.215,99	1.215,99
10.17	Mel-flo (guê) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	330,28	39,65	13.095,60		330,28	330,28	-	100,00%	-	13.095,60	13.095,60
10.18	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60	88,94	675,94		7,60	7,60	-	100,00%	-	675,94	675,94
10.19	Grama batatas em placas	m²	416,68	21,74	9.058,62		-	-	416,68	0,00%	-	-	-
11	PINTURA				176.445,75						0,00	170.180,40	170.180,40
11.1	Enmassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.489,11	20,91	52.047,29		2.489,11	2.489,11	-	100,00%	-	52.047,29	52.047,29
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.489,11	17,63	43.883,01		2.489,11	2.489,11	-	100,00%	-	43.883,01	43.883,01
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	15,18	7.560,10		498,03	498,03	-	100,00%	-	7.560,10	7.560,10
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demão em esquadras de madeira	m²	165,75	26,66	4.418,90		165,75	165,75	-	100,00%	-	4.418,90	4.418,90
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demão em rodapeis de madeira	m²	24,25	26,83	650,63		24,25	24,25	-	100,00%	-	650,63	650,63
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	239,76	67,68	16.226,96		239,76	239,76	-	100,00%	-	16.226,96	16.226,96
11.7	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af. 06/2014	m²	498,03	8,29	4.128,67		498,03	498,03	-	100,00%	-	4.128,67	4.128,67
11.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m²	2.489,11	7,09	17.647,79		2.489,11	2.489,11	-	100,00%	-	17.647,79	17.647,79
11.9	Enmassamento com massa epoxi 2 demãos	m²	239,76	86,08	20.638,54		239,76	239,76	-	100,00%	-	20.638,54	20.638,54
11.10	Caiação em tres demãos em paredes	m²	651,40	8,51	5.543,41		350,00	350,00	301,40	53,73%	-	2.978,50	2.978,50
	CAIXA D'ÁGUA 30.000L												
11.11	Enmassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica (Área = 3,14 x 2,50m D x 11,43m A)	m²	89,73	23,61	2.118,53		-	-	89,73	0,00%	-	-	-
11.12	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	89,73	17,63	1.581,94		-	-	89,73	0,00%	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				42.789,19						0,00	42.322,10	42.322,10
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO												
12.1	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 l/2	und	26,00	3,73	96,98		26,00	26,00	-	100,00%	-	96,98	96,98
12.2	Engate flexível plastico 1/2 - 3/4cm	und	45,00	10,38	467,10		-	-	45,00	0,00%	-	-	-

FCO. ELBER CAVALLI DE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 249/2021
 CPF: 743.347.803-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONVÊNIO: PAR 11681/2014/FNDE	MEDIÇÃO Nº. 34	CONTRATO: 1.811.634,40	ADITIVO: 324.759,36
CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023	REAJUSTE / REEQUILÍBRIO: 819.365,98	REAJUSTE: 77.128,02	
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO XÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			TOTAL: 3.032.887,76	MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.860.527,98	
			SALDO: 172.359,78	VALOR DA MEDIÇÃO: 23.028,60	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.3	tubo de descarga VDE 38mm	und	26,00	20,04	521,04		26,00	26,00	-	100,00%	-	521,04	521,04
12.4	Tubo de ligação latão cromado com canoleta para sanitário	und	26,00	7,39	192,14		26,00	26,00	-	100,00%	-	192,14	192,14
12.5	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	und	15,00	4,25	63,75		15,00	15,00	-	100,00%	-	63,75	63,75
12.6	Capo soldável 20mm	und	1,00	1,50	1,50		1,00	1,00	-	100,00%	-	1,50	1,50
12.7	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	4,00	502,36	2.009,44		4,00	4,00	-	100,00%	-	2.009,44	2.009,44
12.8	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	4,00	359,05	1.436,20		4,00	4,00	-	100,00%	-	1.436,20	1.436,20
12.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	23,00	23,00		1,00	1,00	-	100,00%	-	23,00	23,00
12.10	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92		4,00	4,00	-	100,00%	-	210,92	210,92
12.11	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	3,00	3,98	11,94		3,00	3,00	-	100,00%	-	11,94	11,94
12.12	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	77,00	3,98	306,46		77,00	77,00	-	100,00%	-	306,46	306,46
12.13	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	und	2,00	5,61	11,22		2,00	2,00	-	100,00%	-	11,22	11,22
12.14	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	und	36,00	11,64	419,04		36,00	36,00	-	100,00%	-	419,04	419,04
12.15	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	und	16,00	22,80	364,80		16,00	16,00	-	100,00%	-	364,80	364,80
12.16	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	und	4,00	37,36	149,44		4,00	4,00	-	100,00%	-	149,44	149,44
12.17	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92		4,00	4,00	-	100,00%	-	210,92	210,92
12.18	Bucha de redução sol. Curta 110 - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	2,00	71,01	142,02		2,00	2,00	-	100,00%	-	142,02	142,02
12.19	Bucha de redução sol. Curta 30mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	1,00	8,44	8,44		1,00	1,00	-	100,00%	-	8,44	8,44
12.20	Bucha de redução sol. Curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	23,00	0,98	22,54		23,00	23,00	-	100,00%	-	22,54	22,54
12.21	Bucha de redução sol. Curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	3,00	17,29	51,87		3,00	3,00	-	100,00%	-	51,87	51,87
12.22	Bucha de redução sol. Curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	6,00	17,95	107,70		6,00	6,00	-	100,00%	-	107,70	107,70
12.23	Bucha de redução sol. longa 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	27,00	4,71	127,17		27,00	27,00	-	100,00%	-	127,17	127,17
12.24	Bucha de redução sol. longa 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	5,19	10,38		2,00	2,00	-	100,00%	-	10,38	10,38
12.25	Bucha de redução sol. longa 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	5,00	8,84	44,20		5,00	5,00	-	100,00%	-	44,20	44,20
12.26	Bucha de redução sol. longa 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	14,00	15,73	220,22		14,00	14,00	-	100,00%	-	220,22	220,22
12.27	Bucha de redução sol. longa 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	4,00	21,45	85,80		4,00	4,00	-	100,00%	-	85,80	85,80
12.28	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	6,00	3,34	20,04		6,00	6,00	-	100,00%	-	20,04	20,04
12.29	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	5,38	10,76		2,00	2,00	-	100,00%	-	10,76	10,76
12.30	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	und	2,00	9,31	18,62		2,00	2,00	-	100,00%	-	18,62	18,62
12.31	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	47,45	94,90		2,00	2,00	-	100,00%	-	94,90	94,90
12.32	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	und	2,00	53,86	107,72		2,00	2,00	-	100,00%	-	107,72	107,72
12.33	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	und	7,00	26,76	187,32		7,00	7,00	-	100,00%	-	187,32	187,32
12.34	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	und	3,00	4,71	14,13		3,00	3,00	-	100,00%	-	14,13	14,13
12.35	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	149,00	5,35	826,95		149,00	149,00	-	100,00%	-	826,95	826,95
12.36	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	7,38	14,76		2,00	2,00	-	100,00%	-	14,76	14,76
12.37	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	10,00	8,08	80,80		10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80	80,80
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação - preço realistado	und	9,00	11,84	106,56		9,00	9,00	-	100,00%	-	106,56	106,56
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	und	11,00	32,76	360,36		11,00	11,00	-	100,00%	-	360,36	360,36
12.39	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	101,78	203,56		2,00	2,00	-	100,00%	-	203,56	203,56
12.40	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	5,00	69,40	347,00		5,00	5,00	-	100,00%	-	347,00	347,00
12.40	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação - preço realistado	und	5,00	101,78	508,90		5,00	5,00	-	100,00%	-	508,90	508,90
12.41	Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	14,61	29,22		2,00	2,00	-	100,00%	-	29,22	29,22
12.42	Te 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	und	2,00	64,95	129,90		2,00	2,00	-	100,00%	-	129,90	129,90
12.43	Te 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	32,00	7,71	246,72		32,00	32,00	-	100,00%	-	246,72	246,72
12.44	Te 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	und	1,00	7,98	7,98		1,00	1,00	-	100,00%	-	7,98	7,98
12.45	Te 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	und	13,00	13,28	172,64		13,00	13,00	-	100,00%	-	172,64	172,64
12.46	Te 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	und	11,00	34,15	375,65		11,00	11,00	-	100,00%	-	375,65	375,65

FEO. ALMA CARVALHO BARROSO
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 CPF: 029.781.167-29/2021
 CEP: 442.347-003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)					
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº: 34		CONTRATO:	1.811.634,40						
		WY CONSTRUÇÕES LTDA				ADITIVO:	324.759,36						
		CNPJ: 02.364.381/0001-13				REAJUSTE / REEQUILÍBRIO:	819.365,98						
						DATA:	77.128,02						
						segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	3.032.887,76						
						TOTAL:	1.860.537,98						
						PERÍODO:	172.359,78						
						01/12/2023 A 31/12/2023	23.028,60						
						VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.47	Te 90 solável - 75mm, fornecimento e instalação	und	3,00	30,49	91,47		3,00	3,00	-	100,00%	-	91,47	91,47
12.48	Te 90 solável - 85mm, fornecimento e instalação	und	8,00	30,49	243,92		8,00	8,00	-	100,00%	-	243,92	243,92
12.49	Te redução 90 solável - 30mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	8,44	16,88		2,00	2,00	-	100,00%	-	16,88	16,88
a	Te redução 90 solável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	15,00	13,40	201,00		15,00	15,00	-	100,00%	-	201,00	201,00
b	Te redução 90 solável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação - preço realistado	und	14,00	19,65	275,10		14,00	14,00	-	100,00%	-	275,10	275,10
a	Te redução 90 solável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	6,00	41,31	247,86		6,00	6,00	-	100,00%	-	247,86	247,86
b	Te redução 90 solável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação - preço realistado	und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%	-	302,95	302,95
12.52	Te redução 90 solável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%	-	302,95	302,95
12.53	Te redução 90 solável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	5,00	113,29	566,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	566,45	566,45
12.54	Te redução 90 solável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	113,29	226,58		2,00	2,00	-	100,00%	-	226,58	226,58
12.55	Jelho 90 solável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	6,00	13,55	81,30		6,00	6,00	-	100,00%	-	81,30	81,30
12.56	Jelho de redução 90 solável - com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	81,00	14,61	1.183,41		81,00	81,00	-	100,00%	-	1.183,41	1.183,41
12.57	Lava de redução solável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	11,00	6,30	69,30		11,00	11,00	-	100,00%	-	69,30	69,30
12.58	Te redução 90 solável com bucha central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	22,00	11,55	254,10		22,00	22,00	-	100,00%	-	254,10	254,10
12.59	Te solável com bucha bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	3,00	8,29	24,87		3,00	3,00	-	100,00%	-	24,87	24,87
12.60	Colar de tomada - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	4,41	4,41		1,00	1,00	-	100,00%	-	4,41	4,41
12.61	Jelho 90 solável com rosca 20mm - 1/2" fornecimento e instalação	und	5,00	5,09	25,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	25,45	25,45
12.62	Tubo alçado 1/2", fornecimento e instalação	und	2,00	12,15	24,30		2,00	2,00	-	100,00%	-	24,30	24,30
12.63	Te solável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	und	1,00	1,85	1,85		1,00	1,00	-	100,00%	-	1,85	1,85
12.64	Tubo PVC solável Ø 20mm, fornecimento e instalação	m	46,19	12,14	560,75		46,19	46,19	-	100,00%	-	560,75	560,75
12.65	Tubo PVC solável Ø 25mm, fornecimento e instalação	m	319,27	3,86	1.233,38		319,27	319,27	-	100,00%	-	1.233,38	1.233,38
12.66	Tubo PVC solável Ø 32mm, fornecimento e instalação	m	57,32	7,85	449,96		57,32	57,32	-	100,00%	-	449,96	449,96
a	Tubo PVC solável Ø 50mm, fornecimento e instalação - preço licitado	m	111,79	13,98	1.562,82		111,79	111,79	-	100,00%	-	1.562,82	1.562,82
b	Tubo PVC solável Ø 50mm, fornecimento e instalação - preço realistado	m	14,95	20,50	306,48		14,95	14,95	-	100,00%	-	306,48	306,48
a	Tubo PVC solável Ø 60mm, fornecimento e instalação - preço licitado	m	38,62	21,48	829,56		38,62	38,62	-	100,00%	-	829,56	829,56
b	Tubo PVC solável Ø 60mm, fornecimento e instalação - preço realistado	m	16,55	31,49	521,16		16,55	16,55	-	100,00%	-	521,16	521,16
a	Tubo PVC solável Ø 75mm, fornecimento e instalação - preço licitado	m	47,05	29,93	1.408,21		47,05	47,05	-	100,00%	-	1.408,21	1.408,21
b	Tubo PVC solável Ø 75mm, fornecimento e instalação - preço realistado	m	20,16	43,89	884,82		20,16	20,16	-	100,00%	-	884,82	884,82
12.70	Tubo PVC solável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	121,92	37,53	4.578,10		121,92	121,92	-	100,00%	-	4.578,10	4.578,10
12.71	Tubo PVC solável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	59,15	35,99	2.128,81		59,15	59,15	-	100,00%	-	2.128,81	2.128,81
13	DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS				12.188,17						0,00	11.275,14	11.275,14
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS												
12.72	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	153,95	153,95		1,00	1,00	-	100,00%	-	153,95	153,95
12.73	Registro de esfera com canola cromada - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	210,89	210,89		1,00	1,00	-	100,00%	-	210,89	210,89
12.74	Registro esfera borboleta bruto PVC - fornecimento e instalação	und	1,00	11,09	11,09		1,00	1,00	-	100,00%	-	11,09	11,09
12.75	Registro bruto de gaveta 2" fornecimento e instalação	und	8,00	184,95	1.479,60		8,00	8,00	-	100,00%	-	1.479,60	1.479,60
12.76	Registro bruto de gaveta 2 1/2" fornecimento e instalação	und	2,00	356,01	712,02		2,00	2,00	-	100,00%	-	712,02	712,02
12.77	Registro bruto de gaveta 3" fornecimento e instalação	und	2,00	614,74	1.229,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.229,48	1.229,48
12.78	Registro bruto de gaveta 4" fornecimento e instalação	und	2,00	1.026,01	2.052,02		2,00	2,00	-	100,00%	-	2.052,02	2.052,02
12.79	Registro de gaveta com canola cromada - 1" fornecimento e instalação	und	1,00	143,09	143,09		1,00	1,00	-	100,00%	-	143,09	143,09
12.80	Registro de gaveta com canola cromada - 1 1/2" fornecimento e instalação	und	5,00	210,89	1.054,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	1.054,45	1.054,45
12.81	Registro de gaveta com canola cromada - 3/4" fornecimento e instalação	und	31,00	143,09	4.435,79		31,00	31,00	-	100,00%	-	4.435,79	4.435,79
12.82	Registro de pressão com canola cromada 3/4", fornecimento e instalação	und	15,00	101,26	1.518,90		15,00	15,00	-	100,00%	-	1.518,90	1.518,90
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC												
13.1	Tubo de PVC Ø100mm fornecimento e instalação	m	237,27	19,69	4.671,85		237,27	237,27	-	100,00%	-	4.671,85	4.671,85
13.2	Tubo de PVC Ø 150mm fornecimento e instalação	m	107,14	37,13	3.978,11		107,14	107,14	-	100,00%	-	3.978,11	3.978,11
13.3	Curva curta 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	52,00	10,85	564,20		52,00	52,00	-	100,00%	-	564,20	564,20

FCO. ELIAS CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 249/2021
 CPF: 742.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO							VALORES (R\$)				
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 34			CONTRATO:	1.811.634,40				
		WM CONSTRUÇÕES LTDA			DATA:			ADITIVO:	324.759,36				
OBRA: CRECHE PRONÍNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024			REAJUSTE / REEQUILÍBRIO:	819.365,98				
					PERÍODO:			REAJUSTE:	77.128,02				
					01/12/2023 A 31/12/2023			TOTAL:	3.032.887,76				
								MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.860.527,98				
								SALDO:	172.359,78				
								VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
13.4	Joelho 45 - 100, fornecimento e instalação	und	26,00	14,55	378,30		26,00	26,00	-	100,00%	-	378,30	378,30
13.5	Joelho 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	4,00	15,01	60,04		4,00	4,00	-	100,00%	-	60,04	60,04
13.6	Te sanitário - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	und	4,00	48,41	193,64		4,00	4,00	-	100,00%	-	193,64	193,64
ACESSÓRIOS													
13.7	Rabo hemiférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø 100mm	und	24,00	37,21	893,04		-	-	24,00	0,00%	-	-	-
13.8	Caixa de areia sem grelha Ø60x60cm	und	20,00	71,45	1.429,00		20,00	20,00	-	100,00%	-	1.429,00	1.429,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				36.617,96						0,00	32.304,89	32.304,89
14.1	Caixa sifonada 150x150x50mm		19,00	30,38	577,22		19,00	19,00	-	100,00%	-	577,22	577,22
14.2	Caixa sifonada 150x185x75mm	und	1,00	70,86	70,86		1,00	1,00	-	100,00%	-	70,86	70,86
14.3	Rabo sifonado, PVC 100x100x40mm	und	30,00	11,68	350,40		30,00	30,00	-	100,00%	-	350,40	350,40
14.4	Terminal de ventilação serie normal 50mm	m	39,00	8,49	331,11		39,00	39,00	-	100,00%	-	331,11	331,11
14.5	Tubo PVC rígido 100mm, fornecimento e instalação	m	185,60	35,99	6.679,74		185,60	185,60	-	100,00%	-	6.679,74	6.679,74
14.6	Tubo PVC rígido 40mm, fornecimento e instalação	m	118,87	12,90	1.533,42		118,87	118,87	-	100,00%	-	1.533,42	1.533,42
14.7	Tubo PVC rígido 50mm, fornecimento e instalação	m	169,90	19,06	3.238,29		169,90	169,90	-	100,00%	-	3.238,29	3.238,29
14.8	Tubo PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	166,99	24,33	4.062,87		166,99	166,99	-	100,00%	-	4.062,87	4.062,87
14.9	Tubo PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	38,01	37,13	1.411,31		38,01	38,01	-	100,00%	-	1.411,31	1.411,31
14.10	Caixa de ejetura SIMPLES	und	7,00	123,48	864,36		7,00	7,00	-	100,00%	-	864,36	864,36
14.11	CADA DE ESPECIÇÃO ESGOTO	und	17,00	315,35	5.360,95		17,00	17,00	-	100,00%	-	5.360,95	5.360,95
14.12	CADA DE PASSAGEM MODULADA	und	1,00	134,28	134,28		1,00	1,00	-	100,00%	-	134,28	134,28
14.13	Sumidouro em alvenaria 2,40x2,40m	und	1,00	2.378,11	2.378,11		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.14	Fossa séptica 2,30x2,30m	und	1,00	2.024,60	2.024,60		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.15	Bucha de redução PVC longa 50mm-40	und	38,00	5,75	218,50		38,00	38,00	-	100,00%	-	218,50	218,50
14.16	Curva PVC 90 curta - 40mm -fornecimento e instalação	und	97,00	5,01	485,97		97,00	97,00	-	100,00%	-	485,97	485,97
14.17	Curva PVC 90 curta - 50mm -fornecimento e instalação	und	15,00	7,88	118,20		15,00	15,00	-	100,00%	-	118,20	118,20
14.18	Curva PVC 90 curta - 75mm -fornecimento e instalação	und	24,00	20,73	497,52		24,00	24,00	-	100,00%	-	497,52	497,52
14.19	Joelho PVC 45 - 100mm - fornecimento e instalação	und	7,00	14,55	101,85		7,00	7,00	-	100,00%	-	101,85	101,85
14.20	Joelho PVC 45 - 75mm - fornecimento e instalação	und	9,00	11,84	106,56		9,00	9,00	-	100,00%	-	106,56	106,56
14.21	Joelho PVC 45 - 50mm - fornecimento e instalação	und	23,00	7,05	162,15		23,00	23,00	-	100,00%	-	162,15	162,15
14.22	Joelho PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	50,00	5,21	260,50		50,00	50,00	-	100,00%	-	260,50	260,50
14.23	Joelho PVC 90 - 100mm - fornecimento e instalação	und	26,00	15,01	390,26		26,00	26,00	-	100,00%	-	390,26	390,26
14.24	Joelho PVC 90 - 75mm - fornecimento e instalação	und	34,00	8,44	286,96		34,00	34,00	-	100,00%	-	286,96	286,96
14.25	Joelho PVC 90 - 50mm - fornecimento e instalação	und	24,00	6,55	157,20		24,00	24,00	-	100,00%	-	157,20	157,20
14.26	Joelho PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	5,03	95,57		19,00	19,00	-	100,00%	-	95,57	95,57
14.27	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1/2" - fornecimento e instalação	und	65,00	5,03	326,95		65,00	65,00	-	100,00%	-	326,95	326,95
14.28	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	25,00	48,93	1.223,25		25,00	25,00	-	100,00%	-	1.223,25	1.223,25
14.29	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	44,29	88,58		2,00	2,00	-	100,00%	-	88,58	88,58
14.30	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	und	19,00	45,56	865,64		19,00	19,00	-	100,00%	-	865,64	865,64
14.31	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	30,39	151,95		5,00	5,00	-	100,00%	-	151,95	151,95
14.32	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	30,39	60,78		2,00	2,00	-	100,00%	-	60,78	60,78
14.33	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	6,00	9,81	58,86		6,00	6,00	-	100,00%	-	58,86	58,86
14.34	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	6,26	31,30		5,00	5,00	-	100,00%	-	31,30	31,30
14.35	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	1,00	11,53	11,53		1,00	1,00	-	100,00%	-	11,53	11,53
14.36	Te PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	11,53	219,07		19,00	19,00	-	100,00%	-	219,07	219,07
14.37	Te PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	31,00	37,56	1.164,36		31,00	31,00	-	100,00%	-	1.164,36	1.164,36
14.38	Te PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	und	2,00	87,76	175,52		2,00	2,00	-	100,00%	-	175,52	175,52
14.39	Te PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	und	18,00	11,98	215,64		18,00	18,00	-	100,00%	-	215,64	215,64
14.40	Te PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	4,00	28,84	115,36		4,00	4,00	-	100,00%	-	115,36	115,36
15	LOUCAS E METAIS				60.645,54						0,00	44.333,70	44.333,70
15.1	Bacia sanitária wogue plus. Linha conforto com abertura, cor branco gelo, código p.51,DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para floação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	und	2,00	1.307,24	2.614,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	2.614,48	2.614,48
15.2	Bacia sanitária convencional, código toy p.11, DECA ou equivalente, com acessórios fornecimento e instalação	und	4,00	315,08	1.260,32		4,00	4,00	-	100,00%	-	1.260,32	1.260,32

FCO ANDER CAVALCANTE BARROS
 Secretário Municipal da Educação
 Jaguaribe - Pernambuco
 Portaria Nº 249/2024
 CPF: 743.347.053-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONVÊNIO: PAR 11681/2014/FNDE	MEDIÇÃO Nº: 34	CONTRATO: 1.811.634,40	ADITIVO: 324.759,36
CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023	REAJUSTE (REEQUILÍBRIO): 819.365,98	REAJUSTE: 77.128,02	
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			TOTAL: 3.032.887,76	MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.860.527,98	
			SALDO: 172.359,78	VALOR DA MEDIÇÃO: 23.028,60	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15.3	Bacia convencional studio kids, código PL16, para válvula de descarga, em louça branca assento plástico, anel de vedação, tubo pvc largo - fornecimento e instalação (deze ou equivalente)	und	20,00	589,86	11.797,20		20,00	20,00	-	100,00%	-	11.797,20	11.797,20
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	und	26,00	386,75	10.055,50		26,00	26,00	-	100,00%	-	10.055,50	10.055,50
15.5	Assento políester com abertura frontal vogue plus, linha conforto, cor branco gelo, código AP-52, DECA, ou equivalente	und	2,00	991,76	1.983,52		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.983,52	1.983,52
15.6	Assento plástico lzy, código AP-01, DECA	und	4,00	34,10	136,40		4,00	4,00	-	100,00%	-	136,40	136,40
15.7	Papeleira Metálica linha lzy, código 2020.c37 DECA equivalente	und	26,00	28,19	732,94		-	-	26,00	0,00%	-	-	-
15.8	Ducha higiênica com registro e derivação lzy código 1994 c37 ext. cr DECA ou equivalente	und	4,00	167,61	670,44		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha lzy código 1101,17, DECA ou equivalente, com válvula sifão e encaixe flexível cromados	und	4,00	113,76	455,04		4,00	4,00	-	100,00%	-	455,04	455,04
15.10	Lavatório pequeno ravena lzy cor branco gelo, com coluna suspensa, código 1915 DECA ou equivalente	und	6,00	132,45	800,70		6,00	6,00	-	100,00%	-	800,70	800,70
15.11	Cuba de embutir oval cor branco gelo, código 117, DECA, ou equivalente em bancada e complementos (válvulas, sifão e engate flexível cromados) exceto torneira	und	22,00	156,59	3.444,98		22,00	22,00	-	100,00%	-	3.444,98	3.444,98
15.12	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1,1/2x1,1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2x1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	3,00	160,18	480,54		3,00	3,00	-	100,00%	-	480,54	480,54
15.13	Cuba inox embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1,1/2x1,1/2". Válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2x1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	15,00	360,33	5.524,95		15,00	15,00	-	100,00%	-	5.524,95	5.524,95
15.14	Dispenser saboneteira linha excelence, código 7009, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	20,66	537,16		-	-	26,00	0,00%	-	-	-
15.15	Dispenser toalha linha excelence, código 7007, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	21,44	557,44		-	-	26,00	0,00%	-	-	-
15.16	Barra de apoio, linha conforto, código 2110.1080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	und	8,00	33,55	268,40		-	-	8,00	0,00%	-	-	-
15.17	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, celite ou equivalente	und	4,00	16,15	64,60		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
15.18	Barra de apoio de chuveiro PME, em T, linha conforto código 2335.1.ESC	und	1,00	86,16	86,16		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
15.19	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1,1/4"	und	20,60	119,61	2.463,97		-	-	20,60	0,00%	-	-	-
15.20	Banheira embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, burigatto ou equivalente	und	4,00	540,95	2.163,80		4,00	4,00	-	100,00%	-	2.163,80	2.163,80
15.21	torneira elétrica lorensay, LORENZETTI ou equivalente	und	2,00	274,89	549,78		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
15.22	Torneira elétrica ford max, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	und	4,00	285,14	1.140,56		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
15.23	Torneira acabamento para registro pequeno linha lzy, código 4900.c37.pz, DECA ou equivalente (para chuveiro) deca ou equivalente	und	15,00	169,35	2.540,25		-	-	15,00	0,00%	-	-	-
15.24	Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy código 1167.c37, DECA ou equivalente	und	15,00	159,40	2.391,00		-	-	15,00	0,00%	-	-	-
15.25	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	und	11,00	23,79	261,69		-	-	11,00	0,00%	-	-	-
15.26	Torneira para lavatório de mesa bica lzy, código 1193, Deca ou equivalente	und	32,00	79,65	2.548,80		-	-	32,00	0,00%	-	-	-
15.27	Chuveiro maii ducha, LORENZETTI, com mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8110-A, LORENZETTI, ou equivalente	und	15,00	99,91	1.498,65		-	-	15,00	0,00%	-	-	-
15.28	Tanque grande (40 L) cor branco gelo, código TO-03, DECA ou equivalente incluso torneira cromada	und	7,00	516,61	3.616,27		7,00	7,00	-	100,00%	-	3.616,27	3.616,27
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL				3.468,53						0,00	2.065,17	2.065,17
16.1	Abriço para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	412,89	586,30		1,42	1,42	-	100,00%	-	586,30	586,30
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16	768,73	123,00		-	-	0,16	0,00%	-	-	-
16.3	Tubo de aço galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	18,20	782,60		43,00	43,00	-	100,00%	-	782,60	782,60
16.4	Envelhecimento de concreto - 3cm	m	42,00	13,34	560,28		42,00	42,00	-	100,00%	-	560,28	560,28

RCO
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 JAGUARIBE - CE
 14/01/2024
 CPF: 742.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONVÊNIO: PAR 11681/2014/FNDE	MEDIÇÃO No. 34	CONTRATO: 1.811.634,40	ADITIVO: 324.759,36
CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	REALISTE / REEQUILIBRIO: 819.365,98	REALISTE: 77.128,02	TOTAL: 3.032.887,76	
OBRA: CRECHE PROFUNDINÇA TIPO I NO BARRIO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023	MEDIÇÃO ACUMULADO: 2.860.527,98	SALDO: 172.359,78	VALOR DA MEDIÇÃO: 23.028,60	


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.5	Fita anticomora 5cmx20m (2 camadas)	und	3,00	30,76	92,28		3,00	3,00	-	100,00%	-	92,28	92,28
16.6	Valvula esfera O 3/4" NPT 300	und	4,00	71,93	287,72		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
16.7	União 3/4" NPT 300	und	3,00	2,63	7,89		3,00	3,00	-	100,00%	-	7,89	7,89
16.8	Niple 3/4" NPT 300	und	6,00	59,03	354,18		-	-	6,00	0,00%	-	-	-
16.9	Niple 1/2" NPT 300	und	4,00	12,73	50,92		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
16.10	Niple 1/4" NPT 300	und	4,00	28,76	115,04		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
16.11	Te redução 3/4"x1/2"	und	1,00	7,06	7,06		1,00	1,00	-	100,00%	-	7,06	7,06
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	und	1,00	4,78	4,78		1,00	1,00	-	100,00%	-	4,78	4,78
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	und	2,00	6,24	12,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	12,48	12,48
16.14	Luva de redução 1/4 x 1/2"	und	2,00	0,75	1,50		2,00	2,00	-	100,00%	-	1,50	1,50
16.15	Jelho 1/2" nut 300	und	2,00	5,00	10,00		2,00	2,00	-	100,00%	-	10,00	10,00
16.16	Regulador 1" estacoio com manometro	und	1,00	51,06	51,06		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
16.17	Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi	und	1,00	84,16	84,16		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
16.18	Manguera flexivel	m	2,00	19,63	39,66		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.20	Regulador 2" estacoio com registro	und	2,00	51,06	102,12		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x248) proibido fumar	und	1,00	97,75	97,75		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
16.22	Placa de sinalização em pvc cod 5 - (348x248) perigo inflamavel	und	1,00	97,75	97,75		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO				55.900,47						0,00	52.103,21	52.103,21
17.1	Extintor ABC - 6KG	und	7,00	290,76	2.035,32		7,00	7,00	-	100,00%	-	2.035,32	2.035,32
17.2	Extintor Co2 - 6kg	und	1,00	992,58	992,58		1,00	1,00	-	100,00%	-	992,58	992,58
17.3	Cotovelo 45 galvanizado 2 1/2"	und	2,00	37,61	75,22		2,00	2,00	-	100,00%	-	75,22	75,22
17.4	Cotovelo 45 galvanizado 2 1/2"	und	7,00	37,61	263,27		7,00	7,00	-	100,00%	-	263,27	263,27
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	und	1,25	197,70	247,13		1,25	1,25	-	100,00%	-	247,13	247,13
17.6	Niple duplo asp galvanizado 2 1/2"	und	10,00	69,58	695,80		10,00	10,00	-	100,00%	-	695,80	695,80
17.7	Te aço galvanizado 2 1/2"	und	4,00	119,40	477,60		4,00	4,00	-	100,00%	-	477,60	477,60
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 1/2"	und	90,96	91,50	8.322,84		90,96	90,96	-	100,00%	-	8.322,84	8.322,84
17.9	Absortador stoz - rosca internas 2 1/2"	und	3,00	123,11	369,33		-	-	3,00	0,00%	-	-	-
17.10	Caixa para abrio de manueira - 70x50x25 cm	und	2,00	680,43	1.360,86		1,00	1,00	1,00	50,00%	-	680,43	680,43
17.11	Chave para conexão de manueira tipo stroz rapido - dupla 1 1/2 x 1 1/2"	und	3,00	26,79	80,37		3,00	3,00	-	100,00%	-	80,37	80,37
17.12	Esquicho lato solido 1 1/2" 16mm	und	3,00	100,71	302,13		3,00	3,00	-	100,00%	-	302,13	302,13
17.13	Manueiras 1 1/2" 16mm	und	4,00	468,78	1.875,12		4,00	4,00	-	100,00%	-	1.875,12	1.875,12
17.14	Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"	und	3,00	69,58	208,74		3,00	3,00	-	100,00%	-	208,74	208,74
17.15	Redução giratoria tipo Stroz - 2 1/2 x 1 1/2"	und	3,00	200,73	602,19		3,00	3,00	-	100,00%	-	602,19	602,19
17.16	Registro dobro 2 1/2" 45	und	3,00	281,08	843,24		-	-	3,00	0,00%	-	-	-
17.17	Tampão copo com corante tipo stoz. 1 1/2"	und	3,00	109,74	329,22		-	-	3,00	0,00%	-	-	-
17.18	Registro bruto de cavata industrial 2 1/2"	und	5,00	343,85	1.719,25		5,00	5,00	-	100,00%	-	1.719,25	1.719,25
17.19	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	und	2,00	541,96	1.083,92		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.083,92	1.083,92
17.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	und	4,00	310,05	1.240,20		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
17.21	luminaria de emergencia complada fluorescente 9w de 1 hora	und	40,00	535,79	21.431,60		40,00	40,00	-	100,00%	-	21.431,60	21.431,60
17.22	Marcação no piso - 1x1m para extintor	und	8,00	30,44	243,52		-	-	8,00	0,00%	-	-	-
17.23	Marcação no piso - 1x1m para extintor	und	3,00	30,44	91,32		-	-	3,00	0,00%	-	-	-
17.24	Conjunto motobomba trifásica Bc-21 R 1 1/2 3 CV	und	2,00	4.096,35	8.192,70		2,00	2,00	-	100,00%	-	8.192,70	8.192,70
17.25	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio	und	2,00	97,75	195,50		2,00	2,00	-	100,00%	-	195,50	195,50
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (310x150) Saída de emergencia	und	15,00	97,75	1.466,25		15,00	15,00	-	100,00%	-	1.466,25	1.466,25
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (310x150) Mensagem "saída"	und	3,00	97,75	293,25		3,00	3,00	-	100,00%	-	293,25	293,25
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de incendio	und	8,00	97,75	782,00		8,00	8,00	-	100,00%	-	782,00	782,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				250.183,31						0,00	176.702,75	176.702,75
18.1	Quadro de distribuição de embur completo, (para 08 disjuntor monopolares, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi corbeze, c/ porta, binco e acessórios)	und	2,00	449,80	899,60		2,00	2,00	-	100,00%	-	899,60	899,60
18.2	Quadro de distribuição de embur completo, (para 18 disjuntor monopolares, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi corbeze, c/ porta, binco e acessórios)	und	3,00	449,80	1.349,40		3,00	3,00	-	100,00%	-	1.349,40	1.349,40

RECIBO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
PREFEITURA Nº 249/2021
CPF: 710.349.063-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONVÊNIO: PAR 11681/2014/FNDE	MEDIÇÃO No. 34	CONTRATO: 1.811.634,40	ADITIVO: 324.759,36
OBRA: CRECHE PROFUNDÁNCIA TIPO I NO BARRIO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	REAJUSTE /REQUILIBRIO 819.365,98	REAJUSTE 77.128,02	
			TOTAL: 3.032.887,76		
			PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023	MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.860.527,98	SALDO: 172.359,78
VALOR DA MEDIÇÃO:					23.028,60

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18.3	Quadro de distribuição de embutir completo, (para 24 disjuntor monophasicos, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi (corbebe, c/ porta, trinco e acessórios)	und	2,00	497,95	995,90		2,00	2,00	-	100,00%	-	995,90	995,90
18.4	Quadro de medição - fornecimento e instalação DISJUNTORES	und	1,00	926,73	926,73		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
18.5	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	23,00	14,18	326,14		23,00	23,00	-	100,00%	-	326,14	326,14
18.6	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	und	7,00	14,18	99,26		7,00	7,00	-	100,00%	-	99,26	99,26
18.7	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	und	19,00	14,18	269,42		19,00	19,00	-	100,00%	-	269,42	269,42
18.8	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	und	26,00	14,18	368,68		26,00	26,00	-	100,00%	-	368,68	368,68
18.9	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	und	4,00	95,20	380,80		4,00	4,00	-	100,00%	-	380,80	380,80
18.10	Disjuntor unipolar termomagnético 30A	und	2,00	14,41	28,82		2,00	2,00	-	100,00%	-	28,82	28,82
18.11	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	und	8,00	21,74	173,92		8,00	8,00	-	100,00%	-	173,92	173,92
18.12	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	und	2,00	95,20	190,40		2,00	2,00	-	100,00%	-	190,40	190,40
18.13	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	und	1,00	22,13	22,13		1,00	1,00	-	100,00%	-	22,13	22,13
18.14	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	und	8,00	126,40	1.011,20		8,00	8,00	-	100,00%	-	1.011,20	1.011,20
18.15	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	und	-	92,30	0,00		-	-	-	-	-	-	-
18.16	Disjuntor unipolar termomagnético 160A	und	-	40,79	0,00		-	-	-	-	-	-	-
18.17	Disjuntor bipolar termomagnético 100A	und	-	73,05	0,00		-	-	-	-	-	-	-
18.18	interuptor bipolar DR - 10A	und	3,00	92,30	276,90		3,00	3,00	-	100,00%	-	276,90	276,90
18.19	interuptor bipolar DR - 25A	und	2,00	40,79	81,58		2,00	2,00	-	100,00%	-	81,58	81,58
18.20	interuptor bipolar DR - 63A	und	1,00	73,05	73,05		1,00	1,00	-	100,00%	-	73,05	73,05
18.21	interuptor tetrapolar DR - 80A	und	1,00	331,29	331,29		1,00	1,00	-	100,00%	-	331,29	331,29
18.22	Dispositivo de proteção contra surto - 175v - 40KA	und	14,00	1.124,31	15.740,34		14,00	14,00	-	100,00%	-	15.740,34	15.740,34
18.23	Dispositivo de proteção contra surto - 175v - 80KA	und	8,00	1.208,50	9.668,00		8,00	8,00	-	100,00%	-	9.668,00	9.668,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
18.24	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø20mm (DN 3/4") inclusive conexões	m	572,20	5,53	3.164,27		572,20	572,20	-	100,00%	-	3.164,27	3.164,27
18.25	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø25mm (DN 1") inclusive conexões	m	368,20	7,01	2.581,08		368,20	368,20	-	100,00%	-	2.581,08	2.581,08
18.26	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø32mm (DN 1 1/2") inclusive conexões	m	463,40	9,69	4.490,35		463,40	463,40	-	100,00%	-	4.490,35	4.490,35
18.27	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø50mm (DN 2") inclusive conexões	m	12,80	22,56	288,77		12,80	12,80	-	100,00%	-	288,77	288,77
18.28	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø75mm (DN 3") inclusive conexões	m	21,60	29,79	643,46		21,60	21,60	-	100,00%	-	643,46	643,46
18.29	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø100mm (DN 4") inclusive conexões	m	18,80	50,53	949,96		18,80	18,80	-	100,00%	-	949,96	949,96
18.30	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø125mm (DN 5") inclusive conexões	m	5,50	86,58	476,19		5,50	5,50	-	100,00%	-	476,19	476,19
18.31	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço. Ø150mm (DN 6") inclusive conexões	m	27,20	115,41	3.139,15		27,20	27,20	-	100,00%	-	3.139,15	3.139,15
18.32	Eletroduto ferro galvanizado DN 25mm (1") inclusive conexões	m	45,70	39,71	1.814,75		-	-	45,70	0,00%	-	-	-
18.33	Eletroduto ferro galvanizado DN 32mm (1 1/4") inclusive conexões	m	29,50	66,95	1.975,03		-	-	29,50	0,00%	-	-	-
18.34	Eletroduto ferro galvanizado DN 20mm (3/4") inclusive conexões	m	80,60	37,68	3.037,01		-	-	80,60	0,00%	-	-	-
18.35	Eletroduto ferro galvanizado DN 100mm (4") inclusive conexões	m	14,70	123,16	1.810,45		-	-	14,70	0,00%	-	-	-
18.36	Canelas PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação	und	2,00	19,75	39,50		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
18.37	Canelas PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação	und	3,00	23,61	70,83		-	-	3,00	0,00%	-	-	-
18.38	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	219,35	658,05		3,00	3,00	-	100,00%	-	658,05	658,05
18.39	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	240,30	720,90		3,00	3,00	-	100,00%	-	720,90	720,90
18.40	Caixa Inspeção aterramento 250x250x400mm CABOS E FIOS (CONDUTORES) Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC70c, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordamento classe 5, flexível com as seguintes seções nominais	und	2,00	68,59	137,18		2,00	2,00	-	100,00%	-	137,18	137,18
18.41	a #2,5 mm² - preço licitado	m	2.565,25	2,89	7.413,57		2.565,25	2.565,25	-	100,00%	-	7.413,57	7.413,57
	b #2,5 mm² - preço reequilibrado	m	2.565,25	7,56	19.393,29		2.565,25	2.565,25	-	100,00%	-	19.393,25	19.393,25
18.42	a #4 mm² - preço licitado	m	253,30	4,19	1.061,33		253,30	253,30	-	100,00%	-	1.061,33	1.061,33
	b #4 mm² - preço reequilibrado	m	253,30	8,90	2.254,37		253,30	253,30	-	100,00%	-	2.254,37	2.254,37

PCO. BILSON ZABRADO
Secretaria Municipal de Educação
Cidade de Jaguaribe, CE
PREF. Nº 219/2021
CPF: 742.347.033-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)					
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO No. 34		CONTRATO: 1.811.634,40					
		WM CONSTRUÇÕES LTDA				DATA:		ADITIVO: 324.759,36					
		CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE		segunda-feira, 22 de janeiro de 2024		REAJUSTE / REEQUILÍBRIO: 819.365,98					
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.								REAJUSTE: 77.128,02					
								TOTAL: 3.032.887,76					
						PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023		MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.860.527,98					
								SALDO: 172.359,78					
								VALOR DA MEDIÇÃO: 23.028,60					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18.43	a #6 mm² - preço listado	m	2.019,80	5,66	11.432,07		2.019,80	2.019,80	-	100,00%	-	11.432,07	11.432,07
	b #6 mm² - preço reequilibrado	m	2.019,80	10,61	21.430,08		2.019,80	2.019,80	-	100,00%	-	21.430,08	21.430,08
18.44	a #10 mm² - preço listado	m	638,48	8,64	5.430,07		638,48	638,48	-	100,00%	-	5.430,07	5.430,07
	b #10 mm² - preço reequilibrado	m	1.902,02	13,79	26.228,86		1.902,02	1.902,02	0,00	100,00%	-	26.228,83	26.228,83
18.45	#16 mm²	m	186,90	18,71	3.496,90		186,90	186,90	-	100,00%	-	3.496,90	3.496,90
18.46	#25 mm²	m	52,10	28,28	1.473,39		26,05	26,05	26,05	50,00%	-	736,69	736,69
18.47	#35 mm²	m	156,30	37,35	5.837,81		78,15	78,15	78,15	50,00%	-	2.918,90	2.918,90
18.48	#50 mm²	m	51,30	48,03	2.463,94		51,30	51,30	-	100,00%	-	2.463,94	2.463,94
18.49	#70 mm²	m	52,00	68,86	3.580,72		26,00	26,00	26,00	50,00%	-	1.790,36	1.790,36
18.50	#95 mm²	m	153,90	93,83	14.440,44		76,95	76,95	76,95	50,00%	-	7.220,22	7.220,22
18.51	#120 mm²	m	156,00	108,58	16.938,48		78,00	78,00	78,00	50,00%	-	8.469,24	8.469,24
ELETRICALHAS													
18.52	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,70	12,14	8,50		0,70	0,70	-	100,00%	-	8,50	8,50
18.53	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,70	11,35	212,25		18,70	18,70	-	100,00%	-	212,25	212,25
18.54	Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,60	11,71	42,16		3,60	3,60	-	100,00%	-	42,16	42,16
18.55	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00	15,80	94,80		6,00	6,00	-	100,00%	-	94,80	94,80
18.56	Eletrocalha lisa tipo U 20x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,30	19,03	81,83		4,30	4,30	-	100,00%	-	81,83	81,83
18.57	Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões	m	4,40	24,24	106,66		4,40	4,40	-	100,00%	-	106,66	106,66
18.58	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,50	35,20	158,40		4,50	4,50	-	100,00%	-	158,40	158,40
18.59	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	35,30	5,89	207,92		35,30	35,30	-	100,00%	-	207,92	207,92
18.60	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00	7,93	47,58		6,00	6,00	-	100,00%	-	47,58	47,58
18.61	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	1,30	8,45	10,99		1,30	1,30	-	100,00%	-	10,99	10,99
18.62	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	und	2,00	9,40	18,80		2,00	2,00	-	100,00%	-	18,80	18,80
18.63	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	und	3,00	9,40	28,20		3,00	3,00	-	100,00%	-	28,20	28,20
18.64	Suporte vertical eletrocalha 120x204mm	und	3,00	9,40	28,20		3,00	3,00	-	100,00%	-	28,20	28,20
18.65	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	und	3,00	5,79	17,37		3,00	3,00	-	100,00%	-	17,37	17,37
18.66	Suporte vertical eletrocalha 70x154mm	und	4,00	5,79	23,16		4,00	4,00	-	100,00%	-	23,16	23,16
18.67	Suporte vertical eletrocalha 70x183mm	und	3,00	5,79	17,37		3,00	3,00	-	100,00%	-	17,37	17,37
18.68	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	und	20,00	5,79	115,80		20,00	20,00	-	100,00%	-	115,80	115,80
18.69	Suporte vertical eletrocalha 70x66mm	und	11,00	5,79	63,69		11,00	11,00	-	100,00%	-	63,69	63,69
18.70	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	und	4,00	8,13	32,52		4,00	4,00	-	100,00%	-	32,52	32,52
18.71	Tala plana perfurada 50mm	und	28,00	5,41	151,48		28,00	28,00	-	100,00%	-	151,48	151,48
18.72	Tala plana perfurada 75mm	und	4,00	5,79	23,16		4,00	4,00	-	100,00%	-	23,16	23,16
ILUMINAÇÃO E TOMADAS													
18.73	Tomada universal circular. 2p+1. 10A cor branca completa	und	178,00	24,30	4.325,40		100,00	100,00	78,00	56,18%	-	2.430,00	2.430,00
18.74	Tomada universal circular. 2p+1. 20A cor branca completa	und	18,00	42,95	773,10		-	-	18,00	0,00%	-	-	-
18.75	Interruptor simples 10A completa	und	56,00	19,53	1.093,68		30,00	30,00	26,00	53,57%	-	595,90	595,90
18.76	Luminária 2x6w completa	und	111,00	217,26	24.115,86		-	-	-	0,00%	-	-	-
18.77	Luminária 2x14w completa	und	17,00	201,61	3.427,37		-	-	17,00	0,00%	-	-	-
18.78	Luminária 2x36 com abajur completa	und	40,00	105,01	4.200,40		-	-	40,00	0,00%	-	-	-
18.79	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálica 70w	und	15,00	157,06	2.355,90		-	-	15,00	0,00%	-	-	-
18.80	Projeto com lâmpada de vapor metálica 150w	und	4,00	929,24	3.716,96		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
18.81	Projeto com lâmpada de vapor metálica 250w	und	1,00	929,24	929,24		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
18.82	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	und	16,00	104,30	1.668,80		-	-	16,00	0,00%	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1.784,70						0,00	1.784,70	1.784,70
EQUIPAMENTOS PASSIVOS													
19.1	Tubo PVC Soldável Ø 25mm, inclusive conexões	m	149,00	3,86	575,14		149,00	149,00	-	100,00%	-	575,14	575,14
19.2	Jeelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	und	37,00	3,34	123,58		37,00	37,00	-	100,00%	-	123,58	123,58
19.3	Jeelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	14,00	5,64	78,96		14,00	14,00	-	100,00%	-	78,96	78,96
19.4	Caixa de areia 600x60x60cm em alvenaria - execução	und	7,00	149,86	1.049,02		7,00	7,00	-	100,00%	-	1.049,02	1.049,02
20	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA				3.922,97						0,00	3.922,97	3.922,97
EQUIPAMENTOS PASSIVOS													
20.1	Patch Panel 19" - 24 portas, categoria 6	und	2,00	865,11	1.730,22		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.730,22	1.730,22
20.2	Patch Panel 19" - 48 portas, categoria 7	und	2,00	1.696,49	3.392,98		2,00	2,00	-	100,00%	-	3.392,98	3.392,98

PED. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Sec. Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe, CE
 PO 2021/19749/2021
 CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO								VALORES (R\$)			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNTO:	MEDIÇÃO No. 34			CONTRATO:	1.811.634,40				
		WM CONSTRUÇÕES LTDA			DATA:	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024		ADITIVO:	324.759,36				
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO ZÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE			REAJUSTE (REEQUILÍBRIO):	819.365,98					
							REAJUSTE:	77.128,02					
				PERÍODO:	01/12/2023 A 31/12/2023		TOTAL:	3.032.887,76					
							MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.860.527,98					
							SALDO:	172.359,78					
							VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
20.3	Switch de 24 portas	und	1,00	9.013,90	9.013,90		1,00	1,00	-	100,00%	-	9.013,90	9.013,90
20.4	Switch de 48 portas	und	2,00	16.279,20	32.558,40		2,00	2,00	-	100,00%	-	32.558,40	32.558,40
20.5	bloco 110 para rack 19" 100 pares	und	18,00	757,56	13.636,08		18,00	18,00	-	100,00%	-	13.636,08	13.636,08
20.6	Guia de cabos simples	und	2,00	40,53	81,06		2,00	2,00	-	100,00%	-	81,06	81,06
20.7	Guia de cabos vertical, fechado	und	1,00	40,53	40,53		1,00	1,00	-	100,00%	-	40,53	40,53
20.8	Guia de cabos vertical	und	2,00	40,53	81,06		2,00	2,00	-	100,00%	-	81,06	81,06
20.9	Guia de cabos superior, fechado	und	1,00	40,53	40,53		1,00	1,00	-	100,00%	-	40,53	40,53
20.10	Perfil de montagem	und	1,00	71,13	71,13		1,00	1,00	-	100,00%	-	71,13	71,13
20.11	Anel organizador de cabos	und	2,00	2,44	4,88		2,00	2,00	-	100,00%	-	4,88	4,88
20.12	Bandeja deslizando perfurado	und	2,00	327,74	655,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	655,48	655,48
20.13	kit nos niveladores	und	2,00	99,74	199,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	199,48	199,48
CABOS EM PAR TRANÇADOS													
20.14	Cabo UTP CATEGORIA 5e	m	144,00	13,01	1.873,44		144,00	144,00	-	100,00%	-	1.873,44	1.873,44
20.15	Cabo UTP 6 (24Ww)	m	3.191,30	11,79	37.625,43		3.191,30	3.191,30	-	100,00%	-	37.625,43	37.625,43
20.16	Cabo coaxial	m	450,00	12,18	5.481,00		450,00	450,00	-	100,00%	-	5.481,00	5.481,00
CABOS DE CONEXÃO													
20.16	Cabos de conexão - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	und	100,00	65,18	6.518,00		100,00	100,00	-	100,00%	-	6.518,00	6.518,00
20.17	Pluque UTP IDC - 4 pares	und	96,00	189,61	18.202,56		96,00	96,00	-	100,00%	-	18.202,56	18.202,56
TOMADAS													
20.18	Tomada modular RJ45 Categoria 6 -	und	72,00	4,49	323,28		72,00	72,00	-	100,00%	-	323,28	323,28
20.19	Placa 2x4" 1 módulo RJ45	und	26,00	10,68	277,68		26,00	26,00	-	100,00%	-	277,68	277,68
20.20	Placa 2x4" 2 módulo RJ45	und		7,28	0,00				-	100,00%	-		
20.21	Conector de tv tipo F (coaxial)	und	16,00	6,29	100,64		16,00	16,00	-	100,00%	-	100,64	100,64
20.22	Placa 2x4" para tv/set	und	16,00	10,68	170,88		16,00	16,00	-	100,00%	-	170,88	170,88
20.23	Central PSX 50/300	und	1,00	38,46	38,46				1,00	0,00%	-		
CAIXAS E ACESSÓRIOS													
20.24	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	und	7,00	194,28	1.359,96		7,00	7,00	-	100,00%	-	1.359,96	1.359,96
20.25	Caixa de passagem PVC 402" - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO	und	48,00	9,46	454,08		48,00	48,00	-	100,00%	-	454,08	454,08
ELETRODUTO E ACESSÓRIOS													
20.26	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	14,70	10,29	151,26		14,70	14,70	-	100,00%	-	151,26	151,26
20.27	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	77,35	8,10	626,54		77,35	77,35	-	100,00%	-	626,54	626,54
20.28	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões - realuste	m	77,35	9,15	707,75								
20.28	Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões	m	2,65	14,21	37,66		2,65	2,65	-	100,00%	-	37,66	37,66
20.29	Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões - realuste	m	2,65	16,05	42,53								
20.29	Eletroduto ferro galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	5,80	39,71	230,32		5,80	5,80	-	100,00%	-	230,32	230,32
20.30	Eletroduto ferro galvanizado, Ø 2 1/2", fornecimento e instalação	m	22,00	103,95	2.286,90		22,00	22,00	-	100,00%	-	2.286,90	2.286,90
20.31	Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	1,00	25,11	25,11		1,00	1,00	-	100,00%	-	25,11	25,11
20.32	Luva aço 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	6,00	81,24	487,44		6,00	6,00	-	100,00%	-	487,44	487,44
20.33	Eletrocalha contampa 100x 100mm, inclusive conexões	m		0,28	0,00				-	100,00%	-		
20.34	Eletrocalha contampa 100x 50mm, inclusive conexões	m	61,35	11,35	696,32		61,35	61,35	-	100,00%	-	696,32	696,32
20.35	Eletrocalha contampa 50x 50mm, inclusive conexões	m		4,01	0,00				-	100,00%	-		
20.36	Eletrocalha contampa 75x 50mm, inclusive conexões	m		5,40	0,00				-	100,00%	-		
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				7.641,76						0,00	0,00	
21.1	Colô de centro em aço inox de 1200x900x600	und	1,00	1.731,19	1.731,19				1,00	0,00%	-		
21.2	Douto de ligação 1000x 0,80mm	m	5,00	871,89	4.359,45				5,00	0,00%	-		
21.3	Chapeus em alumínio	und	2,00	775,56	1.551,12				2,00	0,00%	-		
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				27.294,96						0,00	25.733,92	25.733,92
22.1	Para-raios franklin em aço inox portas em haste de 3 m x L.1/2" tipo simples	m	3,00	75,55	226,65				3,00	0,00%	-		
22.2	Verilhão CA- 25# 10 MM2	m	42,00	6,95	291,90		42,00	42,00	-	100,00%	-	291,90	291,90
22.3	Conector mini-rgar em bronze estanhado tel-583	und	12,00	8,81	105,72		12,00	12,00	-	100,00%	-	105,72	105,72
22.4	Parafuso fendido em aço inox 4,2x202mm e bucha de nylon	ct	24,00	0,35	8,40		24,00	24,00	-	100,00%	-	8,40	8,40
22.5	Presilha em latão	und	24,00	6,38	153,12		24,00	24,00	-	100,00%	-	153,12	153,12
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento espessura 6mm	und	1,00	305,48	305,48				1,00	0,00%	-		

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
 CPF: 74.111.111-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)					
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNTO:	MEDIÇÃO No. 34		CONTRATO:	1.811.634,40					
		WM CONSTRUÇÕES LTDA					ADITIVO:	324.759,36					
		CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE	DATA:		REAJUSTE (REEQUILÍBRIO)	819.365,98					
OBRA: CRECHE PROFÂNCIA TIPO I NO BARRIO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.					segunda-feira, 22 de janeiro de 2024		REAJUSTE	77.128,02					
							TOTAL:	3.032.887,76					
				PERÍODO:	01/12/2023 A 31/12/2023		MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.860.527,98					
							SALDO:	172.359,78					
							VALOR DA MEDIÇÃO:	23.028,60					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
22.7	Escavação de vala para aterramento		39,00	4,00	156,00		39,00	39,00	-	100,00%	-	156,00	156,00
22.8	Heste tipo cooperwell 5"Ø x 2,40m.	und	12,00	48,35	580,20		12,00	12,00	-	100,00%	-	580,20	580,20
22.9	Cordaalha de cobre nu 16 mm2	m	5,00	28,85	144,25		5,00	5,00	-	100,00%	-	144,25	144,25
22.10	Cordaalha de cobre nu 35 mm2	m	330,00	37,20	12.276,00		330,00	330,00	-	100,00%	-	12.276,00	12.276,00
22.11	Cordaalha de cobre nu 50 mm2	m	260,00	45,38	11.798,80		260,00	260,00	-	100,00%	-	11.798,80	11.798,80
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 1/2", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	und	4,00	257,24	1.028,96		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
22.13	Conector de bronze para heste de 5"Ø e cabo 50mm²	und	12,00	16,29	195,48		12,00	12,00	-	100,00%	-	195,48	195,48
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				121.309,54						20.995,71	82.790,46	103.386,17
23.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (al=7m 3m2 +4m1 1/2")	und	1,00	4.617,78	4.617,78		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
A	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	24,27	486,03	11.793,52		24,27	24,27	-	100,00%	-	11.793,52	11.793,52
B	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto - reajuste	m²	24,27	548,78	13.318,89	24,27		24,27	-	100,00%	13.318,89	13.318,89	13.318,89
A	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	15,00	486,03	7.290,45		15,00	15,00	-	100,00%	-	7.290,45	7.290,45
B	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto - reajuste	m²	41,26	548,78	22.642,66	13,26	28,00	41,26	-	100,00%	7.276,82	15.365,84	22.642,66
23.4	Prateleira e escaninhos em mdf	m²	61,37	196,81	12.078,23		-	-	61,37	0,00%	-	-	-
23.5	Bancos de concreto	m²	7,22	189,16	1.365,74		7,22	7,22	-	100,00%	-	1.365,74	1.365,74
23.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	339,05	1.227,36		-	-	3,62	0,00%	-	-	-
23.7	Peluri em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pinçadeira	m	130,75	94,55	12.362,41		130,75	130,75	-	100,00%	-	12.362,41	12.362,41
	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L												
23.8	Reservatório em anéis pré-moldados de concreto, Ø 2,50m, cap. 20m³, com cisterna de 10m³, h=11,43m, escada metálica com guarda corpo e abrigo p/ motobomba com portão de ferro - fuste 6,70m	und	1,00	34.612,50	34.612,50		1,00	1,00	-	100,00%	-	34.612,50	34.612,50
24	SERVIÇOS FINAIS				4.953,55						0,00	0,00	-
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	3,28	4.953,55		-	-	1.510,23	0,00%	-	-	-
TOTAL GERAL R\$					3.032.887,76					0,76%	23.028,60	2.837.499,38	2.860.527,98

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
 Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

WM CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio-Administrador

Rafael Pinheiro Figueredo
 Rafael Pinheiro Figueredo
 Engº Civil-CREA-CE48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

FCO HEDER CARVALHO BARROSO
 Secretaria Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 RFB/2023 Nº 269/2021
 CEP: 740-347/063-49

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 22 DE JANEIRO DE 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 34ª MEDIÇÃO

6	ESQUADRAS		
6.38	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação		
	QUANTIDADE	6,50	m ²
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	6,50	m²
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.2 B	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto - reajuste		
	QUANTIDADE	24,27	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	24,27	und
23.3 B	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto - reajuste		
	QUANTIDADE	13,26	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	13,26	und


FCO EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
R. Cal. Uru, Jaguaribe/CE
RFP: 002A Nº 269/2021
CPF: Nº 3.347.003-49


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9


RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0

 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS	Nº DA LICENÇA 406	
	DATA APROVAÇÃO 02/12/2015	
	PROCESSO	VALIDADE 31/12/2024

ENDEREÇO RUA SÁTIRO COSTA, Nº 265		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO JOÃO PAULO II	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA					
NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66			CNPJ / CPF 07443708000166		OBRA PÚBLICA? NÃO
PROJETO (AUTOR) YUKIO DIÓGENES BEZERRA CPF:			CREA/CAU RNP 0618515844	ART CE 20220999891	
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAFAEL PINHEIRO DE FIGUEIRÊDO CPF:			CREA/CAU RNP 0610465660	ART CE 20231163871	
COD. OBRA 406	ÁREA DO TERRENO 2.400,00 m ²	ÁREA CONSTRUÍDA 2376,36 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
VALOR DA OBRA 1.811.634,40			DATA DO INÍCIO DA OBRA 02/12/2015		
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FINAL DA OBRA 15/08/2023	
DESCRIÇÃO DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.					
IMPRESSÃO JAGUARIBE, 23 DE Janeiro DE 2024 CÓD DE VALIDAÇÃO: 0003E1235X8120000406					
 Rafael Gomes Diógenes <small>Secretário de Infraestrutura, Trânsito e Urbanismo PORTARIA 274/2021 CPE 608.333.063-29</small>					
ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO					1
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL					

Scaneie para validar este documento



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241364809

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20160014859

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **0610465630**
Registro: **487580 CE**

Empresa contratada: **WM CONSTRUÇÕES LTDA** Registro: **0000299950-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: **SN**
Complemento: - Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jaguaribe** UF: **CE** CEP: **63475000**

Contrato: **06.06.01/2015** Celebrado em: **02/12/2015**
Valor: **R\$ 1.811.934,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO Nº: -
Complemento: - Bairro: **JOÃO PAULO II**
Cidade: **Jaguaribe** UF: **CE** CEP: **63475000**
Data de início: **02/12/2015** Previsão de término: **15/08/2024** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Escolar** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
10 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA	1,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a Complementação da Prestação dos Serviços de Construção de uma Creche Proinfância (Tipo 1), no Bairro João Paulo II Aditivo: 10F, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 816.524.013-81

Local: _____ de _____ de _____
Cidade: _____ Estado: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **15/02/2024**

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DD0d6
Impresso em: 15/02/2024 às 16:05:02 por: ip: 177.22.98.97

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconexão@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **05/01/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888942, -38.623393**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
 Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

_____ de _____ de _____
Local data

Município: Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

PSO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe - CE
PORT. Nº 289/2021
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804





**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06.08.01/2015

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 23 de Janeiro de 2024.


WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:18 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2024.

Código de controle da certidão: **BC31.7F65.C7D6.AD68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400258818

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2024 ÀS 13:08:37
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/342031

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 22 de Novembro de 2023 (16:50:13)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 20/02/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013103362360495141

Informação obtida em 06/02/2024 14:55:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão nº: 608459/2024
Expedição: 03/01/2024, às 13:05:34
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

: 4 de 21

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.207,0

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 30/12/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
109 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE						
Férias (19/12/2023 a 28/12/2023)						
003055	FRANCISCO FLAVIO DUARTE					
Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.005,62		
		310 INSS	9%		80,28	
				1.005,62	80,28	
			FGTS: 80,44	Líquido a receber:	925,34	
		Date: / /	Assinatura: Francisco Flavio Duarte			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/03/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.005,62	1.005,62
Total: 109 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE						
		011 Salário-Base		1.005,62	(1 empregado)	
		310 INSS			80,28	
				1.005,62	80,28	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 80,44	Líquido a receber:	925,34	
			BC-INSS: 1.005,62	BC-FGTS: 1.005,62		



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 15:25:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 160.445,60	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.835,64	14-ENCARGOS 1.360,01	15-TOTAL A RECOLHER 14.195,65
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2024

858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 15:25:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 160.445,60	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.835,64	14-ENCARGOS 1.360,01	15-TOTAL A RECOLHER 14.195,65
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2024

858500001416 956501802404 207684203804 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.10
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 113.232-6
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000141-6 95650180240-4 20768420380-4 23643810001-1
Data do pagamento	07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	02364381/0001-13
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	14.195,65
Valor Total	14.195,65

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 2.919.2CF.EC0.797.117

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	62267215 / Reinf CP 23860397967 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.619,69	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 24.949,04	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.553,65	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.814,17	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 45.936,55	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatível, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/01/2024 11:44:05
Nº do recibo de entrega	0000050000199049519
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000199049519
Data/Hora da Transmissão	18/01/2024 11:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	62267215 / Reinf CP 23860397967 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2023	9.795,13	9.795,13	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2023	824,56	824,56	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	668,96	668,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2023	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	50,17	50,17	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	83,62	83,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,68	6,68	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	33,44	33,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	50,17	50,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	20,06	20,06	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2023	3.814,17	3.814,17	0,00

Obra: 51.226.32327/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	287,32	287,32	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	21,54	21,54	0,00

Obra: 51.226.32327/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	8,61	8,61	0,00

Obra: 51.235.55060/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	24,66	24,66	0,00

Obra: 51.235.55060/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

Código	Descrição	PA Débito	Original	Vinculados	Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	41,10	41,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	3,28	3,28	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	16,44	16,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	24,66	24,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	9,86	9,86	0,00

Obra: 51.240.01624/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	56,73	56,73	0,00

Obra: 51.240.01624/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	94,56	94,56	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	7,56	7,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	37,82	37,82	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	56,73	56,73	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	22,69	22,69	0,00

Obra: 51.243.58943/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	432,52	432,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	32,43	32,43	0,00

Obra: 51.243.58943/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	12,97	12,97	0,00

Obra: 51.243.60645/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	46,92	46,92	0,00

Obra: 51.243.60645/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 51.246.15952/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	2.224,64	2.224,64	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	166,84	166,84	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	278,08	278,08	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	22,24	22,24	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	111,23	111,23	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	166,84	166,84	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	66,73	66,73	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.884,02	1.884,02	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	381,51	381,51	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	235,50	235,50	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	18,84	18,84	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	94,20	94,20	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	141,30	141,30	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	56,52	56,52	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.256,20	1.256,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	94,21	94,21	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	37,68	37,68	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	46,92	46,92	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
-----------------------	--	--	--	--	--

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	1.152,36	1.152,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	86,42	86,42	0,00

Obra: 90.002.21553/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.54460/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	630,52	630,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	47,28	47,28	0,00

Obra: 90.002.54460/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.010.64486/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	7.743,52	7.743,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	580,76	580,76	0,00

Obra: 90.010.64486/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	967,94	967,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	77,43	77,43	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	387,17	387,17	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	580,76	580,76	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	232,30	232,30	0,00

Obra: 90.011.15078/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	494,99	494,99	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	37,12	37,12	0,00

Obra: 90.011.15078/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	61,87	61,87	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	4,94	4,94	0,00

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	24,74	24,74	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	37,12	37,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	14,84	14,84	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2023	3.488,30	3.488,30	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2023	261,62	261,62	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2023	436,03	436,03	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2023	34,88	34,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	12/2023	174,41	174,41	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	12/2023	261,62	261,62	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2023	104,64	104,64	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

HORA: 21:49:33

PÁG : 0003

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA						Nº ARQUIVO: G0mtAiaq7a40000-5
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50						INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE						Nº CONTROLE: BVWuxo11S00000-9
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05						INSCRIÇÃO: 512355506074
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205				BAIRRO: CAJAZEIRAS		CNAE PREPONDERANTE: 4120400
				TELEFONE: 085-34970740		CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:						
	507	620	744	779	TOTAL	

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	328,82	0,00	0,00	0,00	328,82	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	483,26	0,00	0,00	0,00	483,26	
OUTRAS ENTIDADES	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35	
TOTAL A RECOLHER	578,61	0,00	0,00	0,00	578,61	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(M) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 21:49:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	44
REMUNERAÇÃO	160.445,60
DEPÓSITO	12.835,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.835,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024

HORA: 21:49:33

PÁG : 0003/0016

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001280 356401802404 107684200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° ARQUIVO: G0mtAiAq7a40000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: CCKqIpC6ULX0000-5

TOMADOR/OBRA : CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 512355506074 N° CONTROLE: BVNwuxo11S00000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 SN JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.644,11	REM SEM 13° SALÁRIO	1.644,11
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	598,59
		DEPÓSITO	179,41
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.644,11	REM SEM 13° SALÁRIO	1.644,11
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	598,59
CONTR SEGURADOS DEVIDA	129,78	DEPÓSITO	179,41
VAL DEVIDO PREV SOC	578,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 21:49:33
PÁG : 0008/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001280 356401802404 107684200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 512355506074

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FRANCISCO FLAVIO DUARTE	1.644,11	598,59	168.35593.40-8	0,00	10/03/2023	01					179,41	07170	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.644,11 598,59 0,00 129,78 179,41 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 21:49:33
PÁG : 0009/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001280 356401802404 107684200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: BVNwuxo11S00000-9

N° ARQUIVO: GontAiAq7a40000-5
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 512355506074

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.644,11	598,59	1.644,11	0,00
TOTAIS:	1	1.644,11	598,59	1.644,11	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: G0mtAiaq7a40000-5
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: BVNwuxo11S00000-9 INSCRIÇÃO: 51235506074

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	578.61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	129.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/01/2024 21:52:12.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo G0mtAiAq7a400005.SFP é:

40157bb7-653b-4d5f-885b-3005d707c181

Transmissor: WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUCOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 12/2023

NRA: G0mtAiAq7a400005

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

MEDIÇÃO: 34º (TRIGÉSIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS



INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS


FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Município de Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.247.003-49

RELATÓRIO FOTOGRAFICO EXECUÇÃO DA OBRERA PROINFANCIA TIPO
 TIPO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE UNILAIT FACE
 PRONTO ORIENTAÇÃO DA FUNDACAO DE PROTECAO E PROMOCAO DA
 INFANCIA TIPO B, NO BARRO JOAO PAULO II, EM ABRIL DE 2011, NA LOCALIDADE DE
 UNILAIT-PI

COORDENADOR GERAL
 DE PROJETO DE OBRAS DE PROTECAO E PROMOCAO DA
 INFANCIA TIPO B
 NOME DO PROJETO: OBRAS DE PROTECAO E PROMOCAO DA
 INFANCIA TIPO B



ALINHAMENTO DA OBRERA TIPO B

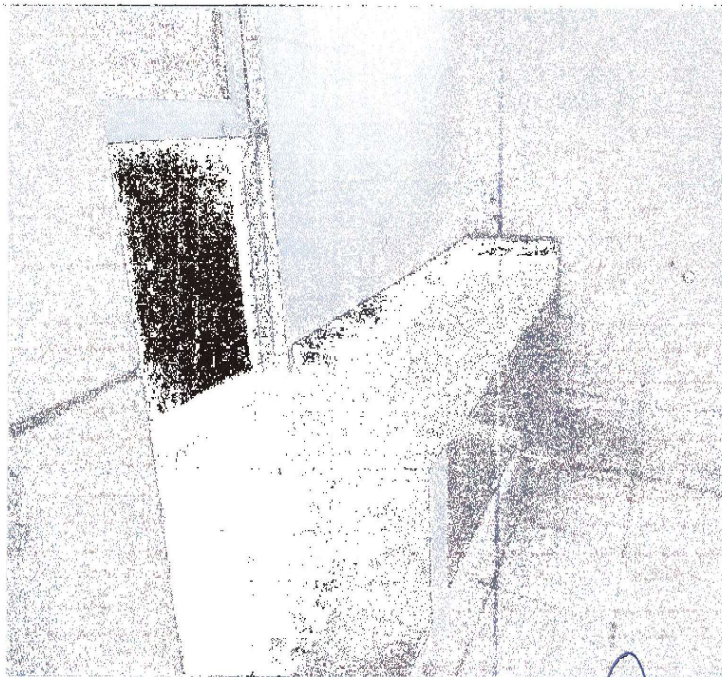

NO ALINHAMENTO DA OBRERA TIPO B


[Handwritten signature]
 ENG. CIVIL
 CREA: 14.3.344/2011-03

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO
 1 DO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-CE
 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE
 PROINFÂNCIA (L.P.A. S), NO BARRIO JOÃO PAULO II JUNTO A SUPERVIA DE ABRIL, Nº
 1902/2015-06
 03/01/2015 08:57 01/2015
 CONSTRUTORA W3M CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ Nº 02.034.000/0001-10
 BARRIO: CAMPOS DE ABRIL Nº 1902/2015-06
 ENDEREÇO: SUPERVIA DE ABRIL, BOLETA DE MEDIANAS



INSTALAÇÃO DE BANHEIROS E PRATENS



W3M CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua...
 JAGUAQUARA-CE
 CNPJ: 02.034.000/0001-10

INDICAÇÃO DE BANCADAS E PASTELERIAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015


CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.321/0001-13

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

MEDIÇÃO: 34º (TRIGÉSIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.




INSTALAÇÃO DE BANCADA E PRATELEIRAS

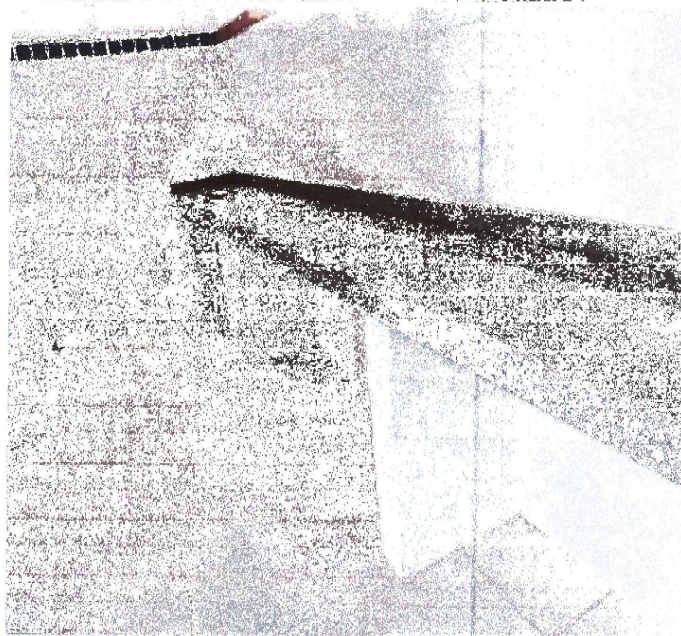


INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRATELEIRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBES - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 164 CRECHES PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBES - CE
CONTRATO: 03.03.01/2011
CONTRATADA: VAI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.994.894/0001-13
ENDEREÇO: BR/00000000/00000000
LIGACÃO: 849 (TRIP-LINHA QUALITY) BOLETIM DE MENÇÃO

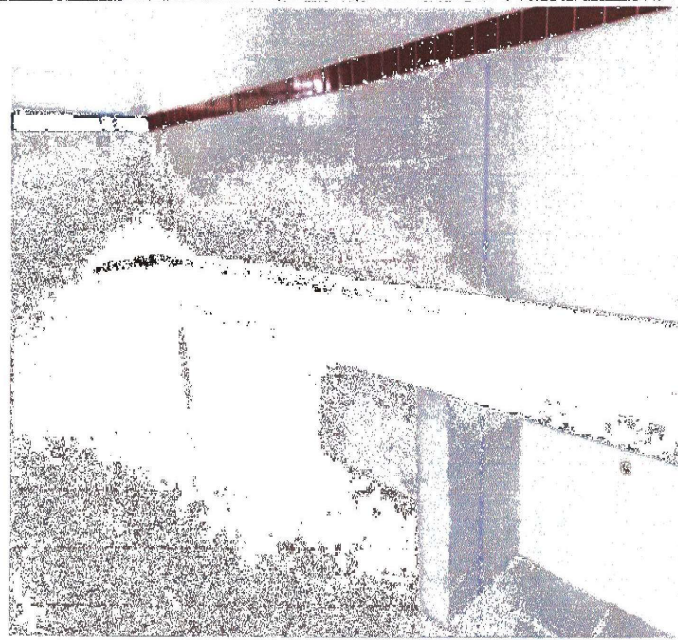

INSTALAÇÃO DE BANCADEAS E PRATELEIRAS

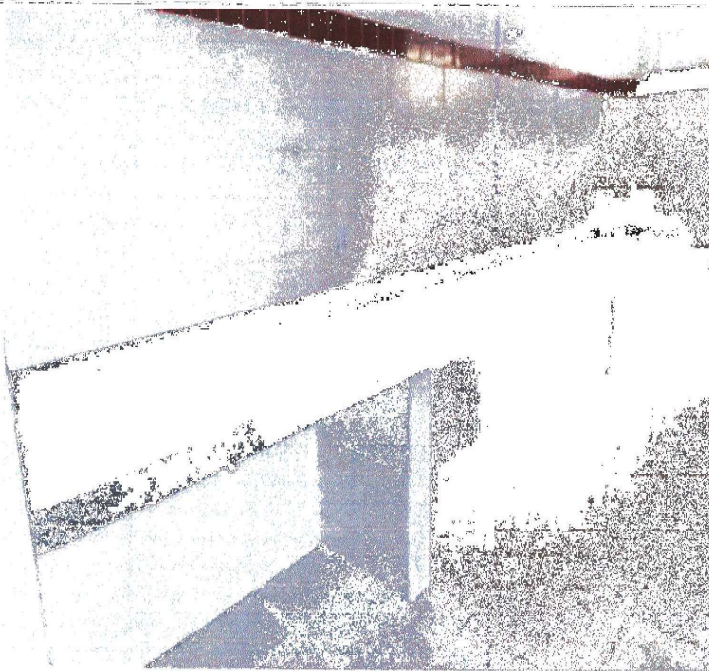

INSTALAÇÃO DE BANCADEAS E PRATELEIRAS

FCCE/050
Secretaria Municipal de Educação
Bairro João Paulo II, 10000-000
Jaguaribes - CE
CNPJ: 02.994.894/0001-13

Raimundo Figueiredo
Eng. Civil - CREA-CE - 5198
VIA Santa Helena 1016

24

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015


CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

MEDIÇÃO: 34º (TRIGÉSIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

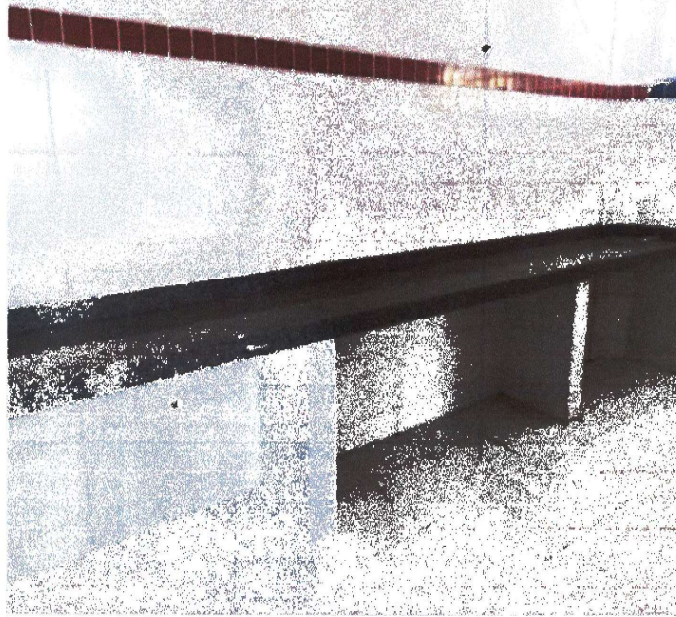

INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS

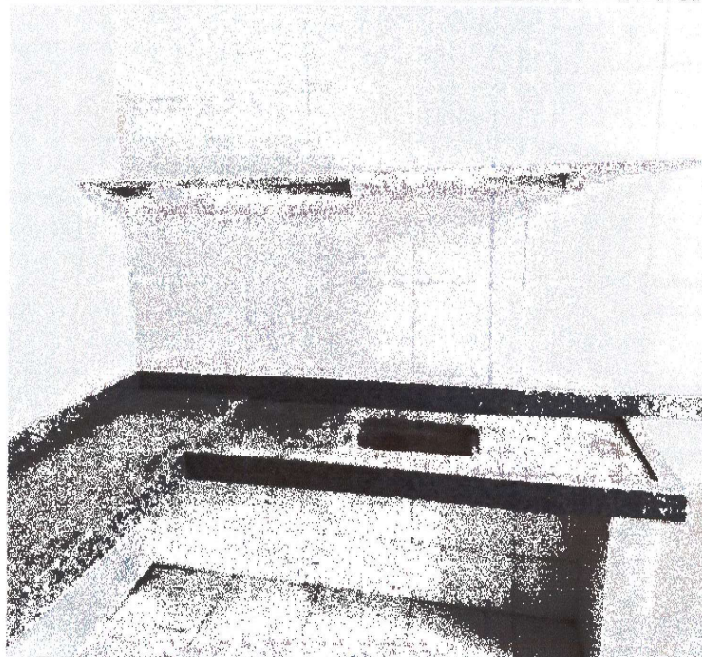

INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS

[Handwritten signature]
WM CONSTRUÇÕES LTDA
RUA JOÃO PAULO II, 100
JAGUARIBE - CE

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

MEDIÇÃO: 34º (TRIGÉSIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS



INSTALAÇÃO DE TELA MOEDA

FCR: 60788/2023 - R. PINHEIRO FIGUEREDO
Secretaria Municipal de Educação
Município de Jaguaribe - CE
FONE: 3342.1400 / 3342.1401
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil - CREA-CE 48758
WM Construções Ltda

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

MEDIÇÃO: 34º (TRIGÉSIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Rafael Pinheiro Figueredo
Rafael Pinheiro Figueredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

[Handwritten signature]
FCO. ELIETE CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Município de Jaguaribe/CE
Inscrição Nº 259/2021
CPF: 742.347.003-49

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior**
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rafael Pinheiro Figueredo
Engº Civil - CREA-CE 48758
WM Construções Ltda






TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 34ª MEDIÇÃO




OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II		CÓDIGO DA OBRA:	
DATA DA VISITA: 22/01/24	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR		
Nº DO CONTRATO: 06.08.01/2015	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE	INÍCIO DA OBRA: 01/04/2016	PREVISÃO DE TÉRMINO: 15/02/2024	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SUPERESTRUTURA	100,00%		
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00%		
ESQUADRAS	97,32%	PREVISTO:	
SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	94,32%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	100,00%		
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	92,12%		
PINTURA	96,45%		
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	98,91%		
DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	92,66%		
INSTALAÇÃO SANITARIA	87,95%		
LOUÇAS E METAIS	73,10%		
INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	59,54%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	93,21%		
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V	70,26%		
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	99,43%		
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	94,28%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	85,23%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 22 de Janeiro de 2024.			







Rafael Pinheiro Figueredo
RÁFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0







Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9















DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 01 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 02 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	



DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 03 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 04 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 05 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 06 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 07 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 08 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 09 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 10 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 12 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 16 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 17 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 18 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 19 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 20 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 21 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 23 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 24 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 25 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
FERIADO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 26 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 27 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE BANCADAS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 28 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE CHAPA PERFURADA TIPO MOEDA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE CHAPAS POR CONTA DE EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 29 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE CHAPA PERFURADA TIPO MOEDA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE MONTAGEM DE CHAPAS POR CONTA DE EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 30 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 31 de Dezembro de 2023		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
