

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 27.03.0122

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
13.03.0013	13/03/2024	27/03/2024	93.229,48

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.127,62
1000.60.00.0.	ISS	2.796,88
1000.70.00.0.	IRRF	1.398,44

Total da Retenção: (R\$) 9.322,94

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 19.704-1 ( CRECHE PROINF PAC I )	OUTROS	5521990000	83.906,54

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 27.03.0122  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N E (RS)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
13030013	13/03/2024	GLOBAL	93.229,48	06.08.01/2015	060801/2015	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO.

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
27030122	93.229,48	93.229,48	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
27/03/2024	93.229,48	9.322,94	83.906,54

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.127,62
1000.60.00.0.	ISS	2.796,88
1000.70.00.0.	IRRF	1.398,44
Total da Retenção: (R\$)		9.322,94

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B B 19.704-1 ( CRECHE PROINF PAC I )	OUTROS	5521990000	83.906,54

Jaguaribe, 27 de Março de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A):

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:40  
219902199 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JAGUARIBE-PAC I  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.704-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.917.000.113.231
VALOR TOTAL	83.906,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8  
NR. DOCUMENTO 552.199.000.019.704

=====

NR. AUTENTICACAO	E.904.7C6.CDE.478.7F1
------------------	-----------------------



G334271503655393019  
27/03/2024 15:08:40

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome PM JAGUARIBE-PAC I  
Agência 2199-7  
Conta corrente 19704-1

Creditado

Nome WM CONST RES N S ESPECTAC  
Agência 2917-3  
Conta corrente 113231-8  
Valor 83.906,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	27/03/2024 11:48:44
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	27/03/2024 15:08:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



G3362711429583311  
27/03/2024 11:48:47

## Entre contas correntes

### Debitado

---

Nome	PM JAGUARIBE-PAC I
Agência	2199-7
Conta corrente	19704-1

### Creditado

---

Nome	WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência	2917-3
Conta corrente	113231-8
Valor	83.906,54
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **317407064**.

---

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002331**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
13/03/2024	13.03.0013	93.229,48	0,00	GLOBAL

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
**PROJETO:** 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

**NOME:** W M CONSTRUCOES LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
**C N P J:** 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b> 26/03/2024	<b>VALOR LIQUIDADO: (R\$)</b> 93.229,48	<b>VALOR DO DESCONTO: (R\$)</b> 0,00	<b>TIPO DA LIQUIDAÇÃO:</b> COM NOTA FISCAL
<b>TIPO DA NOTA FISCAL:</b> SERVIÇO	<b>SUB TIPO DA NOTA FISCAL:</b> ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	<b>Nº DA NOTA FISCAL:</b> 907	<b>Nº DOS FORMULÁRIOS:</b> 0
<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA:</b> 26/03/2024	<b>DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:</b> 26/03/2024	<b>SÉRIE DA NOTA:</b> 1	<b>SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:</b> INTERNETCE
<b>Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:</b>	<b>SÉRIE DO SELO:</b> 0	<b>Nº DO SELO FISCAL:</b>	<b>OBS:</b>
<b>CHAVE DE ACESSO:</b> 0	<b>CHAVE DE VERIFICAÇÃO:</b> 252280433		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ITENS DA LIQUIDAÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	93.229,480	93.229,48	0

Jaguaribe, 26 de Março de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO - Nº 13.03.0013

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
13/03/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 06.08.01/2015	060801/2015	18782024
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
PROJETO: 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
132	437.056,28	93.229,48	343.826,80

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRR	UND	1	93.229,48	93.229,48
Total dos Itens: (R\$)					93.229,48

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **13030013**. A(os) **13 de Março de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 18782024

**Nota de Solicitação de Liquidação****Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 132**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil**Proj\Atividade:** 1007 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015**Nº Empenho:** 13030013 - Global**Nº Nota Fiscal:** 907**Dt Emissão NF:** 26/03/2024**Dt. Solicitação** 26/03/2024  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 16/01/2024 A 31/01/2024**Vir. Liquidação:** R\$ 93.229,48 (NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 512355060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	0	1,00	93.229,48	93.229,48

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 18782024**Data:** 13/03/2024**Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 132**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil**Proj\Atividade:** 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 93.229,48**Histórico**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	1,00	93.229,48	93.229,48

Ordenador



Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

 <b>Fortaleza</b> PREFEITURA Finanças		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da <b>NFS-e</b> 907				
Data e Hora da Emissão		26/03/2024 11:05:12	Competência	03/2024	Código de Verificação	252280433			
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		JAGUARIBE - CE			
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Razão Social/Nome		WM CONSTRUÇOES LTDA							
Nome Fantasia		WM CONSTRUÇOES							
CPF/CNPJ		02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I.784 - CAJAZEIRAS CEP.60.864-205							
Complemento		SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.com.br			
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE							
CPF/CNPJ		07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE			
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000							
Complemento			Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
REF: AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA (TIPO 1) NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE - CEI 51.235.55060/74. VALOR DA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 93.229,48 VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 93.229,48 BASE DE CÁLCULO DO ISS - 5% DE 60% DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL BASE DE CÁLCULO DO ISS (I) (60%): R\$ 55.937,69 VALOR DO ISS (5% DE I): R\$ 2.796,88 VALOR DO INSS (11% SOB 50% DA MÃO DE OBRA): R\$ 5.127,62 VALOR DO IPI (1,5%): R\$ 1.398,44 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2917-3 CONTA CORRENTE: 113231-8 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇÕES LTDA									
 Atento o Tomador dos Serviços Data: 26/03/24									
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>									
F 02 - 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS									
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
Código da Obra				Código ART	CE20160014859				
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS		COFINS		IR(R\$)	1.398,44	INSS(R\$)	5.127,62	CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>					
Valor dos Serviços R\$		93.229,48	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		93.229,48			
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		37.291,80			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		6.526,06	9 Nenhum	Base de Cálculo		55.937,68			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		2.796,88	2 - Não	ISS a reter		X: Sim ( ) Não			
(-) Valor Líquido R\$		83.906,54	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$		0,00			
			2 - Não						
Avisos		- Uma via desta Nota Fiscal, será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação - Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geografia e demais áreas abrangidas pelos profissionais do Sistema Crea/Crea-Devi, deverão obrigatoriamente ter a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3493.5800 (CREA-CE).							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO

N.º PAR 11681/2014

CEDEnte FNDE

  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 JAGUARIBE - CE



RECIBO

R\$ 93.229,48

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

A importância de **NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.**

Referente ao **PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 907**

**Descrição do serviço**

Descrição: Valor Bruto: R\$ 93.229,48

Valor IR 1,5%: R\$ 1.398,44

Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 2.796,88

Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 5.127,62

VALOR LÍQUIDO DA NF: R\$ 83.906,54

CEI: 51.235.55060/74

CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE

CONTRATO: 06.08.01/2015

*Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.*

Fortaleza-CE 27 de março de 2024.

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 2917-3

C/C: 113231-8

WM  
CONSTRUCO  
S LTDA:  
023643810001  
13

Assinado digitalmente por WM  
CONSTRUCOES LTDA:02364381000113  
DN: CN=WM, S=CE, L=FORTALEZA,  
O=CP-Brasil, OU=videoconferencia,  
OU=4466442000150, OU=Pessoa Juridica  
A1, OU=ARGROWTECH, OU=Autentada  
Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=WM  
CONSTRUCOES LTDA:02364381000113  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
8001  
Data: 2024.04.11 14:40:48  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002331

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
13/03/2024	13.03.0013	93.229,48	0,00	GLOBAL

FUNÇÃO, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
26/03/2024	93.229,48	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>907</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS <b>0</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>26/03/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>26/03/2024</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>252280433</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	93.229,480	93.229,48	0

Jaguaribe, 26 de Março de 2024

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2024.03.27 14:05:54  
03'00'

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 13.03.0013

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
13/03/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 06.08.01/2015	060801/2015	18782024
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
PROJETO: 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTACÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
132	437.056,28	93.229,48	343.826,80

DADOS DO CREDOR

NOME: WM CONSTRUÇÕES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE  
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC. MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA ( TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 512355060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRR	UND	1	93.229,48	93.229,48

Total dos Itens: (R\$) 93.229,48

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **13030013**. A(os) **13 de Março de 2024**



Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2024.03.27 14:06:04  
-03'00'


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)




## ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 06.08.01/2015	Modalidade da Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Nº da Licitação 06.08.01/2015	Data do Contrato 02 de Dezembro de 2015
Contratado(a) WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Endereço Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza - CE.	
Nº do CNPJ / CPF. 02.364.381/0001-13	Nº do Telefone/Fax (85) 3099.8250 / (85) 3295.0550
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.	
Valor Global RS 1.811.834,40 (um milhão oitocentos e onze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 240 (duzentos e quarenta) dias

Jaguaribe-CE, 02 de Dezembro de 2015.

  
Maria Aparecida Lima de Assis  
Secretária de Educação  
CONTRATANTE

  
Lisandra Dellga Araújo Peixoto Machado  
WM CONSTRUÇÕES LTDA  
CONTRATADA

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015**

**DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.08.01/2015 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DO OUTRO LADO A EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Cajazeiras, Fortaleza -CE, inscrito no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, representada por **José Márcio Pinheiro Landim**, doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com o Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 06.08.01/2015** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 O aditivo do contrato em questão encontra amparo nos artigos Arts. 40, XI; 57, inciso II, § 1º e 65, II, alínea D, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual **RS 77.128,02 (Setenta e sete mil, Cento e vinte e oito reais e Dois centavos)** gerando uma repercussão percentual na ordem de **12,91% (doze inteiros e noventa e um centésimos por cento)**, no valor do contrato.


Tal alteração contratual modificou o valor global anteriormente pactuado, saindo de **RS 2.955.759,74 (Dois milhões, Novecentos e cinquenta e cinco mil, Setecentos e cinquenta e nove reais e Setenta e quatro centavos)** global, para **RS 3.032.887,76 (Três milhões, Trinta e dois mil, Oitocentos e oitenta e sete reais e Setenta e seis centavos)**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

3.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, terá vigência de **15 de agosto de 2023 à 15 de fevereiro de 2024**.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS JUSTIFICATIVAS**

4.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio,



qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

4.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

4.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

4.4 - Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, de sorte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o aumento de valor do contrato na ordem de **12,91% (doze inteiros e noventa e um centésimos por cento)**, baseando-se nas inflações e deflações do índice INCC no período entre Outubro de 2021 à Junho de 2023.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe - CE, 04 de Julho de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:743347003  
49

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2023.07.04 17:24:49  
-03'00'

**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E**  
**CULTURA**

*José Márcio Pinheiro Landim*  
**José Márcio Pinheiro Landim**  
**WM CONSTRUÇÕES LTDA**

#### Testemunhas:

01. *Carlos Bezerra da Silva*  
Nome: CARLOS BEZERRA DA SILVA  
CPF/MF: 034.600.903-21

02. *Felipe Barbosa Silva*  
Nome: FELIPE BARBOSA SILVA  
CPF/MF: 039.592.393.00



Contribuinte: WM CONSTRUCOES LTDA

**Matrícula CEI**

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.235.55060/74

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	<input type="text" value="WM CONSTRUCOES LTDA"/>
Endereço	
Logradouro (Av, Rua, etc) *	<input type="text" value="CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1"/>
Bairro	<input type="text" value="JOAO PAULO II"/>
CEP *	<input type="text" value="83475000"/>
Telefone	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>
Fax	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av, Rua, etc)	<input type="text" value="RUA CENTRAL 784 SALAS 04 E 05"/>
Bairro	<input type="text" value="CAJAZEIRAS"/>
CEP	<input type="text" value="80884205"/>
Vínculo do Responsável *	<input type="text" value="Construtora"/>
Vínculo com o Governo *	<input type="text" value="Outros"/>
FPAS *	<input type="text" value="507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL"/>
CNAE *	<input type="text" value="45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)"/>
Natureza Jurídica *	<input type="text" value="2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA"/>
Dados da Obra	
A.R.T./C.R.E.A.	<input type="text" value="000000000"/>
Local	<input type="text"/>
Alvará	<input type="text"/>
Data do Início da Obra *	<input type="text" value="02/12/2015"/> (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/>
Tipo da Obra	<input type="text"/>
Uso da Obra	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Demolição	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/>
Tipo da Demolição	<input type="text"/>
Uso da Demolição	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>

**Comercial**

Área Existente  m<sup>2</sup>  
Área da Reforma  m<sup>2</sup>  
Área da Demolição  m<sup>2</sup>  
Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>  
Área Resultante  m<sup>2</sup>

**Residencial**

Área Existente  m<sup>2</sup>  
Área da Reforma  m<sup>2</sup>  
Área da Demolição  m<sup>2</sup>  
Área do Acréscimo ou Obra Nova  m<sup>2</sup>  
Área Resultante  m<sup>2</sup>

Salvar Matrícula CEI

Voltar



## FATURA 36ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II  
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Fortaleza, 13 de MARÇO de 2024

Valor da medição .....	100,00%	93.229,48
Valor dos serviços de construção civil .....	100,00%	93.229,48
Base de cálculo do ISS .....	60,00%	55.937,69
Retenção do ISS .....	5,00%	2.796,88
IR (Sobre o Total) .....	1,50%	1.398,44
INSS (11% Sobre 50% do total) .....	5,50%	5.127,62
<b>Total a Reter de Impostos</b>		<b>9.322,94</b>
<b>Valor Líquido a Receber</b>		<b>83.906,54</b>

PIS 0,65% R\$ 605,99



COFINS 3,00% R\$ 2.796,88

CSLL 1,08% R\$ 1.006,88



**SALDO LÍQUIDO 79.496,79**

**W.M CONSTRUÇÕES LTDA.**

  
**José Márcio Pinheiro Landim**  
Sócio-Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO							VALORES (R\$)				
EMPRESA EXECUTORA:  WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº. 36		CONTRATO:		1.811.634,40					
		PAR 11681/2014/FINDE		DATA:		REALISTE / REEQUILIBRIO		819.365,98					
CNPJ: 02.364.381/0001-13  OBRA: CRECHE PRONÍNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		PERÍODO:		quarta-feira, 13 de março de 2024		REALISTE		77.128,02		VALOR DA MEDIÇÃO: 93.229,48			
		16/02/2024 A 31/01/2024		MEDIÇÃO ACUMULADO		TOTAL:		3.032.887,76					
		PERÍODO:				MEDIÇÃO ACUMULADO		2.995.353,58					
		PERÍODO:				SALDO:		37.534,18					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>43.830,54</b>						<b>0,00</b>	<b>43.830,54</b>	<b>43.830,54</b>
1.1	74209.001 Praça de Obra - Padrão Governo Federal	m²	6,00	318,39	1.910,34		6,00	6,00	-	100,00%	-	1.910,34	1.910,34
1.2	C2451 Instalação Provisória de Água	und	1,00	1.079,96	1.079,96		1,00	1,00	-	100,00%	-	1.079,96	1.079,96
1.3	73966.001 Instalação Provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00	1.468,89	1.468,89		1,00	1,00	-	100,00%	-	1.468,89	1.468,89
1.4	C2449 Instalação Provisória de esgoto	und	1,00	253,38	253,38		1,00	1,00	-	100,00%	-	253,38	253,38
1.5	73805.001 Barracos Provisórios (deposto escritório vestiário refeitório) com piso drenado	m²	40,00	364,46	14.578,40		40,00	40,00	-	100,00%	-	14.578,40	14.578,40
1.6	74077.002 Locação de Obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	11,18	16.884,37		1.510,23	1.510,23	-	100,00%	-	16.884,37	16.884,37
1.7	C2200 Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00	62,20	3.483,20		56,00	56,00	-	100,00%	-	3.483,20	3.483,20
1.8	74231.001 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	57,15	4.572,00		80,00	80,00	-	100,00%	-	4.572,00	4.572,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACIONES</b>				<b>26.472,83</b>						<b>0,00</b>	<b>26.472,83</b>	<b>26.472,83</b>
2.1	Atorno aplicados em camadas de 0,20m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	2.136,43	6,38	13.630,42		2.136,43	2.136,43	-	100,00%	-	13.630,42	13.630,42
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	370,09	25,35	9.381,78		370,09	370,09	-	100,00%	-	9.381,78	9.381,78
2.3	Regularização e Compactação do fundo de valas	m²	208,17	11,69	2.433,51		208,17	208,17	-	100,00%	-	2.433,51	2.433,51
2.4	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	327,55	1,60	524,08		327,55	327,55	-	100,00%	-	524,08	524,08
	<b>MURETA</b>												
2.5	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	11,26	25,35	285,44		11,26	11,26	-	100,00%	-	285,44	285,44
2.6	Regularização e Compactação do fundo de valas	m²	17,74	11,69	207,38		17,74	17,74	-	100,00%	-	207,38	207,38
2.7	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	6,39	1,60	10,22		6,39	6,39	-	100,00%	-	10,22	10,22
<b>3</b>	<b>FUNDACIONES</b>				<b>132.791,94</b>						<b>0,00</b>	<b>132.791,94</b>	<b>132.791,94</b>
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - SAPATAS</b>												
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico	m²	208,17	17,84	3.713,75		208,17	208,17	-	100,00%	-	3.713,75	3.713,75
3.2	Forma de madeira comum para fundações	m²	410,35	32,20	13.213,27		410,35	410,35	-	100,00%	-	13.213,27	13.213,27
3.3	Armação aço CA-50 Diam. 5,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fomecimento/corte/perda 10%/ dobra/cobocação	kg	1.432,20	8,24	11.801,33		1.432,20	1.432,20	-	100,00%	-	11.801,33	11.801,33
3.4	Armação aço CA-50 Diam. 3,4 à 6,0 Fomecimento/corte/perda 10%/ dobra/cobocação	kg	166,80	8,10	1.351,08		166,80	166,80	-	100,00%	-	1.351,08	1.351,08
3.5	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	42,54	439,76	18.707,39		42,54	42,54	-	100,00%	-	18.707,39	18.707,39
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - VIGAS BALDRAMES</b>												
3.6	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico (largura (0,30m) x comprimento das vigas do nível 0,00 (674,26m))	m²	202,28	17,84	3.608,68		202,28	202,28	-	100,00%	-	3.608,68	3.608,68
3.7	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10x	m²	539,42	32,20	17.369,32		539,42	539,42	-	100,00%	-	17.369,32	17.369,32
3.8	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fomecimento/corte/perda 10%/ dobra/cobocação	kg	1.373,30	8,24	11.315,99		1.373,30	1.373,30	-	100,00%	-	11.315,99	11.315,99
3.9	Armação de aço CA-50 Diam 3,4 à 5,0mm-fomecimento/corte/perda 10%/ dobra/cobocação	kg	619,40	8,10	5.017,14		619,40	619,40	-	100,00%	-	5.017,14	5.017,14
3.10	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	40,93	439,76	17.999,38		40,93	40,93	-	100,00%	-	17.999,38	17.999,38
	<b>MURETAS - BLOCOS</b>												
3.11	Estaca à trado (branca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7m	m	52,50	48,33	2.537,33		52,50	52,50	-	100,00%	-	2.537,33	2.537,33
3.12	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico	m²	27,97	17,84	498,98		27,97	27,97	-	100,00%	-	498,98	498,98
3.13	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 6x	m²	21,39	42,39	906,72		21,39	21,39	-	100,00%	-	906,72	906,72
3.14	Armação de aço CA-50, Diam 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2)-fomecimento/corte/perda 10%/ dobra/cobocação	kg	34,36	8,24	283,13		34,36	34,36	-	100,00%	-	283,13	283,13
3.15													
3.16	Armação de aço CA-50, Diam 3,4 à 6,0mm (1/2)-fomecimento/corte/perda 10%/ dobra/cobocação	kg	37,91	8,10	307,07		37,91	37,91	-	100,00%	-	307,07	307,07
3.17	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38	439,76	1.046,63		2,38	2,38	-	100,00%	-	1.046,63	1.046,63
	<b>MURETAS - VIGAS BALDRAME</b>												
3.18	Forma madeira comum para fundações - reaproveitamento 10x	m²	28,49	32,20	917,38		28,49	28,49	-	100,00%	-	917,38	917,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº. 36		CONTRATO:		1.811.634,40		W A W		W A W				
						ADITIVO:		324.759,36								
WV CONSTRUÇÕES LTDA		PAR 11661/2014/FNDE		DATA:		REALISTE /REQUILIBRIO		819.365,98		W A W		W A W				
						REALISTE		77.128,02								
CNPJ: 02.364.382/0001-13		OBRA: CRECHE PROFNÁNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		PERÍODO:		TOTAL:		3.032.887,76		W A W		W A W				
						MEDIÇÃO ACUMULADO:		2.995.353,58								
				16/01/2024 A 31/01/2024		SALDO:		37.534,18								
											VALOR DA MEDIÇÃO:			93.229,48		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)						
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
1.19	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda 10% dobra/colocação	kg	62,91	8,24	518,38		62,91	62,91	-	100,00%		518,38	518,38			
1.20	Armação de aço CA-60 Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda 10% dobra/colocação	kg	26,82	8,10	217,24		26,82	26,82	-	100,00%		217,24	217,24			
1.21	Concreto para fundação fôr=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	1,52	439,76	668,44		1,52	1,52	-	100,00%		668,44	668,44			
<b>FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTORNO (ARQUIMO)</b>																
1.22	Alvenaria de pedra argamassa (traço 1:3) chapisco adquirido	m³	51,99	357,69	18.596,30		51,99	51,99	-	100,00%		18.596,30	18.596,30			
1.23	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado com argamassa de cimento e areia 1:1,4 (V = 60,00m + 60,00m + 40,0m - 14,00m (56,00 pilares de 0,25m) x 0,20m x 0,20m)	m³	5,84	376,20	2.197,01		5,84	5,84	-	100,00%		2.197,01	2.197,01			
				<b>133.357,43</b>							<b>0,00</b>	<b>133.357,43</b>	<b>133.357,43</b>			
<b>SUPERESTRUTURA</b>																
<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>																
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastica - pilares	m²	579,60	31,30	18.141,48		579,60	579,60	-	100,00%		18.141,48	18.141,48			
4.2	Armação aço CA-50, Diam 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2)-fomecimento/corte perda de 10% dobra/colocação	kg	2.240,56	8,24	18.538,13		2.240,56	2.240,56	-	100,00%		18.538,13	18.538,13			
4.3	Armação aço CA-60, Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra/colocação	kg	820,34	8,10	6.644,75		820,34	820,34	-	100,00%		6.644,75	6.644,75			
4.4	Concreto bombeado fôr=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	32,60	439,76	14.336,18		32,60	32,60	-	100,00%		14.336,18	14.336,18			
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>																
4.5	Forma madeira comp. Plástica 12mm p/ estrutura corte/ montagem/ escoramento/ desforma - vias	m²	842,44	31,30	26.368,37		842,44	842,44	-	100,00%		26.368,37	26.368,37			
4.6	Armação aço CA-50 Diam, 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda de 10% dobra/colocação	kg	1.580,70	8,24	13.033,21		1.580,70	1.580,70	-	100,00%		13.033,21	13.033,21			
4.7	Armação aço CA-60 Diam, 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra/colocação	kg	830,22	8,10	6.724,78		830,22	830,22	-	100,00%		6.724,78	6.724,78			
4.8	Concreto bombeado fôr=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	52,71	439,76	23.179,75		52,71	52,71	-	100,00%		23.179,75	23.179,75			
<b>CONCRETO ARMADO PARA VEGAS</b>																
4.9	Verga e contra vergas pré-moldadas em concreto armado fôr 15mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	18,85	4.940,59		262,10	262,10	-	100,00%		4.940,59	4.940,59			
<b>CONCRETO ARMADO - MURETAS - PILARES</b>																
4.10	Forma madeira comp. Plástica 12mm p/ estrutura corte/ montagem/ escoramento/ desforma - vias	m²	17,29	31,30	541,18		17,29	17,29	-	100,00%		541,18	541,18			
4.11	Armação aço CA-50 Diam, 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda de 10% dobra/colocação	kg	48,82	8,24	402,28		48,82	48,82	-	100,00%		402,28	402,28			
4.12	Armação aço CA-60, Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra/colocação	kg	20,36	8,10	164,92		20,36	20,36	-	100,00%		164,92	164,92			
4.13	Concreto bombeado fôr=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	439,76	351,81		0,80	0,80	-	100,00%		351,81	351,81			
				<b>143.652,47</b>							<b>0,00</b>	<b>143.652,47</b>	<b>143.652,47</b>			
<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARQUES)</b>																
<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>																
5.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) - (48x16x10cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento areia)	m²	6,10	139,65	851,87		6,10	6,10	-	100,00%		851,87	851,87			
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>																
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	1.323,07	50,98	67.450,11		1.323,07	1.323,07	-	100,00%		67.450,11	67.450,11			
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	-	63,74	0,00		-	-	-	100,00%		-	-			
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tijolo cerâmico de 06 furos (dimensões nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	759,16	74,06	56.223,39		759,16	759,16	-	100,00%		56.223,39	56.223,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO								VALORES (R\$)			
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº. 36		CONTRATO		1.811.634,40					
						ADITIVO		324.759,36					
CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE		DATA:		REALISTE /REQUILIBRO		819.365,98					
						REALISTE		77.128,02					
OBRA: CRECHE-PROVINCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.		PERÍODO:		quarta-feira, 13 de março de 2024		TOTAL:		3.032.887,76					
						MEDIÇÃO ACUMULADA		2.995.353,58					
		16/01/2024 A 31/01/2024				SALDO		37.534,18					
						VALOR DA MEDIÇÃO:		93.229,48					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (iso, 20cm) assentamento com argamassa traço 1 (cimento e areia)	m²	-	13,74	0,00	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
5.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	804,39	18.203,35	-	22,63	22,63	-	100,00%	-	18.203,35	18.203,35
5.7	ALVENARIA DA MURETA Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tipo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais:19x19x9) assentamento em argamassa no traço 1:2:5(cimento, cal e areia)	m²	18,17	50,98	923,76	-	18,17	18,17	-	100,00%	-	923,76	923,76
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>366.283,67</b>						<b>6.436,50</b>	<b>356.456,49</b>	<b>364.892,98</b>
6.1	Porta de madeira - Pm1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	10,00	1.081,99	10.819,90	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	10.819,90	10.819,90
6.2	Porta de madeira - Pm2 - 60x210, com venezianas, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	5,00	1.311,88	6.559,40	-	5,00	5,00	-	100,00%	-	6.559,40	6.559,40
6.3	Porta de madeira - Pm3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	4,00	1.197,11	4.788,44	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	4.788,44	4.788,44
6.4	Porta de madeira - Pm4 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	6,00	1.197,11	7.182,66	-	6,00	6,00	-	100,00%	-	7.182,66	7.182,66
6.5	Porta de madeira - Pm5 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	10,00	1.197,11	11.971,10	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	11.971,10	11.971,10
6.6	Porta de composto de madeira - Pm6 - 80x210, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadras	und	16,00	214,64	3.434,24	-	16,00	16,00	-	100,00%	-	3.434,24	3.434,24
6.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8x51mm para as portas - fôrmeamento e instalação	m²	11,20	50,98	570,98	-	11,20	11,20	-	100,00%	-	570,98	570,98
6.8	FERRAGENS E ACESSÓRIOS Fechadura de embutir completa para portas internas	und	51,00	171,29	8.735,79	-	51,00	51,00	-	100,00%	-	8.735,79	8.735,79
6.9	PORTAS EM ALUMÍNIO Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, inclusive ferragens	m²	2,10	937,64	1.969,04	-	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.969,04	1.969,04
6.10	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, inclusive ferragens	m²	1,68	937,64	1.575,24	-	1,68	1,68	-	100,00%	-	1.575,24	1.575,24
6.11	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, inclusive ferragens	m²	6,72	937,64	6.300,94	-	6,72	6,72	-	100,00%	-	6.300,94	6.300,94
6.12	Porta de Correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	113,40	937,64	106.328,38	-	113,40	113,40	-	100,00%	-	106.328,38	106.328,38
6.13	Porta de Correr - PA5 - 240x210 com vidro conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	5,04	719,19	3.624,72	-	5,04	5,04	-	100,00%	-	3.624,72	3.624,72
6.14	Porta de Abir - PA6 - 170x185 veneziana conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	4,44	1.058,69	4.700,58	-	4,44	4,44	-	100,00%	-	4.700,58	4.700,58
6.15	Porta de Abir - PA7 - 160x20210 veneziana conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	5,25	1.058,69	5.558,12	-	5,25	5,25	-	100,00%	-	5.558,12	5.558,12
6.16	PORTAS DE VIDRO - PV Porta de vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens conforme projeto de esquadras	und	1,00	3.155,50	3.155,50	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	3.155,50	3.155,50
6.17	Porta de vidro temperado - PV2 - 110x230, com ferragens conforme projeto de esquadras	und	1,00	3.155,50	3.155,50	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	3.155,50	3.155,50
6.18	Bandeiras fixas de vidro para porta pv2, conforme projeto 175x235	m²	0,61	536,43	327,22	-	0,61	0,61	-	100,00%	-	327,22	327,22
6.19	JANELA DE ALUMÍNIO - JA Janela de alumínio - JA -01, 70x125, completa conforme projeto de esquadras - alumínio	m²	1,75	671,45	1.175,04	-	1,75	1,75	-	100,00%	-	1.175,04	1.175,04
6.20	Janela de alumínio - JA -02, 110x145, completa conforme projeto de esquadras - alumínio	m²	1,60	671,45	1.074,32	-	1,60	1,60	-	100,00%	-	1.074,32	1.074,32
6.21	Vidro fixo - JA -03, 140x115, completa conforme projeto de esquadras	m²	3,22	589,48	1.898,13	-	3,22	3,22	-	100,00%	-	1.898,13	1.898,13
6.22	Janela de alumim - JA -04, 140x145, completa conforme projeto de esquadras	m²	2,03	671,45	1.363,04	-	2,03	2,03	-	100,00%	-	1.363,04	1.363,04
6.23	Janela de alumim - JA -05, 200x105, completa conforme projeto de esquadras	m²	2,10	589,48	1.237,91	-	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.237,91	1.237,91
6.24	Janela de alumínio - JA -06, 210x50, completa conforme projeto de esquadras - alumínio - ar - incluso vidro fixo incolor, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99	-	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.505,99	1.505,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO							VALORES (R\$)				
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº. 36			CONTRATO: 1.811.634,40						
							ADITIVO 324.759,36						
NM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE			DATA: 16/01/2024 a 31/01/2024						
							quarta-feira, 13 de março de 2024						
OBRA: CRECHE PROFINVÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.							REALISTE /RECEBUEIRO 819.365,98						
							REALISTE 77.128,02						
							TOTAL: 3.032.887,76						
							MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.995.353,58						
							SALDO: 37.534,18						
							VALOR DA MEDIÇÃO: 93.229,48						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.25	Janela de alumínio - já -07,210x75, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96		12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,96	9.035,96
6.26	Janela de alumínio - já -08,210x100, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98		6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98	4.517,98
6.27	Janela de alumínio - já -09,210x150, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	717,14	13.553,95		18,90	18,90	-	100,00%	-	13.553,95	13.553,95
6.28	Janela de alumínio - já -10,140x150, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99		2,10	2,10	-	100,00%	-	1.505,99	1.505,99
6.29	Janela de alumínio - já -11,140x75, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98		6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98	4.517,98
6.30	Janela de alumínio - já -12,420x50, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	717,14	6.023,98		8,40	8,40	-	100,00%	-	6.023,98	6.023,98
6.31	Janela de alumínio - já -13,420x150, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96		12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,96	9.035,96
6.32	Janela de alumínio - já -14,550x100, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	717,14	24.095,90		33,60	33,60	-	100,00%	-	24.095,90	24.095,90
6.33	Janela de alumínio - já -15,550x150, completa conforme projeto de esquadrias -madeira-ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	717,14	12.047,95		16,80	16,80	-	100,00%	-	12.047,95	12.047,95
6.34	Tela de nylon de proteção - fixado no esquadria	m²	20,25	67,70	1.370,93		-	-	20,25	0,00%	-	-	-
<b>VIDROS</b>													
6.35	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalação	m²	10,70	374,11	4.002,98		10,70	10,70	-	100,00%	-	4.002,98	4.002,98
6.36	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalação	m²	11,40	605,68	6.904,75		11,40	11,40	-	100,00%	-	6.904,75	6.904,75
6.37	Esofeto cristal, esp. 4mm com moldura de madeira	m²	21,28	622,13	13.238,93		21,28	21,28	-	100,00%	-	13.238,93	13.238,93
<b>ESQUADRIA - GRADIL METALICO</b>													
6.38	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	374,29	54.346,91	22,54	122,66	145,20	-	100,00%	8.436,50	45.910,41	54.346,91
6.39	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	226,04	3.051,54		13,50	13,50	-	100,00%	-	3.051,54	3.051,54
<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>													
7.1	Estrutura metálica	m²	1.410,46	80,01	112.850,90		1.410,46	1.410,46	-	100,00%	-	112.850,90	112.850,90
7.2	Tela sandwich metálica - preco lictado	m²	306,30	90,16	27.616,28		306,30	306,30	-	100,00%	-	27.616,01	27.616,01
7.3	Tela sandwich metálica - preco recoilibrado	m²	1.104,16	349,13	385.495,38		1.104,16	1.104,16	-	100,00%	-	385.495,38	385.495,38
7.4	Cunha em perfil ondulado de aço zincado	m	83,40	61,23	5.106,38		83,40	83,40	-	100,00%	-	5.106,38	5.106,38
7.5	Calha em chapa metálica 1922 desenvolvimento de 50cm	m	186,15	48,58	9.043,17		186,15	186,15	-	100,00%	-	9.043,17	9.043,17
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr,24, desenvolvimento 25 cm	m	258,90	36,16	9.361,82		258,90	258,90	-	100,00%	-	9.361,82	9.361,82
7.6	Pivadeira(chapim) em concreto	m	270,30	29,68	8.022,50		270,30	270,30	-	100,00%	-	8.022,50	8.022,50
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>													
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	8,15	5.767,51		707,67	707,67	-	100,00%	-	5.767,51	5.767,51
<b>REVESTIMENTO INTERIORS E EXTERIORS</b>													
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vãos e platibanda	m²	4.164,46	3,10	12.909,83		4.164,46	4.164,46	-	100,00%	-	12.909,83	12.909,83
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0cm	m²	1.023,95	24,05	24.626,00		1.023,95	1.023,95	-	100,00%	-	24.626,00	24.626,00
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5cm	m²	3.140,51	38,30	120.281,53		3.140,51	3.140,51	-	100,00%	-	120.281,53	120.281,53
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traço 1:4:5 0,5cm	m²	3.140,51	15,84	49.745,68		3.140,51	3.140,51	-	100,00%	-	49.745,68	49.745,68
9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 30x40 cm - ind - rejunte - conforme projeto - branca	m²	894,38	110,66	99.012,69		894,38	894,38	-	100,00%	-	99.012,69	99.012,69
9.6	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - ind - rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,02	87,03	785,01		9,02	9,02	-	100,00%	-	785,01	785,01
9.7	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - ind - rejunte - conforme projeto - verdeho	m²	7,49	87,03	651,85		7,49	7,49	-	100,00%	-	651,85	651,85
9.8	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - ind - rejunte - conforme projeto - branco	m²	22,01	87,03	1.915,53		22,01	22,01	-	100,00%	-	1.915,53	1.915,53
9.9	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - ind - rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	181,05	87,03	15.756,78		181,05	181,05	-	100,00%	-	15.756,78	15.756,78
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	242,50	34,25	8.305,63		242,50	242,50	-	100,00%	-	8.305,63	8.305,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 36	CONTRATO:	1.811.634,40	
	HM CONSTRUÇÕES LTDA		DATA:	ADITIVO:	324.759,36	
	CNPJ: 02.364.380/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	quarta-feira, 13 de março de 2014	REALISTE (RECEBULIBRO)	819.365,98	
OBRA: CRECHE-PROFINCIA TIPO I NO BARRIO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				REALISTE	77.128,02	
			PERÍODO:	TOTAL:	3.032.887,76	
			16/01/2014 A 31/01/2014	MEDIÇÃO ACUMULADA	2.995.353,58	
				SALDO	37.534,18	
				VALOR DA MEDIÇÃO:	93.229,48	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.11	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	83,09	41.381,31		498,03	498,03	-	100,00%	-	41.381,31	41.381,31
9.12	Forno mineral	m²	696,44	60,09	41.849,08		696,44	696,44	-	100,00%	-	41.849,08	41.849,08
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>275.807,72</b>						<b>11.199,93</b>	<b>262.935,74</b>	<b>274.135,67</b>
10.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.185,06	26,78	31.736,44		1.185,06	1.185,06	-	100,00%	-	31.736,44	31.736,44
10.2	Camada regularizada e=7,0cm - preço lictado	m²	607,22	22,34	14.955,69		607,22	607,22	-	100,00%	-	14.955,69	14.955,69
10.2	Camada regularizada e=7,0cm - preço realizado	m²	517,86	32,76	16.955,09		517,86	517,86	-	100,00%	-	16.955,09	16.955,09
10.3	Piso orientado desmemorado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	385,83	63,89	25.422,34		385,83	385,83	-	100,00%	-	25.422,34	25.422,34
10.4	Pinura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	62,06	1.472,06		-	-	23,72	0,00%	-	-	-
10.5	Piso ceramico antiderrapante PEV V - 40x40cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m²	214,48	105,65	22.639,81		214,48	214,48	-	100,00%	-	22.639,81	22.639,81
10.6	Piso ceramico antiderrapante PEV V - 50x50cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m²	345,77	105,50	36.478,74		345,77	345,77	-	100,00%	-	36.478,74	36.478,74
10.7	Piso vinilico em mancha e=2,0mm	m²	394,64	137,71	54.345,87		394,64	394,64	-	100,00%	-	54.345,87	54.345,87
10.8	Piso portati de alerta, bornache integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (finimento e assentamento)	m²	27,90	271,43	6.177,90	27,90	-	27,90	-	100,00%	6.177,90	-	6.177,90
10.9	Piso portati de alerta, bornache integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (finimento e assentamento)	m²	22,68	221,43	5.022,03	22,68	-	22,68	-	100,00%	5.022,03	-	5.022,03
10.10	Soliera em granito cinza andorinha, l=15cm, E=2CM	m	95,70	94,55	9.048,44		95,70	95,70	-	100,00%	-	9.048,44	9.048,44
10.11	Soliera em granito cinza andorinha, l=30cm, E=2CM	m	1,77	146,25	258,86		1,77	1,77	-	100,00%	-	258,86	258,86
	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>												
10.12	Passo em concreto desmemorado com junta plastica a cada 1,20m e=7cm	m²	492,41	36,18	17.815,39		492,41	492,41	-	100,00%	-	17.815,39	17.815,39
10.13	Rampa de acesso em concreto não estrutura	m²	28,22	26,76	755,73		28,22	28,22	-	100,00%	-	755,73	755,73
10.14	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm, tck 35mpa, assentado sobre colchão de areia	m²	140,93	55,44	7.813,16		140,93	140,93	-	100,00%	-	7.813,16	7.813,16
10.15	Piso terci de alerta em placas pré-moldadas - 5mpa	m²	4,86	140,74	684,00		4,86	4,86	-	100,00%	-	684,00	684,00
10.16	Piso terci de alerta em placas pré-moldadas - 5mpa	m²	8,64	140,74	1.215,99		8,64	8,64	-	100,00%	-	1.215,99	1.215,99
10.17	Meli-tro (jua) de concreto, pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	330,28	39,65	13.095,60		330,28	330,28	-	100,00%	-	13.095,60	13.095,60
10.18	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60	89,94	679,54		7,60	7,60	-	100,00%	-	679,54	679,54
10.19	Grana batatas em placas	m²	416,68	21,74	9.059,62		416,68	416,68	-	100,00%	-	9.059,62	9.059,62
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				<b>176.445,75</b>						<b>0,00</b>	<b>176.445,75</b>	<b>176.445,75</b>
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demãos	m²	2.489,11	20,91	52.047,29		2.489,11	2.489,11	-	100,00%	-	52.047,29	52.047,29
11.2	Pinura em latex acrilico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.489,11	17,63	43.883,01		2.489,11	2.489,11	-	100,00%	-	43.883,01	43.883,01
11.3	Pinura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	15,18	7.560,10		498,03	498,03	-	100,00%	-	7.560,10	7.560,10
11.4	Pinura em esmalte sintético 02 demão em esquadras de madeira	m²	165,75	26,66	4.419,90		165,75	165,75	-	100,00%	-	4.419,90	4.419,90
11.5	Pinura em esmalte sintético 02 demão em rodameio de madeira	m²	24,25	26,83	650,63		24,25	24,25	-	100,00%	-	650,63	650,63
11.6	Pinura esoxi - 02 demãos	m²	239,76	67,66	16.226,96		239,76	239,76	-	100,00%	-	16.226,96	16.226,96
11.7	Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão, af. 06/2014	m²	498,03	8,23	4.126,67		498,03	498,03	-	100,00%	-	4.126,67	4.126,67
11.8	Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m²	2.489,11	7,09	17.647,79		2.489,11	2.489,11	-	100,00%	-	17.647,79	17.647,79
11.9	Emassamento com massa esoxi, 2 demãos	m²	239,76	86,06	20.638,54		239,76	239,76	-	100,00%	-	20.638,54	20.638,54
11.10	Ciação em tres demãos em paredes	m²	651,40	8,52	5.543,41		651,40	651,40	-	100,00%	-	5.543,41	5.543,41
	<b>CAIXA D'AGUA 30.000L</b>												
11.11	Emassamento de paredes externas 2 demãos com massa acrilica (Área = 3,14 x 2,50² x D x 11,53m A)	m²	89,73	23,61	2.118,53		89,73	89,73	-	100,00%	-	2.118,53	2.118,53
11.12	Pinura em latex acrilico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	89,73	17,63	1.581,94		89,73	89,73	-	100,00%	-	1.581,94	1.581,94
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				<b>42.789,18</b>						<b>0,00</b>	<b>42.789,18</b>	<b>42.789,18</b>
	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO</b>												
12.1	Bolsa de ligação para vaso sanitario 1 1/2"	und	26,00	3,73	96,98		26,00	26,00	-	100,00%	-	96,98	96,98
12.2	Encaxe flexível plastico 1/2 - 3/4"	und	45,00	10,38	467,10		45,00	45,00	-	100,00%	-	467,10	467,10
12.3	tubo de descarga PVC 30mm	und	26,00	20,04	521,04		26,00	26,00	-	100,00%	-	521,04	521,04
12.4	Tubo de ligação laticronado com carrola para sanitario	und	26,00	7,29	192,14		26,00	26,00	-	100,00%	-	192,14	192,14
12.5	Linha solavel com rosca 25mm - 3/4"	und	15,00	4,25	63,75		15,00	15,00	-	100,00%	-	63,75	63,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº: 36	CONTRATO:	1.811.634,40
		WM CONSTRUÇÕES LTDA			ADITIVO:	324.759,36
		CNPJ: 02.364.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	DATA:	REALISTE REEQUILIBRIO:	819.365,98
OBRA: CRECHE PROFIÊNCIA TIPO I NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				quarta-feira, 13 de março de 2024	REALISTE:	77.128,02
				PERÍODO:	TOTAL:	3.032.887,76
				16/01/2024 A 31/01/2024	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.995.353,58
					SALDO:	37.534,18
					VALOR DA MEDIÇÃO:	93.229,48



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.6	Cap soltaivel 20mm	und	1,00	1,50	1,50		1,00	1,00	-	100,00%		1,50	1,50
12.7	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	4,00	502,36	2.009,44		4,00	4,00	-	100,00%		2.009,44	2.009,44
12.8	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	4,00	359,05	1.436,20		4,00	4,00	-	100,00%		1.436,20	1.436,20
12.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	23,00	23,00		1,00	1,00	-	100,00%		23,00	23,00
12.10	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92		4,00	4,00	-	100,00%		210,92	210,92
12.11	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	3,00	3,98	11,94		3,00	3,00	-	100,00%		11,94	11,94
12.12	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	77,00	3,96	306,46		77,00	77,00	-	100,00%		306,46	306,46
12.13	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 30mm - 1", fornecimento e instalação	und	2,00	5,61	11,22		2,00	2,00	-	100,00%		11,22	11,22
12.14	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	und	36,00	11,64	419,04		36,00	36,00	-	100,00%		419,04	419,04
12.15	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	und	16,00	22,80	364,80		16,00	16,00	-	100,00%		364,80	364,80
12.16	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	und	4,00	37,36	149,44		4,00	4,00	-	100,00%		149,44	149,44
12.17	Adaptador sol. Curto com bolsa-nossa para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	4,00	57,73	230,92		4,00	4,00	-	100,00%		230,92	230,92
12.18	Bucha de reducao sol. Curta 110 - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	2,00	71,01	142,02		2,00	2,00	-	100,00%		142,02	142,02
12.19	Bucha de reducao sol. Curta 102mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	1,00	8,44	8,44		1,00	1,00	-	100,00%		8,44	8,44
12.20	Bucha de reducao sol. Curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	23,00	0,98	22,54		23,00	23,00	-	100,00%		22,54	22,54
12.21	Bucha de reducao sol. Curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	3,00	17,29	51,87		3,00	3,00	-	100,00%		51,87	51,87
12.22	Bucha de reducao sol. longa 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	6,00	17,95	107,70		6,00	6,00	-	100,00%		107,70	107,70
12.23	Bucha de reducao sol. longa 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	27,00	4,71	127,17		27,00	27,00	-	100,00%		127,17	127,17
12.24	Bucha de reducao sol. longa 50mm - 30mm, fornecimento e instalação	und	2,00	5,19	10,38		2,00	2,00	-	100,00%		10,38	10,38
12.25	Bucha de reducao sol. longa 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	5,00	8,84	44,20		5,00	5,00	-	100,00%		44,20	44,20
12.26	Bucha de reducao sol. longa 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	14,00	15,73	220,22		14,00	14,00	-	100,00%		220,22	220,22
12.27	Bucha de reducao sol. longa 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	4,00	21,45	85,80		4,00	4,00	-	100,00%		85,80	85,80
12.28	Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	und	6,00	3,24	20,04		6,00	6,00	-	100,00%		20,04	20,04
12.29	Joelho 45 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	5,38	10,76		2,00	2,00	-	100,00%		10,76	10,76
12.30	Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	und	2,00	9,31	18,62		2,00	2,00	-	100,00%		18,62	18,62
12.31	Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	47,45	94,90		2,00	2,00	-	100,00%		94,90	94,90
12.32	Joelho 45 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação	und	2,00	53,86	107,72		2,00	2,00	-	100,00%		107,72	107,72
12.33	Joelho 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalação	und	7,00	26,76	187,32		7,00	7,00	-	100,00%		187,32	187,32
12.34	Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalação	und	3,00	4,71	14,13		3,00	3,00	-	100,00%		14,13	14,13
12.35	Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	und	149,00	5,55	826,95		149,00	149,00	-	100,00%		826,95	826,95
12.36	Joelho 90 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	7,38	14,76		2,00	2,00	-	100,00%		14,76	14,76
12.37	Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação - preco licitado	und	10,00	8,08	80,80		10,00	10,00	-	100,00%		80,80	80,80
12.38	Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação - preco reajustado	und	9,00	11,84	106,56		9,00	9,00	-	100,00%		106,56	106,56
12.39	Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalação	und	11,00	32,76	360,36		11,00	11,00	-	100,00%		360,36	360,36
12.40	Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	101,78	203,56		2,00	2,00	-	100,00%		203,56	203,56
12.41	Joelho 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação - preco licitado	und	5,00	69,40	347,00		5,00	5,00	-	100,00%		347,00	347,00
12.42	Joelho 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação - preco reajustado	und	5,00	101,78	508,90		5,00	5,00	-	100,00%		508,90	508,90
12.43	Joelho de reducao 90 socavel - 32 mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	14,61	29,22		2,00	2,00	-	100,00%		29,22	29,22
12.44	Te 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalação	und	2,00	64,95	129,90		2,00	2,00	-	100,00%		129,90	129,90
12.45	Te 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	und	32,00	7,71	246,72		32,00	32,00	-	100,00%		246,72	246,72
12.46	Te 90 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	und	1,00	7,98	7,98		1,00	1,00	-	100,00%		7,98	7,98
12.47	Te 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	und	13,00	13,28	172,64		13,00	13,00	-	100,00%		172,64	172,64
12.48	Te 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalação	und	11,00	34,15	375,65		11,00	11,00	-	100,00%		375,65	375,65
12.49	Te 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	und	3,00	30,49	91,47		3,00	3,00	-	100,00%		91,47	91,47
12.50	Te 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação	und	8,00	30,49	243,92		8,00	8,00	-	100,00%		243,92	243,92
12.51	Te reducao 90 socavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	8,44	16,88		2,00	2,00	-	100,00%		16,88	16,88

*(Handwritten signatures and initials)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO								VALORES (R\$)			
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº 36		CONTRATO:		1.811.634,40					
						ADITIVO:		324.759,36					
WM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 02.364.380/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE		DATA:		REAJUSTE RECEQUILBRIO		819.365,98			
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.						quarta-feira, 13 de março de 2024		REAJUSTE		77.128,02			
						PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADO:		2.995.353,58			
						16/01/2024 A 31/01/2024		SALDO:		37.534,18			
										VALOR DA MEDIÇÃO:		93.229,48	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)		
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.50	a	und	15,00	13,40	201,00		15,00	15,00	-	100,00%	-	201,00	201,00
	b	und	14,00	19,65	275,10		14,00	14,00	-	100,00%	-	275,10	275,10
12.51	a	und	6,00	41,31	247,86		6,00	6,00	-	100,00%	-	247,86	247,86
	b	und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%	-	302,95	302,95
12.52		und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%	-	302,95	302,95
12.53		und	5,00	113,29	566,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	566,45	566,45
12.54		und	2,00	113,29	226,58		2,00	2,00	-	100,00%	-	226,58	226,58
12.55		und	6,00	13,55	81,30		6,00	6,00	-	100,00%	-	81,30	81,30
12.56		und	81,00	14,61	1.183,41		81,00	81,00	-	100,00%	-	1.183,41	1.183,41
12.57		und	11,00	6,30	69,30		11,00	11,00	-	100,00%	-	69,30	69,30
12.58		und	22,00	11,55	254,10		22,00	22,00	-	100,00%	-	254,10	254,10
12.59		und	3,00	8,29	24,87		3,00	3,00	-	100,00%	-	24,87	24,87
12.60		und	1,00	4,41	4,41		1,00	1,00	-	100,00%	-	4,41	4,41
12.61		und	5,00	5,09	25,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	25,45	25,45
12.62		und	2,00	12,15	24,30		2,00	2,00	-	100,00%	-	24,30	24,30
12.63		und	1,00	1,85	1,85		1,00	1,00	-	100,00%	-	1,85	1,85
12.64		m	46,19	12,14	560,75		46,19	46,19	-	100,00%	-	560,75	560,75
12.65		m	319,27	3,86	1.232,38		319,27	319,27	-	100,00%	-	1.232,38	1.232,38
12.66		m	57,32	7,85	449,96		57,32	57,32	-	100,00%	-	449,96	449,96
12.67	a	m	111,79	13,98	1.562,82		111,79	111,79	-	100,00%	-	1.562,82	1.562,82
	b	m	14,95	20,50	306,48		14,95	14,95	-	100,00%	-	306,48	306,48
12.68	a	m	38,62	21,48	829,56		38,62	38,62	-	100,00%	-	829,56	829,56
	b	m	16,55	31,49	521,16		16,55	16,55	-	100,00%	-	521,16	521,16
12.69	a	m	47,05	29,93	1.408,21		47,05	47,05	-	100,00%	-	1.408,21	1.408,21
	b	m	20,16	43,89	884,82		20,16	20,16	-	100,00%	-	884,82	884,82
12.70		m	121,92	37,55	4.578,10		121,92	121,92	-	100,00%	-	4.578,10	4.578,10
12.71		m	59,15	35,99	2.128,81		59,15	59,15	-	100,00%	-	2.128,81	2.128,81
12.72		und	1,00	153,95	153,95		1,00	1,00	-	100,00%	-	153,95	153,95
12.73		und	1,00	210,89	210,89		1,00	1,00	-	100,00%	-	210,89	210,89
12.74		und	1,00	11,09	11,09		1,00	1,00	-	100,00%	-	11,09	11,09
12.75		und	8,00	184,95	1.479,60		8,00	8,00	-	100,00%	-	1.479,60	1.479,60
12.76		und	2,00	356,01	712,02		2,00	2,00	-	100,00%	-	712,02	712,02
12.77		und	2,00	614,74	1.229,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.229,48	1.229,48
12.78		und	2,00	1.026,01	2.052,02		2,00	2,00	-	100,00%	-	2.052,02	2.052,02
12.79		und	1,00	143,09	143,09		1,00	1,00	-	100,00%	-	143,09	143,09
12.80		und	5,00	210,89	1.054,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	1.054,45	1.054,45
12.81		und	31,00	143,09	4.435,79		31,00	31,00	-	100,00%	-	4.435,79	4.435,79
12.82		und	15,00	101,26	1.518,90		15,00	15,00	-	100,00%	-	1.518,90	1.518,90
<b>13</b>	<b>DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				<b>12.168,17</b>						<b>0,00</b>	<b>12.168,17</b>	<b>12.168,17</b>
	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC</b>												
13.1		m	237,27	19,69	4.671,85		237,27	237,27	-	100,00%	-	4.671,85	4.671,85
13.2		m	107,14	37,13	3.978,11		107,14	107,14	-	100,00%	-	3.978,11	3.978,11
13.3		und	52,00	10,85	564,20		52,00	52,00	-	100,00%	-	564,20	564,20
13.4		und	26,00	14,55	378,30		26,00	26,00	-	100,00%	-	378,30	378,30
13.5		und	4,00	15,01	60,04		4,00	4,00	-	100,00%	-	60,04	60,04
13.6		und	4,00	48,41	193,64		4,00	4,00	-	100,00%	-	193,64	193,64


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº: 36	CONTRATO:	1.811.634,40
		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DATA:	ADITIVO:	324.759,36
		CNPJ: 07.364.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	quarta-feira, 13 de março de 2014	REALISTE (REQUILIBRO):	819.365,98
OBRA: CRECHE-PROFANCA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.					REALISTE:	77.128,02
					TOTAL:	3.032.887,76
				PERÍODO:	INDICAÇÃO ACUMULADO:	2.995.353,58
				16/01/2014 A 31/01/2014	SALDO:	37.534,18
					VALOR DA MEDIÇÃO:	93.229,48

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
	<b>ACESSÓRIOS</b>												
13.7	Rolo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø 100mm	und	24,00	37,22	893,04		24,00	24,00	-	100,00%	-	893,04	893,04
13.8	Caixa de areia sem grelha Ø600mm	und	20,00	71,45	1.429,00		20,00	20,00	-	100,00%	-	1.429,00	1.429,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>36.617,56</b>						<b>0,00</b>	<b>32.204,89</b>	<b>32.204,89</b>
14.1	Caixa sifonada 150x150x50mm	und	19,00	30,38	577,22		19,00	19,00	-	100,00%	-	577,22	577,22
14.2	Caixa sifonada 150x150x75mm	und	1,00	70,86	70,86		1,00	1,00	-	100,00%	-	70,86	70,86
14.3	Ralo sifonado PVC 100x100x40mm	und	30,00	11,68	350,40		30,00	30,00	-	100,00%	-	350,40	350,40
14.4	Terminal de ventilação serie normal 50mm	m	39,00	8,49	331,11		39,00	39,00	-	100,00%	-	331,11	331,11
14.5	Tubo PVC rígido 100mm, fornecimento e instalação	m	185,60	35,99	6.678,74		185,60	185,60	-	100,00%	-	6.678,74	6.678,74
14.6	Tubo PVC rígido 40mm, fornecimento e instalação	m	118,87	12,90	1.533,42		118,87	118,87	-	100,00%	-	1.533,42	1.533,42
14.7	Tubo PVC rígido 50mm, fornecimento e instalação	m	169,90	19,06	3.238,29		169,90	169,90	-	100,00%	-	3.238,29	3.238,29
14.8	Tubo PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	166,99	24,33	4.062,87		166,99	166,99	-	100,00%	-	4.062,87	4.062,87
14.9	Tubo PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	38,01	37,13	1.411,31		38,01	38,01	-	100,00%	-	1.411,31	1.411,31
14.10	Caixa de esgoto SIMPLES	und	7,00	123,48	864,36		7,00	7,00	-	100,00%	-	864,36	864,36
14.11	CADA DE ESPERAÇÃO ESQUOTO	und	17,00	315,33	5.360,61		17,00	17,00	-	100,00%	-	5.360,61	5.360,61
14.12	CADA DE PASSAGEM MODULAR	und	1,00	134,28	134,28		1,00	1,00	-	100,00%	-	134,28	134,28
14.13	Simulador em alvenaria 2,40x2,40m	und	1,00	2.378,11	2.378,11		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.14	Fossa séptica 2,30x2,30m	und	1,00	2.034,60	2.034,60		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.15	Bucha de redução PVC (tampa 50mm-4)	und	38,00	5,75	218,50		38,00	38,00	-	100,00%	-	218,50	218,50
14.16	Curva PVC 90 curta - 40mm - fornecimento e instalação	und	97,00	5,01	485,97		97,00	97,00	-	100,00%	-	485,97	485,97
14.17	Curva PVC 90 curta - 50mm - fornecimento e instalação	und	15,00	7,88	118,20		15,00	15,00	-	100,00%	-	118,20	118,20
14.18	Curva PVC 90 curta - 75mm - fornecimento e instalação	und	24,00	20,73	497,52		24,00	24,00	-	100,00%	-	497,52	497,52
14.19	Jebeho PVC 45 - 100mm - fornecimento e instalação	und	7,00	14,55	101,85		7,00	7,00	-	100,00%	-	101,85	101,85
14.20	Jebeho PVC 45 - 75mm - fornecimento e instalação	und	9,00	11,84	106,56		9,00	9,00	-	100,00%	-	106,56	106,56
14.21	Jebeho PVC 45 - 50mm - fornecimento e instalação	und	23,00	7,05	162,15		23,00	23,00	-	100,00%	-	162,15	162,15
14.22	Jebeho PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	50,00	5,21	260,50		50,00	50,00	-	100,00%	-	260,50	260,50
14.23	Jebeho PVC 90 - 100mm - fornecimento e instalação	und	26,00	15,01	390,26		26,00	26,00	-	100,00%	-	390,26	390,26
14.24	Jebeho PVC 90 - 75mm - fornecimento e instalação	und	34,00	8,44	286,96		34,00	34,00	-	100,00%	-	286,96	286,96
14.25	Jebeho PVC 90 - 50mm - fornecimento e instalação	und	24,00	6,55	157,20		24,00	24,00	-	100,00%	-	157,20	157,20
14.26	Jebeho PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	5,03	95,57		19,00	19,00	-	100,00%	-	95,57	95,57
14.27	Jebeho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1/2" - fornecimento e instalação	und	65,00	5,03	326,95		65,00	65,00	-	100,00%	-	326,95	326,95
14.28	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	25,00	46,83	1.223,25		25,00	25,00	-	100,00%	-	1.223,25	1.223,25
14.29	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	44,29	88,58		2,00	2,00	-	100,00%	-	88,58	88,58
14.30	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	und	19,00	45,56	865,64		19,00	19,00	-	100,00%	-	865,64	865,64
14.31	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	30,29	151,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	151,45	151,45
14.32	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	30,29	60,78		2,00	2,00	-	100,00%	-	60,78	60,78
14.33	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	6,00	9,81	58,86		6,00	6,00	-	100,00%	-	58,86	58,86
14.34	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	6,26	31,30		5,00	5,00	-	100,00%	-	31,30	31,30
14.35	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	1,00	11,33	11,33		1,00	1,00	-	100,00%	-	11,33	11,33
14.36	Te PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	11,53	219,07		19,00	19,00	-	100,00%	-	219,07	219,07
14.37	Te PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	31,00	37,56	1.164,36		31,00	31,00	-	100,00%	-	1.164,36	1.164,36
14.38	Te PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	und	2,00	87,76	175,52		2,00	2,00	-	100,00%	-	175,52	175,52
14.39	Te PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	und	18,00	11,99	215,84		18,00	18,00	-	100,00%	-	215,84	215,84
14.40	Te PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	4,00	28,84	115,36		4,00	4,00	-	100,00%	-	115,36	115,36
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>60.646,54</b>						<b>1.791,65</b>	<b>58.854,89</b>	<b>60.646,54</b>
15.1	Bacia sanitária waque plus, linha conforto com abertura, cor branco gelo, código p.15, DECA ou equivalente (j) de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para lavação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	und	2,00	1.207,24	2.414,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	2.414,48	2.414,48
15.2	Bacia sanitária convencional, código l.01. DECA ou equivalente com acessórios fornecimento e instalação	und	4,00	315,08	1.260,32		4,00	4,00	-	100,00%	-	1.260,32	1.260,32
15.3	Bacia convencional studio kids, código P.15, para válvula de descarga, em louça, branco assento plástico, anel de vedação, tubo pvc longo - fornecimento e instalação (deze ou equivalente)	und	20,00	589,80	11.797,20		20,00	20,00	-	100,00%	-	11.797,20	11.797,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº. 36	CONTRATO	1.811.634,40
WM CONSTRUÇÕES LTDA			ATIVO	324.759,36	
			DATA:	REALISTE (RE-EQUILIBRIO)	819.365,98
			quarta-feira, 13 de março de 2014	REALISTE	77.128,02
	CNPJ: 02.364.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE		TOTAL:	3.032.887,76
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAURIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE			PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADO	2.995.353,58
			16/01/2014 A 31/01/2014	SALDO:	37.534,18
				VALOR DA MEDIÇÃO:	93.229,48

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15.4	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	und	26,00	386,75	10.055,50		26,00	26,00	-	100,00%		10.055,50	10.055,50
15.5	Assento polister com abertura frontal vague plus, linha conforto, cor branco gelo, codico AP.52, DECA, ou equivalente	und	2,00	991,76	1.983,52		2,00	2,00	-	100,00%		1.983,52	1.983,52
15.6	Assento plastico lzy, codico AP.01, DECA	und	4,00	34,10	136,40		4,00	4,00	-	100,00%		136,40	136,40
15.7	Panela Metalica lzy, codico 2001.237, DECA equivalente	und	26,00	28,19	732,94		26,00	26,00	-	100,00%		732,94	732,94
15.8	Ducha igienica com registro e dreno, codico 1984.437 Act. O, DECA ou equivalente	und	4,00	167,61	670,44		4,00	4,00	-	100,00%		670,44	670,44
15.9	Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha lzy, codico 1101.17, DECA ou equivalente, com valvula sifo e encoste flexivel cromado	und	4,00	113,76	455,04		4,00	4,00	-	100,00%		455,04	455,04
15.10	Lavatorio pequeno reversivel cor branco gelo, com coluna suspenso, codico 11915, DECA ou equivalente	und	6,00	133,45	800,70		6,00	6,00	-	100,00%		800,70	800,70
15.11	Caixa de embalar oval cor branco gelo, codico 137, DECA, ou equivalente em bancada e complementos (valvulas, sifão e engate flexivel cromado) exceto torneira	und	22,00	156,59	3.444,98		22,00	22,00	-	100,00%		3.444,98	3.444,98
15.12	Caixa industrial 50x40, profundidade 30 - HIDROMON, ou equivalente, com sifo em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	3,00	160,18	480,54		3,00	3,00	-	100,00%		480,54	480,54
15.13	Caixa inox embalar 40x34x17cm, caixa 3, base aço inoxidavel, com valvula, FRANCO, ou equivalente, com sifo em metal cromado 1.1/2x1.1/2". Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	15,00	368,33	5.524,95		15,00	15,00	-	100,00%		5.524,95	5.524,95
15.14	Dispenser saboneteira linha excelence, codico 7009, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	20,66	537,16		26,00	26,00	-	100,00%		537,16	537,16
15.15	Dispenser toalha linha excelence, codico 7007, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	21,44	557,44		26,00	26,00	-	100,00%		557,44	557,44
15.16	Barra de apoio, linha conforto, codico 2310.080.FSC, apo inox polido, DECA ou equivalente	und	8,00	33,55	268,40		8,00	8,00	-	100,00%		268,40	268,40
15.17	Barra de apoio de canto para banheiro, aço inox polido, cante ou equivalente	und	4,00	15,15	60,60	1,00	3,00	4,00	-	100,00%	15,15	48,45	64,60
15.18	Barra de apoio de chuveiro PNE, em T", linha conforto codico 7135.FSC	und	1,00	86,16	86,16	1,00	-	1,00	-	100,00%	86,16	86,16	
15.19	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1.1/4"	und	20,60	119,61	2.463,97		20,60	20,60	-	100,00%		2.463,97	2.463,97
15.20	Banheira embutir em plastico tipo PVC, 74x50x20cm, burisopto ou equivalente	und	4,00	540,95	2.163,80		4,00	4,00	-	100,00%		2.163,80	2.163,80
15.21	torneira electrica boreanes, LORENZETTI ou equivalente	und	2,00	274,89	549,78	2,00	-	2,00	-	100,00%	549,78	549,78	
15.22	Torneira electrica ford max, com mangueira plastica, codico 7904, LORENZETTI ou equivalente	und	4,00	285,14	1.140,56	4,00	-	4,00	-	100,00%	1.140,56	1.140,56	
15.23	Torneira acabamento para registro pequeno linha lzy, codico 4900.237.20, DECA ou equivalente (para chuveiro) deca ou equivalente	und	15,00	169,25	2.538,75		15,00	15,00	-	100,00%		2.538,75	2.538,75
15.24	Torneira para cozinha de mesa bica movel lzy, codico 1167.237, DECA ou equivalente	und	15,00	159,40	2.391,00		15,00	15,00	-	100,00%		2.391,00	2.391,00
15.25	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	und	11,00	23,79	261,69		11,00	11,00	-	100,00%		261,69	261,69
15.26	Torneira para banheiro de mesa bica bala lzy, codico 1193, Deca ou equivalente	und	32,00	79,65	2.548,80		32,00	32,00	-	100,00%		2.548,80	2.548,80
15.27	Chuveiro max ducha, LORENZETTI, com mangueira plastica/benvidor para duchas electricas, codico 8019-A, LORENZETTI ou equivalente	und	15,00	99,91	1.498,65		15,00	15,00	-	100,00%		1.498,65	1.498,65
15.28	Tanque grande (40 l) cor branco gelo, codico 1103, DECA ou equivalente incluso torneira cromada	und	7,00	516,61	3.616,27		7,00	7,00	-	100,00%		3.616,27	3.616,27
<b>16</b>	<b>INSTALÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL</b>				<b>3.460,53</b>						<b>3.460,53</b>	<b>2.065,17</b>	<b>3.460,53</b>
16.1	Alinpo para Central de G2, em concreto	m²	1,42	412,89	586,30		1,42	1,42	-	100,00%		586,30	586,30
16.2	Tela metálica para ventilação com resaca em alumínio	m²	0,16	768,73	123,00	0,16	-	0,16	-	100,00%	123,00	-	123,00
16.3	Tubo de aço galvanizado O 3/4", inclusive conexões	m	43,00	18,20	782,60		43,00	43,00	-	100,00%		782,60	782,60
16.4	Emboamento de concreto - 3m	m	42,00	13,34	560,28		42,00	42,00	-	100,00%		560,28	560,28
16.5	Pila anticontra-incêndio (2 unidades)	und	3,00	30,76	92,28		3,00	3,00	-	100,00%		92,28	92,28
16.6	Valvula esfera O 3/4" NPT 300	und	4,00	71,93	287,72	4,00	-	4,00	-	100,00%	287,72	-	287,72
16.7	União 3/4" NPT 300	und	3,00	2,63	7,89		3,00	3,00	-	100,00%		7,89	7,89
16.8	Noze 3/4" NPT 300	und	6,00	59,03	354,18	6,00	-	6,00	-	100,00%	354,18	-	354,18
16.9	Noze 1/2" NPT 300	und	4,00	12,73	50,92	4,00	-	4,00	-	100,00%	50,92	-	50,92
16.10	Noze 1/4" NPT 300	und	4,00	28,76	115,04	4,00	-	4,00	-	100,00%	115,04	-	115,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)					
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 36	CONTRATO: 1.811.634,40		ADITIVO: 324.759,36						
		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DATA:	REALIESTE REEQUILIBRIO: 819.365,98		REALIESTE: 77.128,02						
		CNPJ: 02.364.382/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	quarta-feira, 13 de março de 2024	TOTAL: 3.032.887,76		MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.995.353,58						
OBRA: CRECHE PROFUNDA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				PERÍODO:	SALDO: 37.534,18		VALOR DA MEDIÇÃO: 93.229,48						
				16/01/2024 A 31/01/2024									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.11	Tê redução 3/4" x 1/2"	und	1,00	7,06	7,06		1,00	1,00	-	100,00%	-	7,06	7,06
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	und	1,00	4,78	4,78		1,00	1,00	-	100,00%	-	4,78	4,78
16.13	Luva de redução 3/4" x 1/2"	und	2,00	6,24	12,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	12,48	12,48
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	und	2,00	0,75	1,50		2,00	2,00	-	100,00%	-	1,50	1,50
16.15	Jebeiro 1/2" - nut 300	und	2,00	5,00	10,00		2,00	2,00	-	100,00%	-	10,00	10,00
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	und	1,00	51,06	51,06	1,00	-	1,00	-	100,00%	51,06	-	51,06
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	und	1,00	84,16	84,16	1,00	-	1,00	-	100,00%	84,16	-	84,16
16.18	Mangueira flexível	m	2,00	19,83	39,66	2,00	-	2,00	-	100,00%	39,66	-	39,66
16.20	Regulador 2º estágio com registro	und	2,00	51,06	102,12	2,00	-	2,00	-	100,00%	102,12	-	102,12
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x248) proibido fumar	und	1,00	97,75	97,75	1,00	-	1,00	-	100,00%	97,75	-	97,75
16.22	Placa de sinalização em pvc cod 5 - (348x248) perigo inflamável	und	1,00	97,75	97,75	1,00	-	1,00	-	100,00%	97,75	-	97,75
<b>17</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>				<b>55.900,47</b>						<b>2.279,59</b>	<b>53.628,88</b>	<b>55.900,47</b>
17.1	Extintor ABC - 6kg	und	7,00	290,76	2.035,32		7,00	7,00	-	100,00%	-	2.035,32	2.035,32
17.2	Extintor CO2 - 9kg	und	1,00	992,58	992,58		1,00	1,00	-	100,00%	-	992,58	992,58
17.3	Cotovelo 45 galvanizado 2 1/2"	und	2,00	37,61	75,22		2,00	2,00	-	100,00%	-	75,22	75,22
17.4	Cotovelo 45 galvanizado 2 1/2"	und	7,00	37,61	263,27		7,00	7,00	-	100,00%	-	263,27	263,27
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	und	1,25	157,70	247,13		1,25	1,25	-	100,00%	-	247,13	247,13
17.6	Niple cupro aço galvanizado 2 1/2"	und	10,00	69,58	695,80		10,00	10,00	-	100,00%	-	695,80	695,80
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	und	4,00	119,40	477,60		4,00	4,00	-	100,00%	-	477,60	477,60
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 1/2"	und	90,96	91,50	8.322,84		90,96	90,96	-	100,00%	-	8.322,84	8.322,84
17.9	Adaptador size - rosca internas 2 1/2"	und	3,00	123,11	369,33	3,00	-	3,00	-	100,00%	369,33	-	369,33
17.10	Canva para abridor de manobra - 70x50x25 cm	und	2,00	680,43	1.360,86		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.360,86	1.360,86
17.11	Chave para conexão de manobra tipo struc rodado - diâmetro 1 1/2 x 1 1/2"	und	3,00	26,79	80,37		3,00	3,00	-	100,00%	-	80,37	80,37
17.12	Espelho jato sólido 1 1/2" 18mm	und	3,00	100,71	302,13		3,00	3,00	-	100,00%	-	302,13	302,13
17.13	Mangueiras 1 1/2" 16mm	und	4,00	488,78	1.955,12		4,00	4,00	-	100,00%	-	1.955,12	1.955,12
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	und	3,00	69,58	208,74		3,00	3,00	-	100,00%	-	208,74	208,74
17.15	Redução oratória tipo Struc - 2 1/2" x 1 1/2"	und	3,00	200,73	602,19		3,00	3,00	-	100,00%	-	602,19	602,19
17.16	Registro globo 2 1/2" 45	und	3,00	287,08	861,24		3,00	3,00	-	100,00%	-	861,24	861,24
17.17	Tampão cego com corrente tipo store 1 1/2"	und	3,00	109,74	329,22	3,00	-	3,00	-	100,00%	329,22	-	329,22
17.18	Registro lobo de cabeça industrial 2 1/2"	und	5,00	343,85	1.719,25		5,00	5,00	-	100,00%	-	1.719,25	1.719,25
17.19	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	und	2,00	541,96	1.083,92		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.083,92	1.083,92
17.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	und	4,00	310,05	1.240,20	4,00	-	4,00	-	100,00%	1.240,20	-	1.240,20
17.21	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 5w de 1 hora	und	40,00	535,79	21.431,60		40,00	40,00	-	100,00%	-	21.431,60	21.431,60
17.22	Marcação no piso - 1x 1m para extintor	und	8,00	30,44	243,52	8,00	-	8,00	-	100,00%	243,52	-	243,52
17.23	Marcação no piso - 1x 1m para extintor	und	3,00	30,44	91,32	3,00	-	3,00	-	100,00%	91,32	-	91,32
17.24	Conjunto mochila extintora BC-21 R 1 1/2 3 CV	und	2,00	4.096,35	8.192,70		2,00	2,00	-	100,00%	-	8.192,70	8.192,70
17.25	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incêndio	und	2,00	97,75	195,50		2,00	2,00	-	100,00%	-	195,50	195,50
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x156) Saida de emergência	und	15,00	97,75	1.466,25		15,00	15,00	-	100,00%	-	1.466,25	1.466,25
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x156) Mensagem "saida"	und	3,00	97,75	293,25		3,00	3,00	-	100,00%	-	293,25	293,25
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de incêndio	und	8,00	97,75	782,00		8,00	8,00	-	100,00%	-	782,00	782,00
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>				<b>259.183,91</b>						<b>50.333,22</b>	<b>175.782,76</b>	<b>226.115,97</b>
18.1	Quadro de distribuição de embudo completo, (para 08 disjuntor monophasicos, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi cor-de-rosa, v. porta, trinco e acessórios)	und	2,00	449,80	899,60		2,00	2,00	-	100,00%	-	899,60	899,60
18.2	Quadro de distribuição de embudo completo, (para 18 disjuntor monophasicos, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi cor-de-rosa, v. porta, trinco e acessórios)	und	3,00	449,80	1.349,40		3,00	3,00	-	100,00%	-	1.349,40	1.349,40
18.3	Quadro de distribuição de embudo completo, (para 24 disjuntor monophasicos, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi cor-de-rosa, v. porta, trinco e acessórios)	und	2,00	497,95	995,90		2,00	2,00	-	100,00%	-	995,90	995,90
18.4	Quadro de medição - foneamento e instalação	und	1,00	926,73	926,73		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
	<b>DISJUNTORES</b>												
18.5	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	23,00	14,18	326,14		23,00	23,00	-	100,00%	-	326,14	326,14
18.6	Disjuntor unipolar termomagnético 15A	und	7,00	14,18	99,26		7,00	7,00	-	100,00%	-	99,26	99,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)						
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº: 36	CONTRATO: 1.811.634,40		ADITIVO: 324.759,36		REALISTE / REEQUILIBRIO: 819.365,98						
				TOTAL: 3.032.887,76										
WM CONSTRUÇÕES LTDA		PAR 11681/2014/FNDE	DATA: quarta-feira, 13 de março de 2024	REALISTE: 77.128,02		TOTAL: 3.032.887,76		MEDIÇÃO ACUMULADO: 2.995.353,58						
CNPJ: 02.364.380/0001-13				PERÍODO: 16/01/2024 A 31/01/2024		SALDO: 37.534,18								
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.								VALOR DA MEDIÇÃO: 93.229,48						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
18.7	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	und	19,00	14,18	269,42		19,00	19,00	-	100,00%	-	269,42	269,42	
18.8	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	und	26,00	14,18	368,68		26,00	26,00	-	100,00%	-	368,68	368,68	
18.9	Disjuntos tripolar termomagnético 25A	und	4,00	95,20	380,80		4,00	4,00	-	100,00%	-	380,80	380,80	
18.10	Disjuntos unipolar termomagnético 30A	und	2,00	14,41	28,82		2,00	2,00	-	100,00%	-	28,82	28,82	
18.11	Disjuntos unipolar termomagnético 32A	und	8,00	21,74	173,92		8,00	8,00	-	100,00%	-	173,92	173,92	
18.12	Disjuntos tripolar termomagnético 30A	und	2,00	95,20	190,40		2,00	2,00	-	100,00%	-	190,40	190,40	
18.13	Disjuntos unipolar termomagnético 40A	und	1,00	22,13	22,13		1,00	1,00	-	100,00%	-	22,13	22,13	
18.14	Disjuntos tripolar termomagnético 80A	und	8,00	126,40	1.011,20		8,00	8,00	-	100,00%	-	1.011,20	1.011,20	
18.15	Disjuntos unipolar termomagnético 63A	und	-	92,30	0,00		-	-	-	-	-	-	-	
18.16	Disjuntos unipolar termomagnético 160A	und	-	40,79	0,00		-	-	-	-	-	-	-	
18.17	Disjuntos bipolar termomagnético 100A	und	-	73,05	0,00		-	-	-	-	-	-	-	
18.18	interruptor bipolar DR - 100A	und	3,00	92,30	276,90		3,00	3,00	-	100,00%	-	276,90	276,90	
18.19	interruptor bipolar DR - 25A	und	2,00	40,79	81,58		2,00	2,00	-	100,00%	-	81,58	81,58	
18.20	interruptor bipolar DR - 63A	und	1,00	73,05	73,05		1,00	1,00	-	100,00%	-	73,05	73,05	
18.21	interruptor tetrapolar DR - 80A	und	1,00	331,29	331,29		1,00	1,00	-	100,00%	-	331,29	331,29	
18.22	Dispositivo de proteção contra surto - 175v - 40KA	und	14,00	1.124,31	15.740,34		14,00	14,00	-	100,00%	-	15.740,34	15.740,34	
18.23	Dispositivo de proteção contra surto - 175v - 80KA	und	8,00	1.208,50	9.668,00		8,00	8,00	-	100,00%	-	9.668,00	9.668,00	
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>														
18.24	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 020mm (DN 3/4") inclusive conexões	m	572,20	5,53	3.164,27		572,20	572,20	-	100,00%	-	3.164,27	3.164,27	
18.25	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 025mm (DN 1") inclusive conexões	m	368,20	7,01	2.581,08		368,20	368,20	-	100,00%	-	2.581,08	2.581,08	
18.26	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 032mm (DN 1 1/4") inclusive conexões	m	463,40	9,69	4.490,35		463,40	463,40	-	100,00%	-	4.490,35	4.490,35	
18.27	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 050mm (DN 2") inclusive conexões	m	12,80	22,56	288,77		12,80	12,80	-	100,00%	-	288,77	288,77	
18.28	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 075mm (DN 3") inclusive conexões	m	21,60	29,79	643,46		21,60	21,60	-	100,00%	-	643,46	643,46	
18.29	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 0100mm (DN 4") inclusive conexões	m	18,80	50,53	949,96		18,80	18,80	-	100,00%	-	949,96	949,96	
18.30	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 0125mm (DN 5") inclusive conexões	m	5,50	86,58	476,19		5,50	5,50	-	100,00%	-	476,19	476,19	
18.31	Eletroduto PVC flexível comutado reforço. 0150mm (DN 6") inclusive conexões	m	27,20	115,41	3.139,15		27,20	27,20	-	100,00%	-	3.139,15	3.139,15	
18.32	Eletroduto ferro galvanizado DN 25mm (1") inclusive conexões	m	45,70	39,71	1.814,75	45,70	-	45,70	-	100,00%	1.814,75	-	1.814,75	
18.33	Eletroduto ferro galvanizado DN 32mm (1 1/4") inclusive conexões	m	29,50	66,95	1.975,03	29,50	-	29,50	-	100,00%	1.975,03	-	1.975,03	
18.34	Eletroduto ferro galvanizado DN 20mm (3/4") inclusive conexões	m	80,60	37,68	3.037,01	80,60	-	80,60	-	100,00%	3.037,01	-	3.037,01	
18.35	Eletroduto ferro galvanizado DN 100mm (4") inclusive conexões	m	14,70	123,16	1.810,45	14,70	-	14,70	-	100,00%	1.810,45	-	1.810,45	
18.36	Canais PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação	und	2,00	19,75	39,50	2,00	-	2,00	-	100,00%	39,50	-	39,50	
18.37	Canais PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação	und	3,00	23,61	70,83	3,00	-	3,00	-	100,00%	70,83	-	70,83	
18.38	Caixa de passagem 300x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	219,35	658,05		3,00	3,00	-	100,00%	-	658,05	658,05	
18.39	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	240,30	720,90		3,00	3,00	-	100,00%	-	720,90	720,90	
18.40	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	und	2,00	68,59	137,18		2,00	2,00	-	100,00%	-	137,18	137,18	
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>														
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70c, câmara de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encondimento classe 5, flexível com as seguintes seções nominais														
18.41	a	#2,5 mm² - preço licitado	m	2.565,25	2,89	7.413,57		2.565,25	2.565,25	-	100,00%	-	7.413,57	7.413,57
	b	#2,5 mm² - preço reequilibrado	m	2.565,25	7,56	19.393,25		2.565,25	2.565,25	-	100,00%	-	19.393,25	19.393,25
18.42	a	#4 mm² - preço licitado	m	253,30	4,19	1.061,33		253,30	253,30	-	100,00%	-	1.061,33	1.061,33
	b	#4 mm² - preço reequilibrado	m	253,30	8,90	2.254,37		253,30	253,30	-	100,00%	-	2.254,37	2.254,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº: 36	CONTRATO:	1.811.634,40	
		WM CONSTRUÇÕES LTDA			ADITIVO:	324.759,36	
		CNPJ: 02.364.382/0001-13		DATA:	REALISTE / REEQUILIBRIO:	819.365,98	
OBRA: CRECHE INFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			PAR 11681/2014/FNDE	quarta-feira, 13 de março de 2014	REALISTE:	77.128,02	
					TOTAL:	3.032.887,76	
					PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.995.353,58
					16/01/2014 A 31/01/2014	SALDO:	37.534,18
					VALOR DA MEDIÇÃO:		93.229,48

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18.43	a #6 mm² - preço licitado	m	2.019,80	5,66	11.432,07		2.019,80	2.019,80	-	100,00%	-	11.432,07	11.432,07
	b #6 mm² - preço reequilibrado	m	2.019,80	10,61	21.430,08		2.019,80	2.019,80	-	100,00%	-	21.430,08	21.430,08
18.44	a #10 mm² - preço licitado	m	628,48	8,64	5.430,07		628,48	628,48	-	100,00%	-	5.430,07	5.430,07
	b #10 mm² - preço reequilibrado	m	1.902,02	13,79	26.228,66		1.902,02	1.902,02	0,00	100,00%	-	26.228,66	26.228,66
18.45	#15 mm²	m	186,90	18,71	3.496,90		186,90	186,90	-	100,00%	-	3.496,90	3.496,90
18.46	#25 mm²	m	52,10	28,78	1.473,39	26,05	26,05	52,10	-	100,00%	736,69	736,69	1.473,39
18.47	#25 mm²	m	156,30	37,35	5.837,81	78,15	78,15	156,30	-	100,00%	2.918,90	2.918,90	5.837,81
18.48	#50 mm²	m	51,30	48,03	2.463,94		51,30	51,30	-	100,00%	-	2.463,94	2.463,94
18.49	#70 mm²	m	52,00	68,86	3.580,72	26,00	26,00	52,00	-	100,00%	1.790,35	1.790,35	3.580,72
18.50	#95 mm²	m	152,90	93,83	14.440,44	13,00	76,95	89,95	63,95	58,45%	1.216,79	2.220,22	8.440,01
18.51	#120 mm²	m	156,00	108,58	16.938,48		78,00	78,00	78,00	50,00%	-	8.469,24	8.469,24
<b>ELETRICIDADES</b>													
18.52	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,70	12,14	8,50		0,70	0,70	-	100,00%	-	8,50	8,50
18.53	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,70	11,35	212,25		18,70	18,70	-	100,00%	-	212,25	212,25
18.54	Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,60	11,71	42,16		3,60	3,60	-	100,00%	-	42,16	42,16
18.55	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00	15,80	94,80		6,00	6,00	-	100,00%	-	94,80	94,80
18.56	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,30	19,03	81,83		4,30	4,30	-	100,00%	-	81,83	81,83
18.57	Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões	m	4,40	24,24	106,66		4,40	4,40	-	100,00%	-	106,66	106,66
18.58	Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,50	35,20	158,40		4,50	4,50	-	100,00%	-	158,40	158,40
18.59	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	35,30	5,89	207,92		35,30	35,30	-	100,00%	-	207,92	207,92
18.60	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00	7,93	47,58		6,00	6,00	-	100,00%	-	47,58	47,58
18.61	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	1,30	8,45	10,99		1,30	1,30	-	100,00%	-	10,99	10,99
18.62	Suporte vertical eletrocalha 120x149mm	und	2,00	9,40	18,80		2,00	2,00	-	100,00%	-	18,80	18,80
18.63	Suporte vertical eletrocalha 120x150mm	und	3,00	9,40	28,20		3,00	3,00	-	100,00%	-	28,20	28,20
18.64	Suporte vertical eletrocalha 120x204mm	und	3,00	9,40	28,20		3,00	3,00	-	100,00%	-	28,20	28,20
18.65	Suporte vertical eletrocalha 70x225mm	und	3,00	5,79	17,37		3,00	3,00	-	100,00%	-	17,37	17,37
18.66	Suporte vertical eletrocalha 70x154mm	und	4,00	5,79	23,16		4,00	4,00	-	100,00%	-	23,16	23,16
18.67	Suporte vertical eletrocalha 70x83mm	und	3,00	5,79	17,37		3,00	3,00	-	100,00%	-	17,37	17,37
18.68	Suporte vertical eletrocalha 70x11mm	und	20,00	5,79	115,80		20,00	20,00	-	100,00%	-	115,80	115,80
18.69	Suporte vertical eletrocalha 70x65mm	und	11,00	5,79	63,69		11,00	11,00	-	100,00%	-	63,69	63,69
18.70	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	und	4,00	8,13	32,52		4,00	4,00	-	100,00%	-	32,52	32,52
18.71	Tela plana perfurada 50mm	und	28,00	5,41	151,48		28,00	28,00	-	100,00%	-	151,48	151,48
18.72	Tela plana perfurada 75mm	und	4,00	5,79	23,16		4,00	4,00	-	100,00%	-	23,16	23,16
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>													
18.73	Tomada universal circular 2p+H 10A cor branca completa	und	178,00	24,30	4.325,40	78,00	100,00	178,00	-	100,00%	1.895,40	2.430,00	4.325,40
18.74	Tomada universal circular 2p+H 20A cor branca completa	und	18,00	42,95	773,10	18,00	-	18,00	-	100,00%	773,10	-	773,10
18.75	Interruptor simples 10A completa	und	56,00	19,53	1.093,68	26,00	30,00	56,00	-	100,00%	507,76	585,90	1.093,68
18.76	Luminária 2x36w completa	und	111,00	217,26	24.115,86	111,00	-	111,00	-	100,00%	24.115,86	-	24.115,86
18.77	Luminária 2x14w completa	und	17,00	201,61	3.427,37	17,00	-	17,00	-	100,00%	3.427,37	-	3.427,37
18.78	Luminária 2x36 com abajures completa	und	40,00	105,01	4.200,40	40,00	-	40,00	-	100,00%	4.200,40	-	4.200,40
18.79	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálica 70w	und	15,00	257,06	3.855,90		-	-	15,00	0,00%	-	-	-
18.80	Projeto com lâmpada de vapor metálica 150w	und	4,00	929,24	3.716,96		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
18.81	Projeto com lâmpada de vapor metálica 250w	und	1,00	929,24	929,24		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
18.82	Arandeias de sobrecofres com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	und	16,00	104,30	1.668,80		-	-	16,00	0,00%	-	-	-
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>				<b>1.784,70</b>						<b>0,00</b>	<b>1.784,70</b>	<b>1.784,70</b>
<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>													
19.1	Tubo PVC Solvêvel Ø 25mm, inclusive conexões	m	149,00	3,86	575,14		149,00	149,00	-	100,00%	-	575,14	575,14
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	und	37,00	3,34	123,58		37,00	37,00	-	100,00%	-	123,58	123,58
19.3	Joelho 90 solvêvel - 25mm, fornecimento e instalação	und	14,00	5,64	78,96		14,00	14,00	-	100,00%	-	78,96	78,96
19.4	Caixa de areia Ø60x60cm em alvenaria - execução	und	7,00	143,86	1.007,02		7,00	7,00	-	100,00%	-	1.007,02	1.007,02
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA</b>				<b>139.222,97</b>						<b>788,75</b>	<b>138.434,22</b>	<b>139.222,97</b>
<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>													
20.1	Patch Panel 19" - 24 portas, categoria 6	und	2,00	865,11	1.730,22		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.730,22	1.730,22
20.2	Patch Panel 19" - 48 portas, categoria 7	und	2,00	1.696,49	3.392,98		2,00	2,00	-	100,00%	-	3.392,98	3.392,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)						
EMPRESA EXECUTORA:  WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº. 36		CONTRATO: 1.811.634,40								
		CNPJ: 02.364.382/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE		ADITIVO: 324.759,36								
OBRA: CRECHE-PROFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.		DATA:		quarta-feira, 13 de março de 2014		REALISTE / REEQUILIBRIO: 819.365,98								
		PERÍODO:		16/01/2014 A 31/01/2014		REALISTE: 77.128,02								
						TOTAL: 3.032.887,76								
						MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.995.353,58								
						SALDO: 37.534,18								
						VALOR DA MEDIÇÃO: 93.229,48								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)					
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
20.3	Switch de 24 portas	und	1,00	9.013,90	9.013,90		1,00	1,00	-	100,00%		9.013,90	9.013,90	
20.4	Switch de 48 portas	und	2,00	16.279,20	32.558,40		2,00	2,00	-	100,00%		32.558,40	32.558,40	
20.5	bloco 110 cera rad. 19" 100 pares	und	18,00	757,56	13.636,08		18,00	18,00	-	100,00%		13.636,08	13.636,08	
20.6	Guia de cabos simples	und	2,00	40,53	81,06		2,00	2,00	-	100,00%		81,06	81,06	
20.7	Guia de cabos vertical, fechado	und	1,00	40,53	40,53		1,00	1,00	-	100,00%		40,53	40,53	
20.8	Guia de cabos vertical	und	2,00	40,53	81,06		2,00	2,00	-	100,00%		81,06	81,06	
20.9	Guia de cabos superior, fechado	und	1,00	40,53	40,53		1,00	1,00	-	100,00%		40,53	40,53	
20.10	Perfil de montagem	und	1,00	71,13	71,13		1,00	1,00	-	100,00%		71,13	71,13	
20.11	Anel organizador de cabos	und	2,00	2,44	4,88		2,00	2,00	-	100,00%		4,88	4,88	
20.12	Bandeia deslocamento perfurado	und	2,00	327,74	655,48		2,00	2,00	-	100,00%		655,48	655,48	
20.13	Kit pes niveladores	und	2,00	99,74	199,48		2,00	2,00	-	100,00%		199,48	199,48	
<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>														
20.14	Cabo UTP CATEGORIA 5e	m	144,00	13,01	1.873,44		144,00	144,00	-	100,00%		1.873,44	1.873,44	
20.15	Cabo UTP -6 (24wc)	m	3.191,30	11,79	37.625,43		3.191,30	3.191,30	-	100,00%		37.625,43	37.625,43	
20.16	Cabo coaxial	m	450,00	12,18	5.481,00		450,00	450,00	-	100,00%		5.481,00	5.481,00	
<b>CABOS DE CONEXÃO</b>														
20.16	Cabos de conexão - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	und	100,00	65,18	6.518,00		100,00	100,00	-	100,00%		6.518,00	6.518,00	
20.17	Plaque UTP IDC - 4 pares	und	96,00	189,61	18.202,56		96,00	96,00	-	100,00%		18.202,56	18.202,56	
<b>TOMADAS</b>														
20.18	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 -	und	72,00	4,49	323,28		72,00	72,00	-	100,00%		323,28	323,28	
20.19	Placa 2x4" 1 modulo RJ45	und	26,00	10,68	277,88		26,00	26,00	-	100,00%		277,88	277,88	
20.20	Placa 2x4" 2 modulo RJ45	und		7,28	0,00		-	-	-	100,00%		-	-	
20.21	Conector de tv tipo F (coaxial)	und	16,00	6,29	100,64		16,00	16,00	-	100,00%		100,64	100,64	
20.22	Placa 2x4" para tv sat	und	16,00	10,68	170,88		16,00	16,00	-	100,00%		170,88	170,88	
20.23	Central FAX 50/300	und	1,00	38,46	38,46	1,00	-	1,00	-	100,00%	38,46	-	38,46	
<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>														
20.24	Caixa de passagem em alvenaria 30x20x12 com tampa de ferro fundido	und	7,00	194,28	1.359,96		7,00	7,00	-	100,00%		1.359,96	1.359,96	
20.25	Caixa de passagem PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	48,00	9,46	454,08		48,00	48,00	-	100,00%		454,08	454,08	
<b>ELETRONUTO E ACESSÓRIOS</b>														
20.26	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	14,70	10,29	151,26		14,70	14,70	-	100,00%		151,26	151,26	
20.27	A Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	77,35	8,10	626,54		77,35	77,35	-	100,00%		626,54	626,54	
	B Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões - realiste	m	77,35	9,15	707,75	77,35	-	77,35	-	100,00%	707,75	-	707,75	
20.28	A Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões	m	2,65	14,21	37,66		2,65	2,65	-	100,00%		37,66	37,66	
	B Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões - realiste	m	2,65	16,05	42,53	2,65	-	2,65	-	100,00%	42,53	-	42,53	
20.29	Eletroduto ferro galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	5,80	39,71	230,32		5,80	5,80	-	100,00%		230,32	230,32	
20.30	Eletroduto ferro galvanizado, Ø 2 1/2", fornecimento e instalação	m	22,00	103,95	2.286,90		22,00	22,00	-	100,00%		2.286,90	2.286,90	
20.31	Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	1,00	25,11	25,11		1,00	1,00	-	100,00%		25,11	25,11	
20.32	Luva aço 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	6,00	81,24	487,44		6,00	6,00	-	100,00%		487,44	487,44	
20.33	Bateria de contampna 100x 100mm, inclusive conexões	m	-	8,28	0,00		-	-	-	100,00%		-	-	
20.34	Bateria de contampna 100x 50mm, inclusive conexões	m	61,35	11,35	696,32		61,35	61,35	-	100,00%		696,32	696,32	
20.35	Bateria de contampna 50x 50mm, inclusive conexões	m	-	4,02	0,00		-	-	-	100,00%		-	-	
20.36	Bateria de contampna 75x 50mm, inclusive conexões	m	-	5,40	0,00		-	-	-	100,00%		-	-	
<b>21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>														
21.1	Colô de centro em aço inox de 1200x400x600	und	1,00	1.731,19	1.731,19		1,00	1,00	-	100,00%		1.731,19	1.731,19	
21.2	Duto de fixação 100x ø,80mm	m	5,00	871,89	4.359,45		5,00	5,00	-	100,00%		4.359,45	4.359,45	
21.3	Chapeu em alumínio	und	2,00	775,56	1.551,12		2,00	2,00	-	100,00%		1.551,12	1.551,12	
<b>22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)</b>														
				27.294,96							305,48		25.733,92	26.039,40
22.1	Para-raios franjido em aço inox portas em haste de 3 m x 1 1/2" iso smoles	m	3,00	75,55	226,65		-	-	3,00	0,00%		-	-	
22.2	Verghão CA-25# 10 MM	und	42,00	6,95	291,90		42,00	42,00	-	100,00%		291,90	291,90	
22.3	Conector mini-par em bronze estanhado t6-583	und	12,00	8,81	105,72		12,00	12,00	-	100,00%		105,72	105,72	
22.4	Parafuso fendê em aço inox 4,2x20mm e borla de nylon	cj	24,00	0,35	8,40		24,00	24,00	-	100,00%		8,40	8,40	
22.5	Presilha em latão	und	24,00	6,38	153,12		24,00	24,00	-	100,00%		153,12	153,12	
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barmamento, espessura 6mm	und	1,00	305,48	305,48	1,00	-	1,00	-	100,00%	305,48	-	305,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO							VALORES (R\$)				
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº. 36		CONTRATO:		1.811.634,40					
						ADITIVO:		324.759,36					
W.M. CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 02.364.380/0001-13		PAR 11681/2014/FINDE		DATA:		REALISTE / REEQUILIBRO		819.365,98			
						quarta-feira, 13 de março de 2024		REALISTE		77.128,02			
OBRA: CRECHE PROFUNDA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.						TOTAL:		3.032.887,76		2.995.353,58			
						PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADO:		2.995.353,58			
						16/01/2024 A 31/01/2024		SALDO:		37.534,18			
										VALOR DA MEDIÇÃO:		93.229,48	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)		
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
22.7	Escavação de vala para aterramento		39,00	4,00	156,00		39,00	39,00	-	100,00%	-	156,00	156,00
22.8	Haste tipo cocopnevel 5/8" x 2,40m.	und	12,00	48,35	580,20		12,00	12,00	-	100,00%	-	580,20	580,20
22.9	Cordalha de cobre nu 16 mm2	m	5,00	28,85	144,25		5,00	5,00	-	100,00%	-	144,25	144,25
22.10	Cordalha de cobre nu 35 mm2	m	330,00	37,20	12.276,00		330,00	330,00	-	100,00%	-	12.276,00	12.276,00
22.11	Cordalha de cobre nu 50 mm2	m	260,00	45,38	11.798,80		260,00	260,00	-	100,00%	-	11.798,80	11.798,80
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 1/2", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	und	4,00	257,24	1.028,96		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo 50mm²	und	12,00	16,29	219,48		12,00	12,00	-	100,00%	-	219,48	219,48
<b>23</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>121.309,54</b>						<b>16.696,61</b>	<b>104.613,53</b>	<b>121.309,54</b>
23.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 3m2 x 4m x 1/2")	und	1,00	4.617,78	4.617,78	1,00	-	1,00	-	100,00%	4.617,78	-	4.617,78
23.2	A Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	24,27	486,03	11.793,52		24,27	24,27	-	100,00%	-	11.793,52	11.793,52
23.2	B Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto - reajuste	m²	24,27	548,78	13.318,89		24,27	24,27	-	100,00%	-	13.318,89	13.318,89
23.3	A Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	15,00	486,03	7.290,45		15,00	15,00	-	100,00%	-	7.290,45	7.290,45
23.3	B Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto - reajuste	m²	41,26	548,78	22.642,66		41,26	41,26	-	100,00%	-	22.642,66	22.642,66
23.4	Prateleira e escaninhos em MDF	m²	61,37	196,81	12.078,23	61,37	-	61,37	-	100,00%	12.078,23	-	12.078,23
23.5	Bancos de concreto	m²	7,22	189,16	1.365,74		7,22	7,22	-	100,00%	-	1.365,74	1.365,74
23.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	339,05	1.227,36		3,62	3,62	-	100,00%	-	1.227,36	1.227,36
23.7	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pincadeira CADA DÁGUA - 30.000L	m	130,75	94,55	12.362,41		130,75	130,75	-	100,00%	-	12.362,41	12.362,41
23.8	Reservatório em anéis pré-moldados de concreto, ø 2,50m, cap. 20m³, com sistema de 10m³, h=11,43m, escada metálica com guarda corpo e abrigo pl motobomba com portão de ferro - fuste 6,70m	und	1,00	34.612,50	34.612,50		1,00	1,00	-	100,00%	-	34.612,50	34.612,50
<b>24</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>4.953,55</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	3,28	4.953,55		-	-	1.510,23	0,00%	-	-	-
<b>TOTAL GERAL R\$</b>					<b>3.032.887,76</b>					<b>3,07%</b>	<b>93.229,48</b>	<b>2.902.124,10</b>	<b>2.995.353,58</b>

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior  
 Fernando Antonio Serra  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 21.1878363-9

**W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.**

José Márcio Pinheiro Landim  
 Sócio-Administrador

Rafael Pinheiro Figueredo  
 Rafael Pinheiro Figueredo  
 Engº Civil-CREA-CE48750  
 W.M. CONSTRUÇÕES LTDA

## WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 13 DE MARÇO DE 2024



### MEMÓRIA DE CÁLCULO - 36ª MEDIÇÃO

<b>6</b>	<b>ESQUADRAS</b>		
6.38	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação		
	QUANTIDADE	145,20	m <sup>2</sup>
	Percentual executado no período =	15,52%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>22,54</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
10.8	Piso portatil de alerta, borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (firnecimento e assentamento)		
	QUANTIDADE	27,90	m <sup>2</sup>
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>27,90</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
10.9	Piso portatil de alerta, borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (firnecimento e assentamento)		
	QUANTIDADE	22,68	m <sup>2</sup>
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>22,68</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
15.17	Barra de apoio de canto para lavatorio, aço inox polido, celite ou equivalente		
	QUANTIDADE	4,00	und
	Percentual executado no período =	25,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00</b>	<b>und</b>
15.18	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "I", linha conforto codigo 2335.I.ESC		
	QUANTIDADE	1,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00</b>	<b>und</b>
15.21	torneira eletrica loreneasy, LORENZETI ou equivalente		
	QUANTIDADE	2,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>2,00</b>	<b>und</b>
15.22	Torneira eletrica fortil maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente		
	QUANTIDADE	4,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>4,00</b>	<b>und</b>
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL</b>		
16.2	Tela metalica para ventilação com requadro em aluminio		
	QUANTIDADE	0,16	m <sup>2</sup>
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>0,16</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
16.6	Valvula esfera O 3/4" NPT 300		
	QUANTIDADE	4,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	

1/5

## WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 13 DE MARÇO DE 2024



	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>4,00 und</b>
16.8	Niple 3/4" NPT 300 QUANTIDADE	6,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>6,00 und</b>
16.9	Niple 1/2" NPT 300 QUANTIDADE	4,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>4,00 und</b>
16.10	Niple 1/4" NPT 300 QUANTIDADE	4,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>4,00 und</b>
16.16	Regulador 1º estagio com manometro QUANTIDADE	1,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00 und</b>
16.17	Manometro NPT 1/4", 0,a 300 psi QUANTIDADE	1,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00 und</b>
16.18	Mangueira flexivel QUANTIDADE	2,00 m
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>2,00 m</b>
16.20	Regulador 2º estagio com registro QUANTIDADE	2,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>2,00 und</b>
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) proibido fumar QUANTIDADE	1,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00 und</b>
16.22	Placa de sinalização em pvc cod 5 - (348x348) perigo inflamavel QUANTIDADE	1,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00 und</b>
<b>17</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO</b>	
17.9	Adaptador stoz - roscas internas 2 1/2" QUANTIDADE	3,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>3,00 und</b>

M

BA

## WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 13 DE MARÇO DE 2024



17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"		
	QUANTIDADE	3,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>3,00</b>	<b>und</b>
17.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO		
	QUANTIDADE	4,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>4,00</b>	<b>und</b>
17.22	Marcação no piso - 1x 1m para extintor		
	QUANTIDADE	8,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>8,00</b>	<b>und</b>
17.23	Marcação no piso - 1x 1m para extintor		
	QUANTIDADE	3,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>3,00</b>	<b>und</b>
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V</b>		
18.32	Eletroduto ferro galvanizado DN 25mm (1") inclusive conexões		
	QUANTIDADE	45,70	m
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>45,70</b>	<b>m</b>
18.33	Eletroduto ferro galvanizado DN 32mm (1 1/4") inclusive conexões		
	QUANTIDADE	29,50	m
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>29,50</b>	<b>m</b>
18.34	Eletroduto ferro galvanizado DN 20mm (3/4") inclusive conexões		
	QUANTIDADE	80,60	m
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>80,60</b>	<b>m</b>
18.35	Eletroduto ferro galvanizado DN 100mm (4") inclusive conexões		
	QUANTIDADE	14,70	m
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>14,70</b>	<b>m</b>
18.36	Canelas PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação		
	QUANTIDADE	2,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>2,00</b>	<b>und</b>
18.37	Canelas PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação		
	QUANTIDADE	3,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>3,00</b>	<b>und</b>
18.46	#25 mm <sup>2</sup>		

M

PA

## WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 13 DE MARÇO DE 2024



	QUANTIDADE	52,10	m
	Percentual executado no período =	50,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>26,05</b>	<b>m</b>
18.47	#35 mm <sup>2</sup>		
	QUANTIDADE	156,30	m
	Percentual executado no período =	50,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>78,15</b>	<b>m</b>
18.49	#70 mm <sup>2</sup>		
	QUANTIDADE	52,00	m
	Percentual executado no período =	50,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>26,00</b>	<b>m</b>
18.50	#95 mm <sup>2</sup>		
	QUANTIDADE	153,90	m
	Percentual executado no período =	8,45%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>13,00</b>	<b>m</b>
18.73	Tomada universal circular. 2p+t 10A cor branca completa		
	QUANTIDADE	178,00	und
	Percentual executado no período =	43,82%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>78,00</b>	<b>und</b>
18.74	Tomada universal circular. 2p+t 20A cor branca completa		
	QUANTIDADE	18,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>18,00</b>	<b>und</b>
18.75	Interruptor simples 10A completa		
	QUANTIDADE	56,00	und
	Percentual executado no período =	46,43%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>26,00</b>	<b>und</b>
18.76	Luminaria 2x36w completa		
	QUANTIDADE	111,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>111,00</b>	<b>und</b>
18.77	Luminaria 2x14w completa		
	QUANTIDADE	17,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>17,00</b>	<b>und</b>
18.78	Luminaria 2x36 com alaetas completa		
	QUANTIDADE	40,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>40,00</b>	<b>und</b>
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA</b>		
20.23	Central PABX 50/300		
	QUANTIDADE	1,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	

(1)

(1)

## WM - CONSTRUÇÕES LTDA

**OBRA:** CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

**EMPRESA EXECUTORA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA.


**CNPJ:** 02.364.381/0001-13

**DATA:** 13 DE MARÇO DE 2024



	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00 und</b>
20.27b	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões - reajuste	
	QUANTIDADE	77,35 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>77,35 und</b>
20.28b	Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões - reajuste	
	QUANTIDADE	2,65 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>2,65 und</b>
<b>22</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)</b>	
22.6	Caixa de equalização de potencias 200x200mm em aço com barramento, espessura 6mm	
	QUANTIDADE	1,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00 und</b>
<b>23</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	
23.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 3mx2"+4mx1 1/2")	
	QUANTIDADE	1,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>1,00 und</b>
23.4	Prateleira e escaninhos em mdf	
	QUANTIDADE	61,37 m2
	Percentual executado no período =	100,00%
	<b>Quantidade da medição =</b>	<b>61,37 m2</b>

  
**RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO**  
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
**Engenheiro Civil**  
RNP: 21.1878363-9



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**  
406

**DATA APROVAÇÃO**  
02/12/2015

**PROCESSO**      **VALIDADE**  
31/12/2024

<b>ENDEREÇO</b> RUA SÁTIRO COSTA, Nº 265		<b>COORDENADAS</b> LONGITUDE: LATITUDE:		<b>BAIRRO</b> JOÃO PAULO II	
<b>NATUREZA DA OBRA</b> CONSTRUÇÃO	<b>USO</b> INSTITUCIONAL	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> ISENTO	
<b>DADOS DA OBRA</b>					
<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66			<b>CNPJ / CPF</b> 07443708000166		<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO
<b>PROJETO (AUTOR)</b> YUKIO DIÓGENES BEZERRA CPF:			<b>CREA/CAU</b> RNP 0618515844	<b>ART</b> CE 20220999891	
<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> RAFAEL PINHEIRO DE FIGUEIRÊDO CPF:			<b>CREA/CAU</b> RNP 0610465660	<b>ART</b> CE 20231163871	
<b>COD. OBRA</b> 406	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 2.400,00 m²	<b>ÁREA CONSTRUÍDA</b> 2376,36 m²	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 %	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00
<b>LOTEAMENTO</b>			<b>QUADRA(S)</b>	<b>LOTE(S)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 000000000
<b>VALOR DA OBRA</b> 1.811.634,40			<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 02/12/2015		
<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /		<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /		<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 15/08/2023	
<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b> CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PPV-INFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.					
<b>IMPRESSÃO</b> JAGUARIBE, 23 DE Janeiro DE 2024  <b>CÓD DE VALIDAÇÃO: 0003E1235X8120000406</b>					
 <b>Rafael Gomes Diogenes</b> Secretaria de Infra-estrutura, Licença e Urbanismo PONTALIA, 27/12/2015 09:15:05 35					



Scanet para validar este documento

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20241364809

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20160014859

1. Responsável Técnico

**RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**  
RNP: 0610465680  
Registro: 487580 CE

Empresa contratada: **WM CONSTRUÇÕES LTDA**  
Registro: 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA  
CNPJ/CNPJ: 07.443.708/0001-66  
Nº: SN  
Cidade: Jaguaribe  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **CE**  
CEP: **63475000**

Contrato: 06.08.01/2015  
Valor: R\$ 1.811.834,40  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Agência Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
Celebrado em: 02/12/2015

3. Dados da Obra/Serviço

**SEM DEFINIÇÃO**  
Nº: -  
Cidade: Jaguaribe  
Bairro: **JOÃO PAULO II**  
UF: **CE**  
CEP: **63475000**  
Data de início: 02/12/2015  
Previsão de término: 15/08/2024  
Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Finalidade: **Escolar**  
Código: **Não Especificado**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA	1,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a Complementação da Prestação dos Serviços de Construção de uma Creche Proinfância (Tipo 1), no Bairro João Paulo II Aditivo nº 01. REF AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

**SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima  
**RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 816.524.073-01**

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea:

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 15/02/2024

FCU - 2024 - QUALIFICANTE BDI/R003  
Secretaria Municipal de Educação  
POPI/PAIA - Nº 209/2021  
CPF: 713.327.053-919

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sites.com.br/public/>, com a chave: DD04C  
Impresso em: 15/02/2024 às 16:05:02 por: ip: 177.22.38.97



www.crea-ce.org.br | tele: 085-3452-5090  
Tel: (85) 3452-5090 | Fax: (85) 3453-6804







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO À  
CE20220918601

#### 1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0010475016-CE

#### 2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Barro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

#### 3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Barro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 05/01/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.888942, -38.623393

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

#### 4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Medida
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE FINIÇÃO > #11.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	m³
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #11.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	l/m
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #11.4.2 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	m
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	l/m
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	m
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VACUO > #11.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GAS	8,00	m
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #11.6.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	8,00	l/m
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA - DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	m³
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARÇAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	m³
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	m³
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	m³
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #11.2.6 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <http://portal.crea-ce.org.br/validacao/validar-art>  
Impresso em: 16/01/2024 às 11:56:06 por: ar 177.124.10.21



www.crea-ce.org.br

felisiochaves@crea-ce.org.br

Tel: (85) 4493-6800

Fax: (85) 3493-5894

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
<b>18 - Fiscalização</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

#### 6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26



www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

PROF. ELDER CYNALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26



www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804





**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO  
DA ATIVA**

**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06.08.01/2015**

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 13 de Março de 2024.

  
WM CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 02.364.381/0001-13  
José Marcio Pinheiro Landim  
Representante Legal  
CPF 387.224.703-44



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ: 02.364.381/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:01:18 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2024.

Código de controle da certidão: **BC31.7F65.C7D6.AD68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202401911302

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 069991650
<b>CNPJ / CPF:</b> 02364381000113
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2024 ÀS 14:47:07  
VÁLIDA ATÉ 06/04/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/47225

**CPF/CNPJ:** 02.364.381/0001-13

**Nome ou Razão Social:** WM CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS | 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

**1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 6 de Fevereiro de 2024 (14:38:41)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 06/05/2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.364.381/0001-13  
**Razão Social:** W M CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/03/2024 a 07/04/2024

**Certificação Número:** 2024030900385395415885

Informação obtida em 26/03/2024 14:53:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Certidão nº: 608459/2024  
Expedição: 03/01/2024, às 13:05:34  
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA  
CNPJ: 02.364.381/0001-13  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2024

Página: 4/21  
Emissão: 26/01/2024  
Horas: 15:01:36

### EXTRATO MENSAL

Serviço: 55 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE - CNO: 51235506074 - Outro CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFAICI, 1, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 3055 FRANCISCO FLAVIO DUARTE Situação: Trabalhando CPF: 030.585.533-66 Adm: 10/03/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 55 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 237 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.436,59 P 998 I.N.S.S. 7,53 108,11 D

ND: 0 Proventos: 1.436,59 Descontos: 108,11 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,48  
NF: 0 Base INSS: 1.436,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,59 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 908,59

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### INSS

Salário contribuição empregados: 1.436,59  
Salário contribuição contribuintes: 0,00  
Excedente: 0,00  
Base total: 1.436,59  
Segurados: 108,11  
Empresa: 0,00  
RAT: 43,09  
Contribuintes: 0,00  
Terceiros (5,8%): 83,32  
Total INSS: 234,52

### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 1.436,59  
Valor do FGTS: 114,92  
Base do FGTS Aprendiz: 0,00  
Valor do FGTS Aprendiz: 0,00  
Base FGTS - GRRF: 0,00  
Valor FGTS - GRRF: 0,00  
Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00  
Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00  
Base PIS: 0,00  
Valor PIS: 0,00  
Base ISS: 0,00  
Valor ISS: 0,00

### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 908,59  
Valor IRRF Mensal: 0,00  
Base IRRF Férias: 0,00  
Valor IRRF Férias: 0,00  
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00  
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00  
Base IRRF Exterior: 0,00  
Valor IRRF Exterior: 0,00  
Base IRRF 13º Salário: 0,00  
Valor IRRF 13º Salário: 0,00  
Valor Total do IRRF: 0,00  
IRRF Aluguéis: 0,00  
IRRF contribuintes: 0,00

### Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: 59 - BAIXA GRANDE CAATINGA - BAIXIO - CNO: 512400162471 - Outro ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS, ZONA RURAL, CEP 63.320-000

Empr.: 3047 CARLOS BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 051.660.963-71 Adm: 04/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 59 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 108 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.000,00 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,82 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 158,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,18  
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.472,00

Data de pagamento : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2024 - 00:28:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.162,43	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.772,99	14-ENCARGOS 817,75	15-TOTAL A RECOLHER 8.590,74
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2024\*\*

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2024 - 00:28:05


01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.162,43	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.772,99	14-ENCARGOS 817,75	15-TOTAL A RECOLHER 8.590,74
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2024\*\*

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314495170041  
13/03/2024 14:51:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.34  
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA  
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 113.232-6  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000085-3 90740180240-4 30768520380-4 23643810001-1
Data do pagamento	07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	02364381/0001-13
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	8.590,74
Valor Total	8.590,74

-----

DOCUMENTO: 030724  
AUTENTICACAO SISBB: 7.756.878.714.339.68A

<b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b>	
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>	
<b>Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb</b>	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.364.381/0001-13
<b>Nome</b>	WM CONSTRUÇOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	01/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	63956284 / Reinf CP 24381947994 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 9.462,21	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 25.892,14	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 5.855,98	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 2.896,87	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 44.107,20	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
<b>CPF</b>	387.224.703-44
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/02/2024 20:04:40
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000207672541
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	21.515.550/0001-13

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	WM CONSTRUCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	02.364.381/0001-13
<b>Período de Apuração</b>	01/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000207672541
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/02/2024 20:04:40	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	63956284 / Reinf CP 24381947994 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	8.637,65	8.637,65	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	824,56	824,56	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	1.148,96	1.148,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	239,48	239,48	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	34,46	34,46	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	86,17	86,17	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	57,44	57,44	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	11,48	11,48	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	143,62	143,62	0,00

**Grupo: IRRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	2.896,87	2.896,87	0,00

Obra: 90.012.45668/75

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	532,84	532,84	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	2.556,36	2.556,36	0,00

Obra: 90.012.45668/75

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	319,54	319,54	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,56	25,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	127,81	127,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	191,72	191,72	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,69	76,69	0,00

Obra: 90.011.15078/74

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	90,15	90,15	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	432,52	432,52	0,00

Obra: 90.011.15078/74

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,97	12,97	0,00

Obra: 90.010.64486/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.374,16	1.374,16	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	6.592,60	6.592,60	0,00

Obra: 90.010.64486/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	824,07	824,07	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	65,92	65,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	329,63	329,63	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	494,44	494,44	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	197,77	197,77	0,00

Obra: 90.002.54460/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	131,42	131,42	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	630,52	630,52	0,00

Obra: 90.002.54460/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.002.21553/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	240,19	240,19	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.152,35	1.152,35	0,00

Obra: 90.002.21553/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.11285/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	130,41	130,41	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	625,68	625,68	0,00

<b>Obra: 90.002.11285/78</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	18,77	18,77	0,00

<b>Obra: 90.002.11216/73</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	261,84	261,84	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.256,20	1.256,20	0,00

<b>Obra: 90.002.11216/73</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	37,68	37,68	0,00

<b>Obra: 90.001.48542/76</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	363,07	363,07	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.792,95	1.792,95	0,00

<b>Obra: 90.001.48542/76</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	134,47	134,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	53,78	53,78	0,00

<b>Obra: 51.246.15952/77</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	346,40	346,40	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.661,87	1.661,87	0,00

<b>Obra: 51.246.15952/77</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	207,73	207,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	16,61	16,61	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	83,09	83,09	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	124,64	124,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	49,85	49,85	0,00



Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	130,41	130,41	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	625,68	625,68	0,00

Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	18,77	18,77	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	90,15	90,15	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	432,52	432,52	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,97	12,97	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	148,30	148,30	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	711,52	711,52	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	88,94	88,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	7,11	7,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	35,57	35,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	53,36	53,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	21,34	21,34	0,00

Obra: 51.226.32327/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	59,88	59,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	287,32	287,32	0,00

Obra: 51.226.32327/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	59,88	59,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	287,31	287,31	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/03/2024 00:30:02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CRwnaP231yt00009.SFP é:

b04ce2c3-47dc-4112-b72a-7cd6f46fc093

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113

Inscrição do Transmissor: 21515550000113

Responsável: PA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 62430467372

Competência: 01/2024

NRA: CRwnaP231yt00009

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: FRANCISCA TERESA ARA

Telefone: 008596485706

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG : 0002

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

Nº ARQUIVO: CRwnaP231yt0000-9  
EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE Nº CONTROLE: BKM6GvOGXLT0000-0 INSCRIÇÃO: 512355506074  
-----  
LOGRADOURO: Rua CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085-34970740 CNAE: 4120400  
-----  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	21,54	0,00	0,00	0,00	21,54
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	419,96	0,00	0,00	0,00	419,96
-----					
OUTRAS ENTIDADES	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32
-----					
TOTAL A RECOLHER	503,28	0,00	0,00	0,00	503,28

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 00:28:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 0% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

41

REMUNERAÇÃO

97.162,43

DEPÓSITO

7.772,99

ENCARGOS FGTS

817,75

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.590,74

VALIDADE DO CÁLCULO: 07/03/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° ARQUIVO: CRwnaP231yt0000-9  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024  
N° CONTROLE: EKwjjj07kjZ0000-3

TOMADOR/OBRA : CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 512355506074 N° CONTROLE: BkM6GvOGxtT0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCI 1 JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59	REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	114,92
		ENCARGOS FGTS	12,10
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59	REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	111,11	DEPÓSITO	114,92
VAL DEVIDO PREV SOC	503,28	ENCARGOS FGTS	12,10
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG : 0004/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 51235506074

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO FLAVIO DUARTE	1.436,59	0,00	168.35593.40-8 0,00	10/03/2023	01	114,92	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.436,59 0,00 0,00 111,11 114,92 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG : 0005/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000853 907401802404 307685203804 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: BkM6GvOGxtT0000-0

N° ARQUIVO: CRwnaP231yt0000-9  
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
INSCRIÇÃO: 512355506074

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.436,59	0,00	1.436,59	0,00
TOTAIS:	1	1.436,59	0,00	1.436,59	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024  
HORA: 00:28:05  
PÁG : 0006/0047

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUÇOES LTDA  
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE Nº DE CONTROLE: BkMGvOGxtT0000-0

Nº ARQUIVO: CRwnaP231yt0000-9  
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
INSCRIÇÃO: 512355506074

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	503.28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	111.11
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024


**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE CHAPA PERFURADA NA FACHADA



INSTALAÇÃO DE CHAPA PERFURADA NA FACHADA

  
Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015


**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024


**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE MASTROS

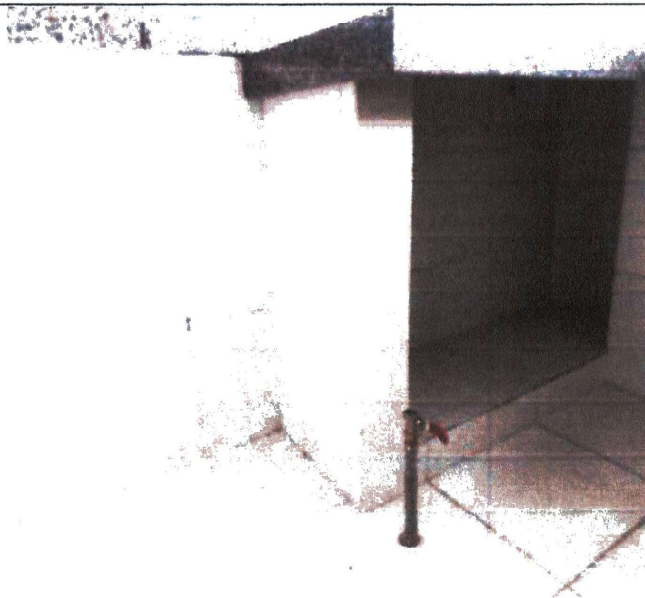

INSTALAÇÃO DE GÁS

  
Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

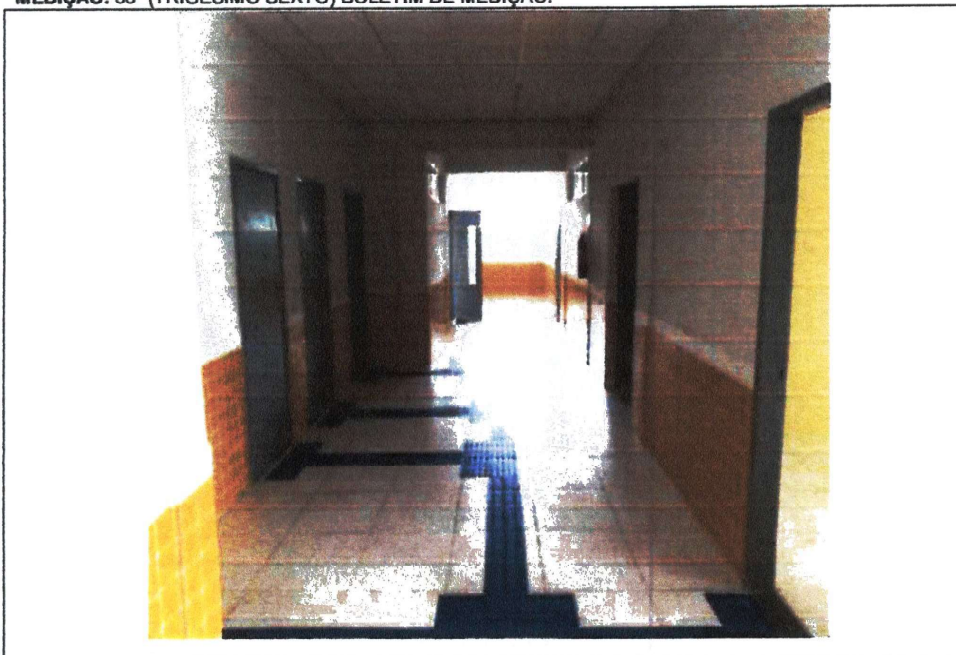

INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL



INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS

  
Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

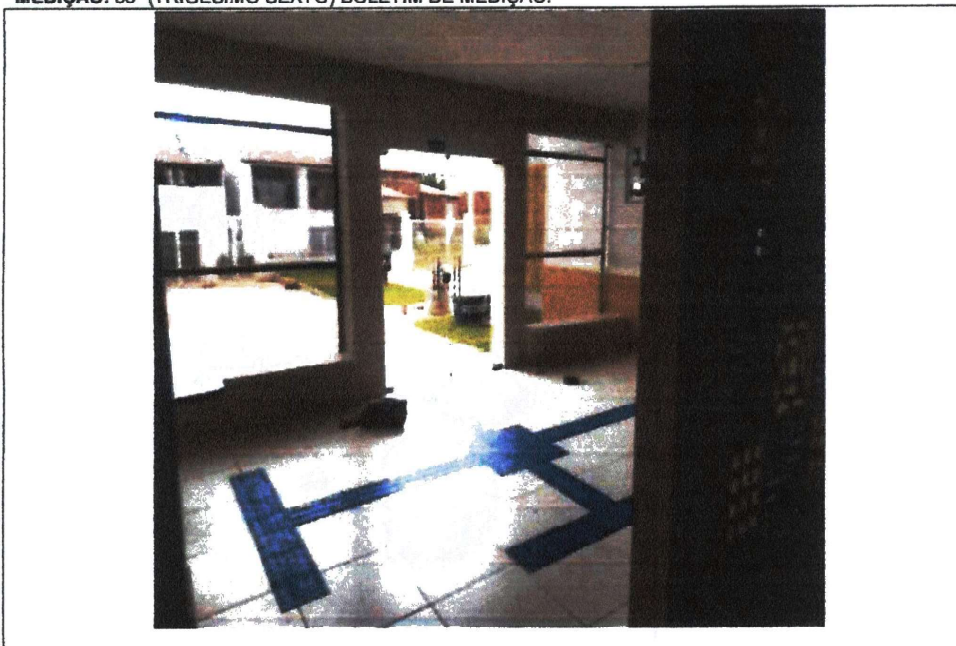


INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL




INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E PISO TÁTIL

  
Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BARRIO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE  
CONTRATO: 03.03.01/2015  
CONTRATADA: VMI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.894.381/0001-13  
PERÍODO: 16/01/2024 A 31/01/2024  
INDICAÇÃO: 26ª (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS

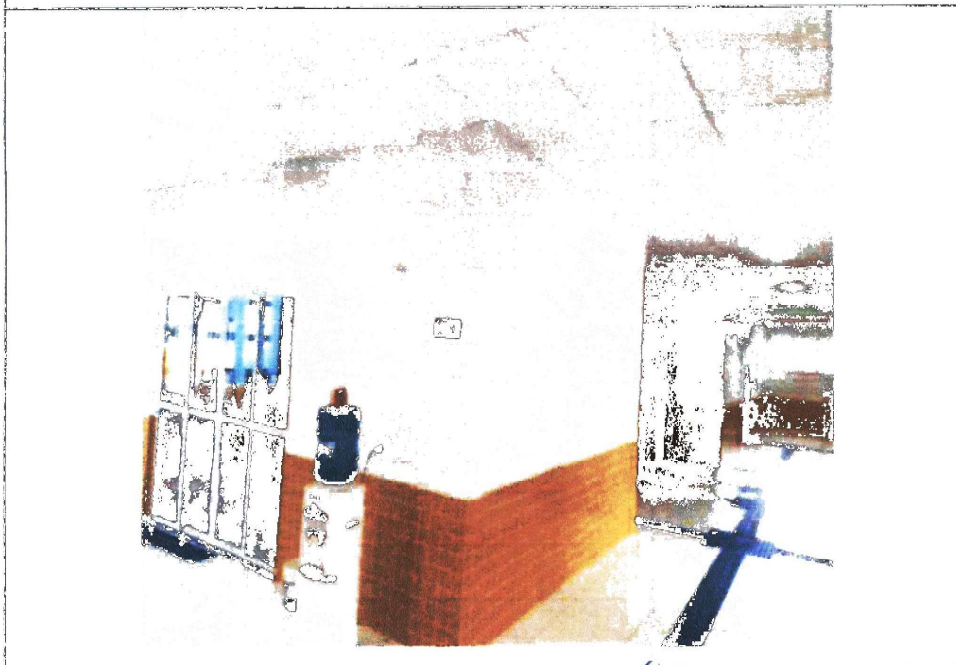

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS

Rafael Falcão Figueiredo  
Engº Civil - CREA-CE 07523  
VMI Construções Ltda

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

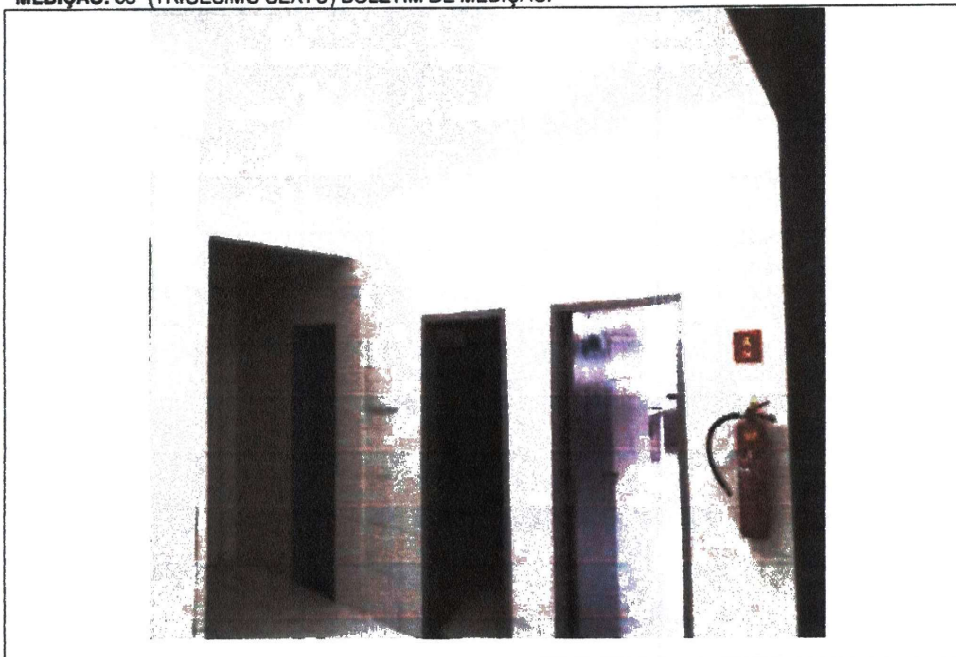

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTINTORES



INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS

*(Handwritten mark)*

*BA*  
Rafael Puberto Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda

*(Handwritten signature)*

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE GÁS



INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS

M

Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda

Q



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

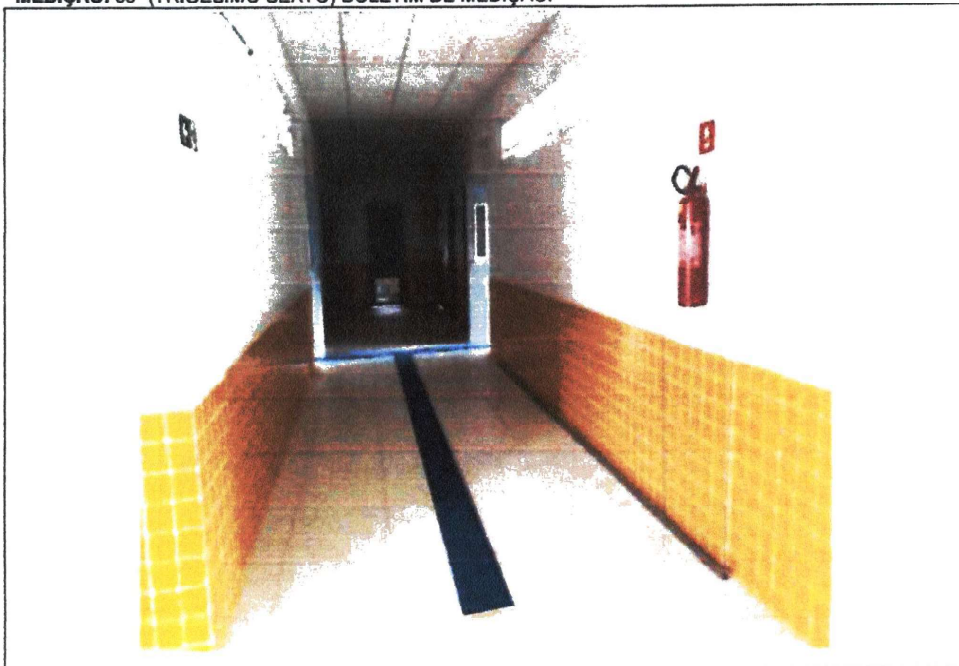


INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL



INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

1)

  
Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE GÁS



ESQUADRIAS DA CASA DE GÁS

RS

  
Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE-48758  
WM Construções Ltda



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO



INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE 48758  
WM Construções Ltda

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

**CONTRATO:** 06.08.01/2015

**CONTRATADA:** WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

**PERÍODO:** 16/01/2024 A 31/01/2024

**MEDIÇÃO:** 36º (TRIGÉSIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



**W.M CONSTRUÇÕES LTDA.**

*José Márcio Pinheiro Landim*  
José Márcio Pinheiro Landim  
Sócio-Administrador

*Rafael Pinheiro Figuerêdo*  
Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil-CREA-CE-48758  
WM CONSTRUÇÕES LTDA

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 251878363-9

Rafael Pinheiro Figuerêdo  
Engº Civil - CREA-CE-48758  
WM Construções Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA















**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 36ª MEDIÇÃO**







OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO I		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II		CÓDIGO DA OBRA:	
DATA DA VISITA: 13/03/24	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR		
Nº DO CONTRATO: 06.08.01/2015	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE	INÍCIO DA OBRA: 01/04/2016	PREVISÃO DE TERMINO: 15/08/2024	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SUPERESTRUTURA	100,00%		
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00%		
ESQUADRAS	99,63%	PREVISTO:	
SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	98,76%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	100,00%		
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	99,47%		
PINTURA	100,00%		
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00%		
DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	100,00%		
INSTALAÇÃO SANITARIA	87,95%		
LOUÇAS E METAIS	100,00%		
INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	100,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	100,00%		
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V	90,38%		
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	100,00%		
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	95,40%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUIE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 13 de Março de 2024.			

*Rafael Pinheiro Figueiredo*  
RAFAEL PINHEIRO FIGUEIREDO  
ENG. CIVIL RNP: 0610-46566-0







*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211874363-9







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	<b>CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.</b>		
DATA:	Terça-feira, 16 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	<b>CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.</b>		
DATA:	Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 19 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 20 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SEM ATIVIDADE			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 21 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SEM ATIVIDADE – DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	









DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 23 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b> 1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>   Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>   Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTALAÇÃO DE MASTROS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b> 1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>   Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>   Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 27 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
SEM ATIVIDADE – DESCANSO SEMANAL			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 28 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA   Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO   Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE CHAPA PERFURADA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA   Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO   Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 30 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
