

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 07.02.0001

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
05.02.0007	05/02/2024	07/02/2024	85.567,60

CREDOR

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.567,03

Total da Retenção: (R\$) 2.567,03

HISTÓRICO

REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020701	83.000,57



Emissão de comprovantes

G3360808051341421
08/02/2024 08:12:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.31
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08
VALOR: R\$ 83.000,57
DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4A.2DD.B3C.76B.DF5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 639262589
CNPJ 35.851.118/0001-08
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.701
Valor 83.000,57
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D4A2DDB3C76BDF5

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	07/02/2024 07:47:57
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	07/02/2024 08:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 4502024**Data:** 05/02/2024**Fornecedor:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME**CNPJ:** 35.851.118/0001-08**Endereço:** RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padrões Básicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 85.567,60**Histórico**

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1,00	85.567,60	85.567,60

Ordenador

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Responsável pelo preenchimento

Rensson Venícios Sene Sampaio

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000397

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/02/2024	05.02.0007	85.567,60	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETA DA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE - CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC MUN.: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
06/02/2024	85.567,60	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 15	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 06/02/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 06/02/2024	SÉRIE DA NOTA: E	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 0	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	QBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: w2ib7lptcdxq3msfvueazyo6gk		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTD. LIQ.	VAL UNIT. (R\$)	VAL LIQ. (R\$)	QTD. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	85.567,600	85.567,60	0

Jaguaribe, 6 de Fevereiro de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME **CNPJ:** 35.851.118/0001-08
Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 **Bairro:** JOÃO PAULO II
Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**
Agência: 0-0 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Conta: 0-0

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
U. Funcional: Depto. Financeiro **Dotação:** 126
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino
Proj\Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
Nº Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023
Nº Empenho: 05020007 - Global

Nº Nota Fiscal: 15
Dt. Emissão NF: 06/02/2024 **Dt. Solicitação:** 06/02/2024 **Data Expedição:**
Liquidação:
Mês Referência: 11/01/2024 A 05/02/2024
Vir. Liquidação: R\$ 85.567,60 (OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** E
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitária	Val.Total
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1	1,00	85.567,60	85.567,60

Responsável pela elaboração

 Renison Venícios Serra Simplicio

Ordenador de Despesa

 Manoel Antonio de Oliveira Barros

F.V.O de Regreiros Soares
 Controlador de Custos e Custos
 PORTARIA 177/2024
 Validação de Custos
 Técnico _____
 Data _____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.02.0007

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
05/02/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023	20.03.02/2023	4502024
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SAI DO ATUAL (R\$)
126	2.223.492,22	85.567,60	2.137.924,62

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 **C G F:** 061249394 **INSC. MUN.:** 859379 **Telefone:**

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	85.567,60	85.567,60
Total dos Itens: (R\$)					85.567,60

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05020007**, A(os) **5 de Fevereiro de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 07.02.0001

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.T. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	ORÇ
05020007	05/02/2024	GLOBAL	85.567,60	20.03.02/2023	20.03.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40 000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
07020001	85.567,60	85.567,60	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
07/02/2024	85.567,60	2.567,03	83.000,57

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.567,03
		Total da Retenção: (R\$) 2.567,03

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020701	83.000,57

Jaguaribe, 7 de Fevereiro de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



TED

G3310615520732381
06/02/2024 16:01:06

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-A FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 639262589
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.851.118/0001-08
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 83.500,57
Data transferência 06.02.2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **302797428**

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELIEZ CAVALCANTE BARROSO.

	ESTADO DO CEARA					Nota Nº		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					000000015		
	SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG					SÉRIE		
					ELETRÔNICA			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	06/02/2024	Competência	FEV/2024	Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO II							
CPF/CNPJ	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal	859379	UF	CE	Insc. Estadual		0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	SALA 1		Telefone	(88) 9990-8760
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail				
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE							
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	69202290	Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
REF. A 5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.								
DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
702 / 439910300 - Obras de alvenaria								
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	
IRRF							0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços	85.567,60	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	85.567,60		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	34.227,04		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	51.340,56		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000 %		
(-) ISS Retido	2.567,03	w2lb7lptcndxq3msfvueazyo6gk			ISS a Reter	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido	83.000,57	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	2.567,03		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
BANCO NUBANK-AG:0001/CONTA: 63926258-9/CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Impressa em: 06/02/24 07:49				Hora da emissão: 07:49:05				

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 11/01/2024 A 06/02/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 5

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL

3.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

VOLUME DE SOLO DE REATERRO = PERÍMETRO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE DA VALA

QTD
3,71

$((30,2*2)+(16,2*2))*0,1*0,4$

3,71

4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA = PERÍMETRO DAS PAREDES * LARGURA * PROFUNDIDADE

QTD
11,14

$((30,2*2)+(16,2*2))*0,3*0,4$

11,14

5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

CINTA DA MURETA = PERÍMETRO DA MURETA - VÃOS DOS PORTÕES

QTD
90,80

$(30,2*2)+(16,2*2)-(1+1)$

90,80

5.2. 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

FORMA DOS PILARETES = ALTURA DOS PILARETES * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARETES

QTD
9,28

$0,5*0,2*2*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)$

9,28

5.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm (KG)

ARMADURA DOS PILARETES = COMPRIMENTO DAS BARRAS * QUANTIDADE DE BARRAS POR PILARES * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M

QTD
114,52

$1*4*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,617$

114,52

5.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QUANTIDADE DE ESTRIBOS PILARES = COMPRIMENTO DE ESTRIBO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M

QTD
42,87

$(0,9)*(10,15)*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,154$

42,87

5.5. C0842 CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOLUME DE CONCRETO PILARES = ÁREA DOS PILARES * ALTURA * QUANTIDADE

QTD
1,86

$(0,2*0,2)*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)$

1,86

5.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

IDEM ITEM ANTERIOR

QTD
1,86

1,86


1,86


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

PROPRIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341928
RNP: 0618515844


REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 35.851.118/0001-08
RUA... 49

6.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MURETA = PERIMETRO * ALTURA $((30,2*2)+(16,2*2))*0,5$ QTD 46,40

46,40

6.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

CHAPISCO DAS MURETAS = PERIMETRO DA MURETA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES $(30,2+30,2+16,2+16,2)*0,5*2$ QTD 92,80

92,80

6.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

IDEM ITEM ANTERIOR 92,8 QTD 92,80

92,80

7.1. C1007 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

MURO DA QUADRA = COMPRIMENTO * ALTURA - VÃO DO PORTÃO 5,99 QTD 5,99

5,99

12.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

LOCAÇÃO DO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA 4,38*2,14 QTD 9,37

9,37

12.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

ESCAVAÇÃO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE $(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14)*0,3*0,4$ QTD 2,08

ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * LARGURA * PROFUNDIDADE * QUANTIDADE $(0,4*0,4*0,4)*6$ QTD 0,38

2,46

12.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

REATERRO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DE REATERRO * PROFUNDIDADE $(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14)*0,1*0,4$ QTD 0,69

0,69

12.2.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

ATERRO BANHEIRO = ÁREA INTERNA * ALTURA MÉDIA $(2,28+2,8+3,03)*0,3$ QTD 2,43

2,43

12.3.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_09/2017 (M2)

LASTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO = COMPRIMENTO * LARGURA * 0,4*0,4*4 QTD 0,64

0,64

12.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ARMADURA DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE * QUANTIDADE DE BLOCOS * KG/M $0,6*8*4*0,395$ QTD 7,58

ARMADURA DOS PILARETES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M $4*4*4*0,617$ QTD 39,48

RECIBO DE RECEBIMENTO
 FOLHA Nº 030
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 10/09/2016
 2003-49

RICARDO AZEVEDO P. PIN
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851

Yukio Diógenes E
 Eng. Civil CREA - CE
 RNP: 0618515

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
 CONTATO: (88) 9.9908-7606. E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA13@GMAIL.COM

ARMADURA DAS VIGAS/CINTAS DE AMARRAÇÃO = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * KG/M $(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*4*0,18$ 27,06

74,12

12.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD

ESTRIBO DOS PILARES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M $0,9*(4*0,15)*4*0,15$ 4 14,78

ESTRIBO DAS VIGAS/CINTAS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE VIGAS/CINTAS * KG/M $0,9*(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,2*109$ 8,50

23,28

12.3.4. C0042 CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD

CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS $0,4*0,4*0,25*4$ 0,16

CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * ESPESSURA * ALTURA * QUANTIDADE DE PILARES $0,3*0,12*4*4$ 0,58

CONCRETO DAS VIGAS = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA $(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25$ 0,51

1,25

12.3.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

QTD

CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS $0,4*0,4*0,25*4$ 0,16

0,16

12.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

QTD

CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * ESPESSURA * ALTURA * QUANTIDADE DE PILARES $0,3*0,12*4*4$ 0,58

CONCRETO DAS VIGAS = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA $(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25$ 0,51

1,09

12.3.7. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)

QTD

FORMA DOS PILARES = ALTURA * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARES $3,85*0,3*2*4$ 9,24

FORMA DAS VIGAS = COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES $(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,2*2$ 8,66

17,90

12.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:0) (M2)

QTD

PAREDES = PERIMETRO DAS PAREDES * ALTURA - VÃOS DE PORTAS E 30 30,00

30,00

12.4.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)


QTD

ALVENARIA DE EMBASAMENTO = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA $(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14)*0,2*0,3$ 1,04

1,04


Antônio Pco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezer
Eng. Civil CREA-CE 3415
RNP: 0618515844

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

VALA PARA BALDRAMES = PERIMETRO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA	$((30,2*2)+(16,2*2))*$	QTD	14,85
* PROFUNDIDADE DA VALA	0,4*0,4		
			14,85

3.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

VOLUME DE SOLO DE REATERRO = PERIMETRO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE DA VALA	$((30,2*2)+(16,2*2))*$	QTD	3,71
	0,1*0,4		
			3,71

4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA = PERIMETRO DAS PAREDES * LARGURA * PROFUNDIDADE	$((30,2*2)+(16,2*2))*$	QTD	11,14
	0,3*0,4		
			11,14

5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

CINTA DA MURETA = PERIMETRO DA MURETA - VÃOS DOS PORTÕES	16 + 7	QTD	23,00
			23,00

5.2. 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

FORMA DOS PILARETES = ALTURA DOS PILARETES * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARETES	$0,5*0,2*2*((30,2+3$	QTD	9,28
	$0,2+16,2+16,2)/2)$		
			9,28

5.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ARMADURA DOS PILARETES = COMPRIMENTO DAS BARRAS * QUANTIDADE DE BARRAS POR PILARES * QUANTIDADE DE PILARETES *	$1*4*((30,2+30,2+16$	QTD	114,52
	$2+16,2)/2)*0,617$		
			114,52

5.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QUANTIDADE DE ESTRIBOS PILARES = COMPRIMENTO DE ESTRIBO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M	$(0,9)*(1/0,15)*((30,$	QTD	42,87
	$2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,154$		
			42,87

5.5. C0042 CONCRETO PMBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOLUME DE CONCRETO PILARES = ÁREA DOS PILARES * ALTURA * QUANTIDADE	$(0,2*0,2*1)*((30,2+$	QTD	1,86
	$30,2+16,2+16,2)/2)$		
			1,86

5.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

IDEM ITEM ANTERIOR	1,86	QTD	1,86
			1,86

6.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

MURETA = PERIMETRO * ALTURA	$((30,2*2)+(16,2*2))*$	QTD	46,40
	0,5		
			46,40

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9928-7606. E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

(Handwritten signature and stamp)
RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Eng. Civil CREA-CE 0601851790

(Handwritten signature)
RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Eng. Civil CREA-CE 0601851790

(Handwritten signature)
Yukio Diógenes Bez
Eng. Civil CREA-CE 34
RNP: 0618515844

6.2. C0770 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

CHAPISCO DAS MURETAS = PERIMETRO DA MURETA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	(30,2+30,2+16,2+16,2)*0,5*2	QTD 92,80
		92,80

6.3. C3020 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

IDEM ITEM ANTERIOR	83	QTD 83,00
		83,00

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

MURO DA QUADRA = COMPRIMENTO * ALTURA - VÃO DO PORTÃO	21,54	QTD 24,54
		21,54

8.1. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

LASTRO O PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA * ESPESSURA	30*16*0,05	QTD 24,00
		24,00

11.2. C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

QUANTIDADE	4	QTD 4,00
		4,00

12.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

LOCAÇÃO DO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA	4,38*2,14	QTD 9,37
		9,37

12.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

ESCAVAÇÃO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE		QTD 2,08
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * LARGURA * PROFUNDIDADE * QUANTIDADE		0,38
		2,46

12.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)


REATERRO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DE REATERRO * PROFUNDIDADE		QTD 0,69
		0,69

12.2.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

ATERRO BANHEIRO = ÁREA INTERNA * ALTURA MÉDIA		QTD 2,43
		2,43

12.4.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14)*0,2*0,3	QTD 1,04
		1,04



RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes de
Eng. Civil CREA-CE:
RNP: 06185158-



Antônio Fox Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			MEDIÇÃO Nº 05			CONTRATO: 20.03.02/2023		R\$ 1.947.912,67			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024			ADITIVO:		R\$ -			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024			VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.947.912,67			
									VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 85.567,60			
									MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 552.333,88			
									SALDO:		R\$ 995.578,79			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P.TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL						R\$ 384.363,77				32,11%	R\$ 42.448,96	R\$ 80.999,76	R\$ 123.408,72	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 5.061,15				100,00%	R\$ 1.687,05	R\$ 3.374,10	R\$ 5.061,15	
1.1	PMJ-0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.687,05	5.061,15	1,00	2,00	3,00	0,00	100,00%	1.687,05	3.374,10	5.061,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.504,32				100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.504,32	R\$ 1.504,32	
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,14	1.152,84		6,00	6,00	0,00	100,00%	-	1.152,84	1.152,84
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	616,64	0,24	147,99		616,64	616,64	0,00	100,00%	-	147,99	147,99
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AULDILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,33	203,49		616,64	616,64	0,00	100,00%	-	203,49	203,49
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 7.459,82				54,00%	R\$ 1.21,87	R\$ 3.927,83	R\$ 4.049,70	
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	14,85	84,44	1.253,93		14,85	14,85	0,00	100,00%	-	1.253,93	1.253,93
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	3,71	32,85	121,87	3,71	0,00	3,71	0,00	100,00%	121,87	-	121,87
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	205,98	9,70	1.998,01		90,00	90,00	115,98	44,00%	-	873,00	873,00
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	91,43	30,46	2.784,96		45,00	45,00	46,43	49,00%	-	1.370,70	1.370,70
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	91,43	4,67	426,98		0,00	0,00	91,43	0,00%	-	-	-
3.6	C3009	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	91,43	9,56	874,07		45,00	45,00	46,43	49,00%	-	430,20	430,20
4	FUNDAÇÕES					R\$ 5.979,95				100,00%	R\$ 5.979,95	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95	11,14	0,00	11,14	0,00	100,00%	5.979,95	-	5.979,95
5	ESTRUTURA					R\$ 11.927,24				100,00%	R\$ 11.927,24	R\$ 0,00	R\$ 11.927,24	
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	90,80	81,02	7.356,62	90,80	0,00	90,80	0,00	100,00%	7.356,62	-	7.356,62
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	58,76	545,29	9,28	0,00	9,28	0,00	100,00%	545,29	-	545,29
5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.052,20	114,52	0,00	114,52	0,00	100,00%	2.052,20	-	2.052,20
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77	42,87	0,00	42,87	0,00	100,00%	671,77	-	671,77

Antônio Ivo Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RPRDIEDADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA219@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341829
CPF: 2618515844

RECIBO DE PAGAMENTO
FEITO EM 05/02/2024
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
CPF: 2618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		MEDIÇÃO Nº 05		CONTRATO: 20.03.02/2023		R\$ 1.947.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024		ADITIVO:		R\$ -				
						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.947.912,67				
								VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 85.567,80				
								MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 552.333,88				
								SALDO:		R\$ 995.578,79				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE														
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	983,23	1,86	0,00	1,86	0,00	100,00%	983,23	-	983,23
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13	1,86	0,00	1,86	0,00	100,00%	318,13	-	318,13
6	MURETA					R\$ 11.988,36					100,00%	R\$ 11.988,36	R\$ 0,00	R\$ 11.988,36
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO BURADO (5x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	132,93	6.167,95	46,40	0,00	46,40	0,00	100,00%	6.167,95	-	6.167,95
6.2	C0076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	92,80	7,84	727,55	92,80	0,00	92,80	0,00	100,00%	727,55	-	727,55
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86	92,80	0,00	92,80	0,00	100,00%	5.092,86	-	5.092,86
7	MURO					R\$ 79.938,77					93,00%	R\$ 2.101,83	R\$ 72.153,51	R\$ 74.255,34
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	211,62	350,89	74.255,34	5,99	205,63	211,62	0,00	100,00%	2.101,83	72.153,51	74.255,34
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	7,40	724,29	5.359,75		0,00	0,00	7,40	0,00%	-	-	-
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
8	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 80.975,24					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	113,84	2.732,16		0,00	0,00	24,00	0,00%	-	-	-
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	31.915,20		0,00	0,00	480,00	0,00%	-	-	-
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3x. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	83,96	617,95		0,00	0,00	7,36	0,00%	-	-	-
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44		0,00	0,00	576,00	0,00%	-	-	-
8.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62	20.299,01		0,00	0,00	38,40	0,00%	-	-	-
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	38,40	171,04	6.567,94		0,00	0,00	38,40	0,00%	-	-	-
8.7	11316	JUNTA PLÁSTICA 11 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00		0,00	0,00	640,00	0,00%	-	-	-
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FLURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	H	30,00	9,13	273,90		0,00	0,00	30,00	0,00%	-	-	-
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLOLHO (20x10x5)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	60,71	7.168,03		0,00	0,00	118,07	0,00%	-	-	-


Antônio Pedro Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JACAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (98) 31908-7626. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA2019@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0018515844

RECIBO DE PAGAMENTO
SERVIDOR PÚBLICO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
CPF: 000.000.000-00

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08			 REALIZA CONSTRUTORA		MEDIÇÃO Nº 05			CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$ 1.547.912,67			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024			ADITIVO:	R\$ -			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024			VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.547.912,67
											VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 85.567,60			
											MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 552.333,88			
											SALDO:	R\$ 995.578,79			
8.10	C1065	BANQUETA/ MEIO PRO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61		0,00	0,00	103,20	0,00%	-	-	-	
9 ALAMBRADO						R\$ 94.128,16					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (3X2,5m), INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	2.037,91	4.075,82		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	
9.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	334,27	90.052,34		0,00	0,00	269,40	0,00%	-	-	-	
10 PINTURA						R\$ 5.157,81					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	26,36	2.446,21		0,00	0,00	92,80	0,00%	-	-	-	
10.2	102994	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60		0,00	0,00	271,16	0,00%	-	-	-	
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 28.244,22					0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11.1	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00		0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-	
11.2	C9130	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	1.126,05	4.504,20		0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-	
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERVELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08		0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-	
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X31X135mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	342,57	342,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32		0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-	
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94		0,00	0,00	61,76	0,00%	-	-	-	
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	28,05	1.832,47		0,00	0,00	63,08	0,00%	-	-	-	
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	39,73	375,05		0,00	0,00	9,44	0,00%	-	-	-	
11.11	91655	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	11,69	12,62	147,53		0,00	0,00	11,69	0,00%	-	-	-	
11.12	C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04		0,00	0,00	516,00	0,00%	-	-	-	
11.13	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51		0,00	0,00	78,60	0,00%	-	-	-	
11.14	C3934	CADRA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x60 cm	UN	7,00	199,62	1.397,34		0,00	0,00	7,00	0,00%	-	-	-	
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.16	C1803	MURETA C/ TUBO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54		0,00	0,00	1,80	0,00%	-	-	-	

Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE/0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE

CONTATO: (88) 9 9908 7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil
RNP: 6518515644

PROJ. DE INST. DE REFORMA
SERV. DE PROJ. DE INST. DE REFORMA
RNP: 6518515644
RNP: 6518515644

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 <p>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</p>		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$ 1.947.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$ -		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.947.912,67
												VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 85.567,60
												MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 552.333,88
												SALDO:	R\$ 995.578,79
11.17	C4667	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	933,45	933,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	39,52	39,52	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	39,28	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
11.20	91936	CADXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	13,42	40,26	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-
11.21	10432	CADXA DE EMBUSTR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-
11.22	10815	CAPO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	100,80	1,99	200,59	0,00	0,00	100,80	0,00%	-	-	-
12 BANHEIROS				R\$ 39.902,02				22,00%		R\$ 8.642,66	R\$ 0,00	R\$ 8.642,66	
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 72,43				100,00%		R\$ 72,43	R\$ -	R\$ 72,43	
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,73	72,43	9,37	0,00	9,37	0,00	100,00%	72,43	72,43
12.2 MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 518,30				100,00%		R\$ 518,30	R\$ -	R\$ 518,30	
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,46	84,44	207,72	2,46	0,00	2,46	0,00	100,00%	207,72	207,72
12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	0,69	32,85	22,67	0,69	0,00	0,69	0,00	100,00%	22,67	22,67
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	2,43	118,48	287,91	2,43	0,00	2,43	0,00	100,00%	287,91	287,91
12.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				R\$ 8.424,68				59,00%		R\$ 4.968,16	R\$ 0,00	R\$ 4.968,16	
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOADO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	0,64	23,23	14,87	0,64	0,00	0,64	0,00	100,00%	14,87	14,87
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	74,12	0,00	74,12	27,05	73,00%	1.328,26	1.328,26
12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	497,94	23,28	0,00	23,28	8,49	73,00%	364,79	364,79
12.3.4	C0842	CONCRETO P/VIUA, FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	1.020,24	1,25	0,00	1,25	0,68	65,00%	660,56	660,56
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	0,16	0,00	0,16	0,68	19,00%	27,37	27,37
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60	1,09	0,00	1,09	0,00	100,00%	315,48	315,48
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. SX	M2	24,83	126,08	3.130,57	17,90	0,00	17,90	6,93	72,00%	2.256,83	2.256,83
12.3.8	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	159,97	1.498,92	0,00	0,00	9,37	0,00%	-	-	-
12.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 4.199,96				73,00%		R\$ 3.083,77	R\$ 0,00	R\$ 3.083,77	
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	44,71	75,88	3.392,59	30,00	0,00	30,00	14,71	67,00%	2.276,40	2.276,40

Antônio Pco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CÍZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PRDIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9 9908 7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA29@GMAIL.COM

Yukio Diogenes de Bezerra
Eng. Civil - CREA-CE: 341020
RNP: 0618515044

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
RUA... Nº...
CEP: 63.200-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO												VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			MEDIÇÃO Nº 05			CONTRATO: 20.03.02/2023		R\$	1.547.912,67			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS:			ADITIVO:		R\$	-			
						11/01/2024 A 05/02/2024			VALOR TOTAL SERV.		R\$	1.547.912,67			
						DATA DE EMISSÃO:			VALOR DA MEDIÇÃO		R\$	85.567,60			
						segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024			MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	552.333,88			
									SALDO:		R\$	995.578,79			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE															
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUDOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	776,32	807,37	1,04	0,00	1,04	0,00	100,00%	807,37	-	807,37	
12.5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 8.187,22						0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	114,38	2.013,09		0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-	
12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,60	11,14	196,06		0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-	
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	15,39	116,81		0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	
12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	45,95	348,76		0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	
12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	M2	89,42	7,84	701,05		0,00	0,00	89,42	0,00%	-	-	-	
12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,82	54,88	3.941,48		0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-	
12.5.7	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	17,60	49,43	869,97		0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-	
12.6	SISTEMA DE PISOS				R\$ 1.700,74						0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.6.1	C1607	LÁSTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 6=6CM	M2	7,59	59,58	452,21		0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=2cm	M2	7,59	28,34	215,10		0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	7,59	108,86	826,25		0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	
12.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	11,14	84,55		0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20x10x5)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	60,71	122,63		0,00	0,00	2,02	0,00%	-	-	-	
12.7	SISTEMA DE COBERTURA				R\$ 1.962,25						0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.7.1	C0802	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/ MADEIRAMENTO)	M2	7,04	194,15	1.085,22		0,00	0,00	7,04	0,00%	-	-	-	
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	354,84		0,00	0,00	2,51	0,00%	-	-	-	
12.7.3	C2149	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M2	7,54	43,17	325,50		0,00	0,00	7,54	0,00%	-	-	-	


Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908.7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE: 041929
RNP: 6012515844

FCO 19/02/2024
Secretaria de Educação e Cultura
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
CPF: 914.201.213-91

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67
														VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60
								MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88			
								SALDO:	R\$	995.578,79	SALDO:	R\$	995.578,79			
12.7.4	C0662	CAIXA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69		0,00	0,00	4,14	0,00%	-	-	-		
12.8 ESQUADRIAS						R\$ 2.504,08		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	2,94	724,29	2.129,41		0,00	0,00	2,94	0,00%	-	-	-		
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59	307,18		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-		
12.8.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64	105,45	67,49		0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	-		
12.9 PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 1.558,69		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	7,59	17,99	136,54		0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-		
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	71,82	15,88	1.140,50		0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-		
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65		0,00	0,00	5,88	0,00%	-	-	-		
12.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 10.658,93		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.10.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 518,58		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39		0,00	0,00	1,62	0,00%	-	-	-		
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	15,80	9,51	150,26		0,00	0,00	15,80	0,00%	-	-	-		
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	9,45		0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	-		
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	21,98	14,51		0,00	0,00	0,66	0,00%	-	-	-		
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	26,60	26,60		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	35,57	35,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-		
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	26,09	26,09		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		


Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO KEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTD CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA <small>CONSTRUTORA LTDA</small> <small>CNPJ: 35.851.118/0001-08</small>		MEDIÇÃO Nº 05		CONTRATO: 20.03.02/2023		R\$ 1.547.912,67							
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024		ADITIVO:		R\$ -							
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											DATA DE EMISSÃO:		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.547.912,67		
											segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 85.567,60		
								MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 552.333,88							
								SALDO:		R\$ 995.578,79							
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	1,00	6,65	6,65	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.10	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	1,00	10,20	10,20	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	1,00	8,31	8,31	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	1,00	9,89	9,89	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	1,00	14,25	14,25	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.14	3515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,39	9,39	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,73	7,73	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.16	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	1,00	21,68	21,68	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.1.17	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	1,00	12,69	12,69	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				
12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 6.634,53		0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	2,54	22,55	57,28	0,00	0,00	2,54	0,00%	-	-	-				
12.10.2.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	M	10,94	15,56	170,23	0,00	0,00	10,94	0,00%	-	-	-				
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	7,64	44,13	337,15	0,00	0,00	7,64	0,00%	-	-	-				
12.10.2.4	C3386	CAIXA SIFONADA 150X150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	61,59	123,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-				
12.10.2.5	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	1,00	197,61	197,61	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-				


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO I, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

Yukie Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE: 0601851581
RNF: 061851581

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 35.851.118/0001-08
R. PROJETADA 2, JOÃO PAULO I, JAGUARIBE-CE


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67	
										VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60	
DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024										MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	352.333,88	
										SALDO:	R\$	995.578,79	
12.10.2.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,83	19,66	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	13,53	54,12	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	12,94	77,64	0,00	0,00	6,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.10	3659	BUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	23,09	46,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.11	C1761	LUNA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.12	C1758	LUNA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,63	94,52	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.14	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	57,13	57,13	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 3.505,82		0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.3.1	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	361,34	361,34	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.3.2	00948	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	940,50	1.881,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	56,89	113,78	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO VIZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 6701851730

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

Yvete Fagundes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341829
RND-0518515844



BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			 REALIZA CONSTRUTORA		MEDIÇÃO Nº 05		CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024		ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67		
												VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60		
												MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88		
												SALDO:	R\$	995.578,79		
12.11 SERVIÇOS FINAIS										R\$ 104,74		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41214	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	13,80	104,74	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-		
13 DIVERSOS										R\$ 11.184,08		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	4.447,94	4.447,94	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-		
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.700,29	2.700,29	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-		
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	4.035,85	4.035,85	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-		
14 SERVIÇOS FINAIS										R\$ 912,63		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48	912,63	0,00	0,00	616,64	0,00%	-	-	-	-		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM										R\$ 387.879,39		0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA										R\$ 5.061,15		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1	PMJ - 0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.687,05	5.061,15	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-	-		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 1.504,32		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,14	1.152,84	0,00	0,00	6,00	0,00%	-	-	-	-		
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	616,64	0,24	147,99	0,00	0,00	616,64	0,00%	-	-	-	-		
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,33	203,49	0,00	0,00	616,64	0,00%	-	-	-	-		
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										R\$ 9.757,85		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	14,85	84,44	1.253,93	0,00	0,00	14,85	0,00%	-	-	-	-		
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	3,71	32,85	121,87	0,00	0,00	3,71	0,00%	-	-	-	-		
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	178,48	9,70	1.731,74	0,00	0,00	178,53	0,00%	-	-	-	-		


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

PROPRIETÁRIA 2 - LOTEAMENTO VOLTADO DO RIO Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9-9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0078515844

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
CPF: 14.332.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			 <p>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</p>		MEDIÇÃO N° 05		CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024		ADITIVO:	R\$	-			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67	
												VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60	
												MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88	
												SALDO:	R\$	995.578,79	
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	148,81	30,46	4.532,75		0,00	0,00	148,81	0,00%	-	-	-	
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	148,81	4,67	694,94		0,00	0,00	148,81	0,00%	-	-	-	
3.6	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	148,81	9,56	1.422,62		0,00	0,00	148,81	0,00%	-	-	-	
4 FUNDAÇÕES						R\$ 5.979,95				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95		0,00	0,00	11,14	0,00%	-	-	-	
5 ESTRUTURA						R\$ 11.927,24				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5.1	99204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	80,80	81,02	7.356,62		0,00	0,00	80,80	0,00%	-	-	-	
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	9,28	58,76	545,29		0,00	0,00	9,28	0,00%	-	-	-	
5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.052,20		0,00	0,00	114,52	0,00%	-	-	-	
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77		0,00	0,00	42,87	0,00%	-	-	-	
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	983,23		0,00	0,00	1,86	0,00%	-	-	-	
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13		0,00	0,00	1,86	0,00%	-	-	-	
6 MURETA						R\$ 11.988,36				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6.1	C0074	ALVENARIA DE TUDOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	132,93	6.167,95		0,00	0,00	46,40	0,00%	-	-	-	
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PARDE	M2	92,80	7,84	727,55		0,00	0,00	92,80	0,00%	-	-	-	
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86		0,00	0,00	92,80	0,00%	-	-	-	
7 MURO						R\$ 81.156,36				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	215,09	350,89	75.472,93		0,00	0,00	215,09	0,00%	-	-	-	
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	7,40	724,29	5.359,75		0,00	0,00	7,40	0,00%	-	-	-	
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	
8 PAVIMENTAÇÃO						R\$ 80.975,24				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	113,84	2.732,16		0,00	0,00	24,00	0,00%	-	-	-	
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	31.915,20		0,00	0,00	480,00	0,00%	-	-	-	


Antonio Foz-Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

LOTEAMENTO 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 480, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908.7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA219@GMAIL.COM

YUKI MARCELO BARREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 0618210844

EMPRESA REGISTRADA
CNPJ: 35.851.118/0001-08
RUA: ... Nº: ...
Cidade: JAGUARIBE - CE


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA <small>CONSTRUTORA LTDA</small>		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
								MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88						
								SALDO:	R\$	995.578,79						
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. S X	M2	7,36	63,96	617,95	0,00	0,00	7,36	0,00%	-	-	-			
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44	0,00	0,00	576,00	0,00%	-	-	-			
8.5	C0842	CONCRETO P/VRB., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62	20.299,01	0,00	0,00	38,40	0,00%	-	-	-			
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVação	M3	38,40	171,04	6.567,94	0,00	0,00	38,40	0,00%	-	-	-			
8.7	11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00	0,00	0,00	640,00	0,00%	-	-	-			
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMANTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	H	30,00	9,13	273,90	0,00	0,00	30,00	0,00%	-	-	-			
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20X10X5)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	60,71	7.168,03	0,00	0,00	118,07	0,00%	-	-	-			
8.10	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61	0,00	0,00	103,20	0,00%	-	-	-			
9 ALAMBRADO						R\$ 94.128,16				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	2.037,91	4.075,82	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
9.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	334,27	90.052,34	0,00	0,00	269,40	0,00%	-	-	-			
10 PINTURA						R\$ 5.157,81				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	26,36	2.446,21	0,00	0,00	92,80	0,00%	-	-	-			
10.2	10294	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60	0,00	0,00	271,16	0,00%	-	-	-			
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 28.244,22				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
11.1	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-			
11.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL (200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	1.126,05	4.504,20	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERVELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm. C/ABARRAMENTO	UN	1,00	342,57	342,57	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			

Antônio Fco. Dógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA29@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851740

Yukio Dias
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUIARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08		 REALIZA <small>CONSTRUTORA LTDA</small> <small>CNPJ: 35.951.118/0001-08</small>		MEDIÇÃO Nº 05			CONTRATO: 20.03.02/2023		R\$	1.547.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024			ADITIVO:		R\$	-		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUIARIBE-CE								DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024			VALOR TOTAL SERV.		R\$	1.547.912,67
								VALOR DA MEDIÇÃO		R\$	85.567,60	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$
							SALDO:		R\$	995.578,79				
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94	0,00	0,00	61,76	0,00%	-	-	-	
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	28,05	1.832,47	0,00	0,00	63,08	0,00%	-	-	-	
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	39,73	375,05	0,00	0,00	9,44	0,00%	-	-	-	
11.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	11,69	12,62	147,53	0,00	0,00	11,69	0,00%	-	-	-	
11.12	C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04	0,00	0,00	516,00	0,00%	-	-	-	
11.13	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51	0,00	0,00	78,60	0,00%	-	-	-	
11.14	C3904	CADIA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP. CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x60 cm	UN	7,00	199,62	1.397,34	0,00	0,00	7,00	0,00%	-	-	-	
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.16	C1803	MURETA C/ TÍPOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUND.ÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54	0,00	0,00	1,80	0,00%	-	-	-	
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	933,45	933,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	39,28	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	
11.20	91936	CADIA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	13,42	40,26	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-	
11.21	16432	CADIA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-	
11.22	18815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	100,80	1,99	200,59	0,00	0,00	100,80	0,00%	-	-	-	
12	BANHEIROS				R\$ 39.902,02		0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 72,43		0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,73	72,43	0,00	0,00	9,37	0,00%	-	-	-	
12.2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 518,30		0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	2,46	84,44	207,72	0,00	0,00	2,46	0,00%	-	-	-	
12.2.2	93382	ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	0,69	32,85	22,67	0,00	0,00	0,69	0,00%	-	-	-	
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	118,48	287,91	0,00	0,00	2,43	0,00%	-	-	-	

André Foz Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULISTANO, JAGUIARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908.7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Engenheiro Civil - CE 341929
CPF: 0318516344

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
												VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60
												MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88
												SALDO:	R\$	995.578,79
12.3 FUNDações E ESTRUTURA				R\$ 8.434,68				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,64	23,23	14,87	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-		
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	0,00	0,00	101,17	0,00%	-	-		
12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	497,94	0,00	0,00	31,77	0,00%	-	-		
12.3.4	C0842	CONCRETO P/VIDR., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	1.020,24	0,00	0,00	1,93	0,00%	-	-		
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	0,00	0,00	0,84	0,00%	-	-		
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60	0,00	0,00	1,09	0,00%	-	-		
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. SX	M2	24,83	126,08	3.130,57	0,00	0,00	24,83	0,00%	-	-		
12.3.8	C4451	LARE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	159,97	1.498,92	0,00	0,00	9,37	0,00%	-	-		
12.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 4.199,96				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TUDOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	44,71	75,88	3.392,59	0,00	0,00	44,71	0,00%	-	-		
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUDOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	776,32	807,37	0,00	0,00	1,04	0,00%	-	-		
12.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 8.187,22				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	114,38	2.013,09	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-		
12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) e PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,60	11,14	196,06	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-		
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	M2	7,59	15,39	116,81	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-		
12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP.=20 mm P/ TETO	M2	7,59	45,95	348,76	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-		
12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	89,42	7,84	701,05	0,00	0,00	89,42	0,00%	-	-		
12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	54,88	3.941,48	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-		
12.5.7	C3023	ENBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	17,60	49,43	869,97	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-		


Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

FORNHECIDA POR
SISTEMA DE CONTABILIDADE
FOLHA Nº 01/01/2024
CPF: 08.047.063-49

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9908 7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO BEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukie Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE: 941929
R.N.: 0818515844


BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05		CONTRATO: 20.03.02/2023		R\$ 1.947.912,67							
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		ADITIVO:	R\$ -						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.947.912,67				
											VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 85.567,60				
											MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 552.333,88				
											SALDO:		R\$ 995.578,79				
12.6 SISTEMA DE PISOS											R\$ 1.700,74		0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	59,58	452,21	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-				
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	28,34	215,10	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-				
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SIPEL4 - P/ PISO	M2	7,59	108,86	826,25	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-				
12.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARDE/PISO)	M2	7,59	11,14	84,55	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-				
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20X20X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	60,71	122,63	0,00	0,00	2,02	0,00%	-	-	-				
12.7 SISTEMA DE COBERTURA											R\$ 1.962,25		0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.7.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	7,04	154,15	1.085,22	0,00	0,00	7,04	0,00%	-	-	-				
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	354,94	0,00	0,00	2,51	0,00%	-	-	-				
12.7.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	43,17	325,50	0,00	0,00	7,54	0,00%	-	-	-				
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	0,00	0,00	4,14	0,00%	-	-	-				
12.8 ESQUADRIAS											R\$ 2.504,08		0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	2,94	724,29	2.129,41	0,00	0,00	2,94	0,00%	-	-	-				
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59	307,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-				
12.8.3	C0804	COROGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64	105,45	67,49	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	-				
12.9 PINTURAS E ACABAMENTOS											R\$ 1.558,69		0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	7,59	17,99	136,54	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-				
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	71,82	15,88	1.140,50	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-				

Antônio Pco. Digenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RPROJETADA 2 - LOTEAMENTO VÓLTA DO RIO, Nº 480, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE, CE.
CONTATO: (88) 9 4908 4606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA35@GMAIL.COM

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Pinheiro Reis
Eng. Civil CREA - CE 041928
RFP: 0018513644


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO:	VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67	
										segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60	
											MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88	
											SALDO:	R\$	995.578,79	
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65		0,00	0,00	5,88	0,00%	-	-	-
12.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 10.658,93				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 518,58				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39		0,00	0,00	1,62	0,00%	-	-	-
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	9,51	150,26		0,00	0,00	15,80	0,00%	-	-	-
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	9,45		0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	-
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	21,98	14,51		0,00	0,00	0,66	0,00%	-	-	-
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	26,60	26,60		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	35,57	35,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,09	26,09		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,65	6,65		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.10	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,20	10,20		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,31	8,31		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,89	9,89		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,25	14,25		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-

Antônio Fco. Diogenes de Sá
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA2@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Ribeiro Bezerra
Eng. Civil CREA-CE: 841929
RNF: 0018516344


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 <p>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</p>		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
										VALOR DA MEDIÇÃO				R\$	85.567,80	
										MEDIÇÃO ACUMULADA:				R\$	552.333,88	
										SALDO:				R\$	995.578,79	
12.10.1.14	3515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,39	9,39	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,73	7,73	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.16	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,68	21,68	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.17	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,69	12,69	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 6.634,53				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	22,55	57,28	0,00	0,00	2,54	0,00%	-	-	-			
12.10.2.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,94	15,56	170,23	0,00	0,00	10,94	0,00%	-	-	-			
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,64	44,13	337,15	0,00	0,00	7,64	0,00%	-	-	-			
12.10.2.4	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	61,59	123,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.5	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	1,00	197,61	197,61	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,83	19,66	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	13,53	54,12	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	12,94	77,64	0,00	0,00	6,00	0,00%	-	-	-			

Antônio Fco. Digenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 480, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9908 7608. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA243@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulio Pinheiro de Oliveira
Eng. Civil - RFB nº 26.941/200
RNP: 06120145584

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
								MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88						
								SALDO:	R\$	995.578,79						
12.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.10	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	23,09	46,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.11	C1761	LJVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.12	C1758	LJVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,63	94,52	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.13	88925	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.14	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	57,13	57,13	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.3	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 3.505,82				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.10.3.1	102605	CADIA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	361,34	361,34	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.3.2	C0948	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CADIA ACOPLADA	UN	2,00	940,50	1.881,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.3.3	100949	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	56,89	113,78	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.11	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 104,74				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
41214	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	13,80	104,74	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-			
13	DIVERSOS				R\$ 11.184,08				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	4.447,94	4.447,94	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			

Antônio Fro. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO 1, JAGUARIBE (CE)
CONTATO: (88) 9 9908 7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA198@GMAIL.COM

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulio Diógenes Barreira
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNB: 0618515844


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										ADITIVO:	R\$	-		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										PERÍODO DOS SERVIÇOS:		VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
										DATA DE EMISSÃO:		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60
										segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88
												SALDO:	R\$	995.578,79
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	C3	1,00	2.700,29	2.700,29	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	C3	1,00	4.025,85	4.025,85	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 912,63				0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48	912,63	0,00	0,00	616,64	0,00%	-	-	-	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ					R\$ 381.362,57				29,71%		R\$ 43.118,64	R\$ 70.174,17	R\$ 113.202,81	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				R\$ 5.061,15				67,00%		R\$ 1.687,05	R\$ 1.687,05	R\$ 3.374,10	
1.1	PM00102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MÊS	3,00	1.687,05	5.061,15	1,00	1,00	2,00	1,00	67,00%	1.687,05	1.687,05	3.374,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.504,32				100,00%		R\$ 0,00	R\$ 1.504,32	R\$ 1.504,32	
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,14	1.152,84	6,00	6,00	0,00	100,00%	-	1.152,84	1.152,84	
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	616,64	0,24	147,99	616,64	616,64	0,00	100,00%	-	147,99	147,99	
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,33	203,49	616,64	616,64	0,00	100,00%	-	203,49	203,49	
3	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 4.219,77				33,00%		R\$ 1.375,80	R\$ 0,00	R\$ 1.375,80	
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (AF. 02/2021)	M3	14,85	84,44	1.253,93	14,85	0,00	14,85	0,00	100,00%	1.253,93	-	1.253,93
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	3,71	32,85	121,87	3,71	0,00	3,71	0,00	100,00%	121,87	-	121,87
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO	M3	259,33	9,70	2.515,50	0,00	0,00	259,33	0,00%	-	-	-	
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	7,35	30,46	223,88	0,00	0,00	7,35	0,00%	-	-	-	
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	7,35	4,67	34,32	0,00	0,00	7,35	0,00%	-	-	-	
3.6	C3009	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	7,35	9,56	70,27	0,00	0,00	7,35	0,00%	-	-	-	
4	FUNDAÇÕES				R\$ 5.979,95				100,00%		R\$ 5.979,95	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	

Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Batista
Eng. Civil CREA-CE: 0601851790
RNP: 0618515343

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			 REALIZA CONSTRUTORA LTDA			MEDIÇÃO Nº 05		CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$ 1.547.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024		ADITIVO:	R\$ -		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.547.912,67		
											VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 85.567,60		
											MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 532.333,88		
											SALDO:	R\$ 995.578,79		
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95	11,14	0,00	11,14	0,00	100,00%	5.979,95	-	5.979,95
5 ESTRUTURA					R\$ 11.927,24			54,00%			R\$ 6.434,08	R\$ 0,00	R\$ 6.434,08	
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	90,80	81,02	7.356,62	23,00	0,00	23,00	67,80	25,00%	1.863,46	-	1.863,46
5.2	92425	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	9,28	58,76	545,29	9,28	0,00	9,28	0,00	100,00%	545,29	-	545,29
5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.052,20	114,52	0,00	114,52	0,00	100,00%	2.052,20	-	2.052,20
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77	42,87	0,00	42,87	0,00	100,00%	671,77	-	671,77
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	983,23	1,86	0,00	1,86	0,00	100,00%	983,23	-	983,23
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13	1,86	0,00	1,86	0,00	100,00%	318,13	-	318,13
6 MURETA					R\$ 11.888,36			96,00%			R\$ 11.450,54	R\$ 0,00	R\$ 11.450,54	
6.1	C0074	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	132,93	6.167,95	46,40	0,00	46,40	0,00	100,00%	6.167,95	-	6.167,95
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	92,80	7,84	727,55	92,80	0,00	92,80	0,00	100,00%	727,55	-	727,55
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86	83,00	0,00	83,00	9,80	89,00%	4.555,04	-	4.555,04
7 MURO					R\$ 80.222,99			93%			R\$ 7.556,76	R\$ 66.982,80	R\$ 74.539,56	
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	212,43	350,89	74.539,56	21,54	190,89	212,43	0,00	100,00%	7.556,76	66.982,80	74.539,56
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	7,40	724,29	5.359,75		0,00	0,00	7,40	0,00%	-	-	-
7.3	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
8 PAVIMENTAÇÃO					R\$ 80.975,24			3,00%			R\$ 2.732,16	R\$ 0,00	R\$ 2.732,16	
8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	113,84	2.732,16	24,00	0,00	24,00	0,00	100,00%	2.732,16	-	2.732,16
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	31.915,20		0,00	0,00	480,00	0,00%	-	-	-
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PRUNHAÇÕES UTIL. S X	M2	7,36	83,96	617,95		0,00	0,00	7,36	0,00%	-	-	-
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44		0,00	0,00	576,00	0,00%	-	-	-
8.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62	20.299,01		0,00	0,00	38,40	0,00%	-	-	-
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	171,04	6.567,94		0,00	0,00	38,40	0,00%	-	-	-

André Fro. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9808.7606 - E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA1419@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Dias
Eng. Civil CREA-CE: 06047829
RNP: 0618515044

BOLETIM DE MEDIÇÃO


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
										MEDIDA ACUMULADA:		R\$	552.333,88	
										SALDO:		R\$	995.578,79	
8.7	11316	JUNTA PLASTICA T' 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00		0,00	0,00	640,00	0,00%	-	-	-
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 18/2015	H	30,00	9,13	273,90		0,00	0,00	30,00	0,00%	-	-	-
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20X10X6)CM SEMPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	60,71	7.168,03		0,00	0,00	118,07	0,00%	-	-	-
8.10	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61		0,00	0,00	103,20	0,00%	-	-	-
9 ALAMBRADO						R\$ 94.128,16					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m. INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	2.037,91	4.075,82		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
9.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	334,27	90.052,34		0,00	0,00	269,40	0,00%	-	-	-
10 PINTURA						R\$ 5.157,81					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	26,36	2.446,21		0,00	0,00	92,80	0,00%	-	-	-
10.2	102304	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60		0,00	0,00	271,16	0,00%	-	-	-
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 28.198,85					16,00%	R\$ 4.504,20	R\$ 0,00	R\$ 4.504,20
11.1	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00		0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-
11.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 520 KG	UN	4,00	1.126,05	4.504,20	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	4.504,20	-	4.504,20
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08		0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm. C/BARRAMENTO	UN	1,00	342,57	342,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32		0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94		0,00	0,00	61,76	0,00%	-	-	-
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	29,05	1.832,47		0,00	0,00	63,08	0,00%	-	-	-

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, RUA PAULO G. JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9608-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA24@gmail.com

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

YVANILSON DE SOUZA
Eng. Civil OAB - CE 341023
RUBR 0510515044


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67
														VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60
														MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88
														SALDO:	R\$	995.578,79
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	39,73	375,05	0,00	0,00	9,44	0,00%	-	-	-			
11.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,69	12,62	147,53	0,00	0,00	11,69	0,00%	-	-	-			
11.12	C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04	0,00	0,00	516,00	0,00%	-	-	-			
11.13	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51	0,00	0,00	78,60	0,00%	-	-	-			
11.14	C2604	CADIA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D1=30x30x50 cm	UN	7,00	199,62	1.397,34	0,00	0,00	7,00	0,00%	-	-	-			
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.16	C1803	MURETA C/ TITULO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUND.ÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54	0,00	0,00	1,80	0,00%	-	-	-			
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	933,45	933,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	39,28	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
11.20	91936	CADIA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	13,42	40,26	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-			
11.21	16432	CADIA DE EMBRUTR PVC - 402 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-			
11.22	18815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	78,00	1,99	155,22	0,00	0,00	78,00	0,00%	-	-	-			
12	BANHENTOS					R\$ 39.902,02			4,00%	R\$ 1.398,10	R\$ 0,00	R\$ 1.398,10				
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 72,43			100,00%	R\$ 72,43	R\$ 0,00	R\$ 72,43				
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,73	72,43	9,37	0,00	9,37	100,00%	72,43	-	72,43			
12.2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 518,30			100,00%	R\$ 518,30	R\$ 0,00	R\$ 518,30				
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,46	84,44	207,72	2,46	0,00	2,46	100,00%	207,72	-	207,72			
12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,69	32,85	22,67	0,69	0,00	0,69	100,00%	22,67	-	22,67			
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	2,43	118,48	287,91	2,43	0,00	2,43	100,00%	287,91	-	287,91			
12.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					R\$ 8.434,68			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,64	22,32	14,87	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	-			
12.3.2	C0216	ARMADURA C/50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	0,00	0,00	101,17	0,00%	-	-	-			

Andréo Fco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO (88) 9-9908-7606 E-MAIL CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulka Pinheiro Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 541929
RNP: 0610515844


BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05		CONTRATO: 20.03.02/2023		R\$ 1.547.912,67			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.547.912,67			
						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 85.567,60			
								MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 552.333,88			
								SALDO:		R\$ 995.578,79			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE													
12.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	497,84	0,00	0,00	31,77	0,00%	-	-	-
12.3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	1.020,24	0,00	0,00	1,93	0,00%	-	-	-
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	0,00	0,00	0,84	0,00%	-	-	-
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60	0,00	0,00	1,09	0,00%	-	-	-
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=18mm UTIL. SX	M2	24,83	126,08	3.130,57	0,00	0,00	24,83	0,00%	-	-	-
12.3.8	C4451	LAZE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	159,97	1.498,92	0,00	0,00	9,37	0,00%	-	-	-
12.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 4.189,96				19,00%	R\$ 807,37	R\$ 0,00	R\$ 807,37	
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	44,71	75,88	3.392,59	0,00	0,00	44,71	0,00%	-	-	-
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍDULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	776,32	807,37	1,04	0,00	1,04	100,00%	807,37	-	807,37
12.5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 8.187,22				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	114,38	2.013,09	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-
12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,60	11,14	196,06	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	15,39	116,81	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:2:8. ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	45,95	348,76	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	M2	89,42	7,84	701,05	0,00	0,00	89,42	0,00%	-	-	-
12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,82	54,88	3.941,48	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-
12.5.7	C3023	ENBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	17,60	49,43	869,97	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-
12.6	SISTEMA DE PISOS				R\$ 1.700,74				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	59,58	452,21	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 480, SALA 01, JOÃO PAULO I, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9939-7626. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA23@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukie Tibério de Bezerra
Eng. Civil - RFB - CE 341620
RFB: 0618515044


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67
								MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88						
								SALDO:	R\$	995.578,79						
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	28,34	215,10	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-			
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SIPEI-4 - P/ PISO	M2	7,59	108,86	826,25	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-			
12.6.4	C1427	RELUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDES/PISO)	M2	7,59	11,14	84,55	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-			
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO (20X10X1CM) SEMPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	60,71	122,63	0,00	0,00	2,02	0,00%	-	-	-			
12.7 SISTEMA DE COBERTURA						R\$ 1.962,25				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.7.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	7,04	154,15	1.085,22	0,00	0,00	7,04	0,00%	-	-	-			
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	354,94	0,00	0,00	2,51	0,00%	-	-	-			
12.7.3	C2249	RUPO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	43,17	325,50	0,00	0,00	7,54	0,00%	-	-	-			
12.7.4	C0652	CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	0,00	0,00	4,14	0,00%	-	-	-			
12.8 ESQUADRIAS						R\$ 2.504,08				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	2,94	724,29	2.129,41	0,00	0,00	2,94	0,00%	-	-	-			
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	LIN	2,00	153,59	307,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.8.3	C0804	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64	105,45	67,49	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	-			
12.9 PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 1.538,69				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	7,59	17,99	136,54	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-			
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	71,82	15,88	1.140,50	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-			
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65	0,00	0,00	5,88	0,00%	-	-	-			
12.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 10.658,93				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.10.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 518,58				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39	0,00	0,00	1,62	0,00%	-	-	-			
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	9,51	150,26	0,00	0,00	15,80	0,00%	-	-	-			

Antônio Foz, Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7636. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulie Rodrigues Bezerra
Eng. Civil - CREA-CE: 06018518004


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67	
										VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60	
								MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88			
								SALDO:	R\$	995.578,79			
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	9,45	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	-
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	21,98	14,51	0,00	0,00	0,66	0,00%	-	-	-
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	35,57	35,57	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,09	26,09	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,65	6,65	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.10	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,20	10,20	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,31	8,31	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,89	9,89	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,25	14,25	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.14	3515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,39	9,39	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,73	7,73	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-

Antônio Frouxigenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9-9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA29@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukle Ribeiro Brito
C.O. CIVIL 0228 - Df. 841629
RPF: 0610513644

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
										VALOR DA MEDIÇÃO				R\$	85.567,60	
										MEDIÇÃO ACUMULADA:				R\$	552.333,68	
										SALDO:				R\$	995.578,79	
12.10.1.16	89624	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,68	21,68	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.17	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,69	12,69	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 6.634,53					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	22,55	57,28	0,00	0,00	2,54	0,00%	-	-	-			
12.10.2.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,94	15,56	170,23	0,00	0,00	10,94	0,00%	-	-	-			
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,64	44,13	337,15	0,00	0,00	7,64	0,00%	-	-	-			
12.10.2.4	C3586	CADIA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	61,59	123,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.5	C0605	CADIA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	1,00	197,61	197,61	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,83	19,66	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	13,53	54,12	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	12,94	77,64	0,00	0,00	6,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	35,94	35,94	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.2.10	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	23,09	46,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			


Antônio Fco. Viçegas de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 35.851.118/0001-08

R PRDJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9929.7636. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA2419@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulic Pinheiro Pereira
Eng. Civil - CREA-CE: 0401020
RNP: 0101051604


BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA <small>CONSTRUTORA LTDA</small>		MEDIÇÃO Nº 05					CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024					ADITIVO:	R\$	-		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
											VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60		
											MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88		
											SALDO:	R\$	995.578,79		
12.10.2.11	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-		
12.10.2.12	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,63	94,52	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-		
12.10.2.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-		
12.10.2.14	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	57,13	57,13	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		
12.10.3 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 3.505,82			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
12.10.3.1	102805	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	361,34	361,34	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		
12.10.3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	940,50	1.881,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-		
12.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	56,89	113,78	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-		
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-		
12.11 SERVIÇOS FINAIS						R\$ 104,74			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
41214	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	13,80	104,74	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-		
13 DIVERSOS						R\$ 11.184,08			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	4.447,94	4.447,94	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.700,29	2.700,29	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	4.035,85	4.035,85	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-		

Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO I, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 1908 7666. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA145@GMAIL.COM

RICARDO CILAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

MARCELO DE BEZERRA
CPF: 000.000.000-00
R. 000000000


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67		
														VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60		
														MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88		
														SALDO:	R\$	955.578,79		
14 SERVIÇOS FINAIS										R\$ 912,63	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
14.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48	912,63	0,00	0,00	616,64	0,00%	-	-	-	-				
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO										R\$ 394.306,94	80,05%	R\$ -	R\$ 315.632,35	R\$ 315.632,35				
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA										R\$ 5.061,15	67,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.374,10	R\$ 3.374,10				
1	PM00102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MÊS	3,00	1.687,05	5.061,15	2,00	2,00	1,00	67,00%	-	3.374,10	3.374,10					
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 1.594,32	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.594,32	R\$ 1.594,32				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,14	1.152,94	6,00	6,00	0,00	100,00%	-	1.152,94	1.152,94					
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	616,64	0,24	147,99	616,64	616,64	0,00	100,00%	-	147,99	147,99					
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,33	203,49	616,64	616,64	0,00	100,00%	-	203,49	203,49					
3 MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 2.388,48	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.388,48	R\$ 2.388,48				
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	14,85	84,44	1.253,93	14,85	14,85	0,00	100,00%	-	1.253,93	1.253,93					
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	3,71	32,85	121,87	3,71	3,71	0,00	100,00%	-	121,87	121,87					
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	33,08	9,70	320,88	33,08	33,08	0,00	100,00%	-	320,88	320,88					
3.4	C2633	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	15,48	30,46	471,52	15,48	15,48	0,00	100,00%	-	471,52	471,52					
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	15,48	4,67	72,29	15,48	15,48	0,00	100,00%	-	72,29	72,29					
3.6	C2009	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	15,48	9,56	147,99	15,48	15,48	0,00	100,00%	-	147,99	147,99					
4 FUNDAÇÕES										R\$ 5.979,95	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95				
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95	11,14	11,14	0,00	100,00%	-	5.979,95	5.979,95					
5 ESTRUTURA										R\$ 11.927,24	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.927,24	R\$ 11.927,24				
5.1	93304	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	90,80	81,02	7.356,62	90,80	90,80	0,00	100,00%	-	7.356,62	7.356,62					
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	58,76	545,29	9,28	9,28	0,00	100,00%	-	545,29	545,29					
5.3	C0016	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.052,20	114,52	114,52	0,00	100,00%	-	2.052,20	2.052,20					
5.4	C0017	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77	42,87	42,87	0,00	100,00%	-	671,77	671,77					

Antonio Fco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RPRDIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060.1851790

Valdir Rodrigues Duarte
Engenheiro Civil
CREA-CE: 341920
RFB: 0018513044


BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			 REALIZA <small>CONSTRUTORA LTDA</small>		MEDIÇÃO Nº 05			CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$ 1.547.912,67					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024	ADITIVO:	R\$ -	VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.547.912,67					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 85.567,60	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 552.333,88	SALDO:	R\$ 995.578,79
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	983,23		1,86	1,86	0,00	100,00%	-	983,23	983,23			
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13		1,86	1,86	0,00	100,00%	-	318,13	318,13			
6 MURETA						R\$ 11.988,36					100,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.988,36	R\$ 11.988,36			
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	132,93	6.167,95		46,40	46,40	0,00	100,00%	-	6.167,95	6.167,95			
6.2	C0076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	92,80	7,84	727,55		92,80	92,80	0,00	100,00%	-	727,55	727,55			
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86		92,80	92,80	0,00	100,00%	-	5.092,86	5.092,86			
7 MURO						R\$ 94.953,28					93,00%	R\$ 0,00	R\$ 88.255,85	R\$ 88.255,85			
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	251,52	350,89	88.255,85		251,52	251,52	0,00	100,00%	-	88.255,85	88.255,85			
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	8,80	724,29	6.379,75		0,00	0,00	8,80	0,00%	-	-	-			
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68		0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
8 PAVIMENTAÇÃO						R\$ 80.975,24					99,00%	R\$ 0,00	R\$ 79.855,24	R\$ 79.855,24			
8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	113,84	2.732,16		24,00	24,00	0,00	100,00%	-	2.732,16	2.732,16			
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	31.915,20		480,00	480,00	0,00	100,00%	-	31.915,20	31.915,20			
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. S X	M2	7,36	83,96	617,95		7,36	7,36	0,00	100,00%	-	617,95	617,95			
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44		576,00	576,00	0,00	100,00%	-	7.165,44	7.165,44			
8.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62	20.299,01		38,40	38,40	0,00	100,00%	-	20.299,01	20.299,01			
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	171,04	6.567,94		38,40	38,40	0,00	100,00%	-	6.567,94	6.567,94			
8.7	11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00		0,00	0,00	640,00	0,00%	-	-	-			
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FLURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	H	30,00	9,13	273,90		30,00	30,00	0,00	100,00%	-	273,90	273,90			
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20X10X5)CM ESMPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	60,71	7.168,03		118,07	118,07	0,00	100,00%	-	7.168,03	7.168,03			

Ambrozo Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 480, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (86) 9 9608 7436. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA24H@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Medição realizada em 05/02/2024
E.O. Condição de Serviço
AF. 08/2015/244

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08						MEDIÇÃO Nº 05			CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$ 1.547.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									PERÍODO DOS SERVIÇOS:			ADITIVO:	R\$ -				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											11/01/2024 A 05/02/2024			VALOR TOTAL SERV.			R\$ 1.547.912,67
											DATA DE EMISSÃO:			VALOR DA MEDIÇÃO			R\$ 85.567,60
											segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024			MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$ 552.333,88
														SALDO:			R\$ 995.578,79
8.10	C0365	BAUQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61		103,20	103,20	0,00	100,00%	-	3.115,61	3.115,61			
9	ALAMBRADO					R\$ 94.128,16			100,00%			R\$ 0,00	R\$ 94.128,16	R\$ 94.128,16			
9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO)	UN	2,00	2.037,91	4.075,82		2,00	2,00	0,00	100,00%	-	4.075,82	4.075,82			
9.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	334,27	90.052,34		269,40	269,40	0,00	100,00%	-	90.052,34	90.052,34			
10	PINTURA					R\$ 5.157,81			0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	92,80	26,36	2.446,21		0,00	0,00	92,80	0,00%	-	-	-			
10.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, F = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60		0,00	0,00	271,16	0,00%	-	-	-			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 28.244,22			16,00%			R\$ 0,00	R\$ 4.504,20	R\$ 4.504,20			
11.1	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00		0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-			
11.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	1.126,05	4.504,20		4,00	4,00	0,00	100,00%	-	4.504,20	4.504,20			
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08		0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm. CABARRAMENTO	UN	1,00	342,57	342,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32		0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-			
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33		0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94		0,00	0,00	61,76	0,00%	-	-	-			
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	29,05	1.832,47		0,00	0,00	63,08	0,00%	-	-	-			
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	39,73	375,05		0,00	0,00	9,44	0,00%	-	-	-			
11.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	11,69	12,62	147,53		0,00	0,00	11,69	0,00%	-	-	-			
11.12	C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04		0,00	0,00	516,00	0,00%	-	-	-			
11.13	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51		0,00	0,00	78,60	0,00%	-	-	-			
11.14	C3504	CANHA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X20X60 cm	UN	7,00	199,62	1.397,34		0,00	0,00	7,00	0,00%	-	-	-			

André Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PRDZIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 480, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO 1881 9908-7656. E-MAIL CONSTRUTORA@REALIZA0419@GMAIL.COM

RICARDO EZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RICARDO EZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA


BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			REALIZA			MEDIÇÃO Nº 05		CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									PERÍODO DOS SERVIÇOS:		ADITIVO:	R\$	-
									11/01/2024 A 05/02/2024		VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
									DATA DE EMISSÃO:		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60
									segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024		MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88
											SALDO:	R\$	995.578,79
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE													
11.15	C2090	QUADRO PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.16	C1803	MURETA C/ TUDOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUND.ÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54	0,00	0,00	1,80	0,00%	-	-	-
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	933,45	933,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	39,28	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00	13,42	40,26	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-
11.21	16432	CAIXA DE EMBUSTR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-
11.22	10815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	100,80	1,99	200,59	0,00	0,00	100,80	0,00%	-	-	-
12	BANHEIROS			R\$ 39.902,02			29,00%			R\$ 0,00	R\$ 11.726,45	R\$ 11.726,45	
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 72,43			100,00%			R\$ 0,00	R\$ 72,43	R\$ 72,43	
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,73	72,43	9,37	9,37	0,00	100,00%	-	72,43	72,43
12.2	MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 518,30			100,00%			R\$ 0,00	R\$ 518,30	R\$ 518,30	
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,46	84,44	207,72	2,46	2,46	0,00	100,00%	-	207,72	207,72
12.2.2	93382	ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	0,69	32,85	22,67	0,69	0,69	0,00	100,00%	-	22,67	22,67
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	2,43	118,48	287,91	2,43	2,43	0,00	100,00%	-	287,91	287,91
12.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			R\$ 8.434,68			82,00%			R\$ 0,00	R\$ 6.935,76	R\$ 6.935,76	
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	0,64	23,23	14,87	0,64	0,64	0,00	100,00%	-	14,87	14,87
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	101,17	101,17	0,00	100,00%	-	1.812,97	1.812,97
12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	497,84	31,77	31,77	0,00	100,00%	-	497,84	497,84
12.3.4	C0842	CONCRETO PIVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	1.020,24	1,93	1,93	0,00	100,00%	-	1.020,24	1.020,24
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	0,84	0,84	0,00	100,00%	-	143,67	143,67
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60	1,09	1,09	0,00	100,00%	-	315,60	315,60
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. SX	M2	24,83	126,08	3.130,57	24,83	24,83	0,00	100,00%	-	3.130,57	3.130,57

Antônio Froilano Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE CE.
CONTATO: (88) 9.9908.7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA29@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 06.01.951.790

YARA DIAS DOS SANTOS
Eng. Civil CREA-CE: 641920
RNE: 0010515047


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 <p>REALIZA CONSTRUTORA</p>		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-	
						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67	
										VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										VALOR DA MEDIÇÃO MEDIDA ACUMULADA:	R\$	85.567,60	
										SALDO:	R\$	995.578,79	
12.3.8	C451	LAME PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	159,97	1.498,92	0,00	0,00	9,37	0,00%	-	-	-
12.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						R\$ 4.199,96			100,00%		R\$ 0,00	R\$ 4.199,96	R\$ 4.199,96
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	44,71	75,88	3.392,59	44,71	44,71	0,00	100,00%	-	3.392,59	3.392,59
12.4.2	C4932	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍDULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	776,32	807,37	1,04	1,04	0,00	100,00%	-	807,37	807,37
12.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						R\$ 8.187,22				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	114,38	2.013,09	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-
12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,60	11,14	196,06	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR 1:3 ESP=5mm P/ TETO	M2	7,59	15,39	116,81	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/	M2	7,59	45,95	348,76	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	M2	89,42	7,84	701,05	0,00	0,00	89,42	0,00%	-	-	-
12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	54,88	3.941,48	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-
12.5.7	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	17,60	49,43	869,97	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	-
12.6 SISTEMA DE PISOS						R\$ 1.700,74				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	59,58	452,21	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP=3cm	M2	7,59	28,34	215,10	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	7,59	108,86	826,25	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	11,14	84,55	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLOINHO (20X10X5)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	60,71	122,63	0,00	0,00	2,02	0,00%	-	-	-

Antônio Foz Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851780

Valdeir Antônio de Espírito
Eng. CIVIL 058-02-04109
RUA JOSE DE CARVALHO


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA REALIZANDO O SEU SONHO		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67
										MEDIDA ACUMULADA:				R\$	552.333,88	
										SALDO:				R\$	995.578,79	
12.7	SISTEMA DE COBERTURA			R\$ 1.962,25			0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.7.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADERAMENTO)	M2	7,04	154,15	1.085,22	0,00	0,00	7,04	0,00%	-	-				
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	354,94	0,00	0,00	2,51	0,00%	-	-				
12.7.3	C2149	RUIFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	43,17	325,50	0,00	0,00	7,54	0,00%	-	-				
12.7.4	C0662	CAIHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	0,00	0,00	4,14	0,00%	-	-				
12.8	ESQUADRIAS			R\$ 2.504,08			0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	2,94	724,29	2.129,41	0,00	0,00	2,94	0,00%	-	-				
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59	307,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-				
12.8.3	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,64	105,45	67,49	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-				
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS			R\$ 1.558,69			0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	7,59	17,99	136,54	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-				
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	71,82	15,88	1.140,50	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-				
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65	0,00	0,00	5,88	0,00%	-	-				
12.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 10.658,93			0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 518,58			0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39	0,00	0,00	1,62	0,00%	-	-				
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	15,80	9,51	150,26	0,00	0,00	15,80	0,00%	-	-				
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	9,45	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-				
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1.1/4")	M	0,66	21,98	14,51	0,00	0,00	0,66	0,00%	-	-				
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-				

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA13@GMAIL.COM

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941029
RNDZ 0310515844


BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.947.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.947.912,67
										VALOR DA MEDIÇÃO				R\$	85.567,60	
										MEDIÇÃO ACUMULADA:				R\$	552.333,88	
										SALDO:				R\$	995.578,79	
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	35,57	35,57	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.8	103941	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,09	26,09	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,65	6,65	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.10	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,20	10,20	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,31	8,31	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,89	9,89	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,25	14,25	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.14	3515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,39	9,39	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,73	7,73	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.16	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,68	21,68	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			
12.10.1.17	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,69	12,69	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-			

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA2@GMAIL.COM

RICARDO CARLOS P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0318515344

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		 REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67
										MEDIDA DA MEDIÇÃO				R\$	85.567,40	
										MEDIÇÃO ACUMULADA:				R\$	552.333,88	
										SALDO:				R\$	995.578,79	
12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ 6.634,53			0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	22,55	57,28	0,00	0,00	2,54	0,00%	-	-				
12.10.2.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,94	15,56	170,23	0,00	0,00	10,94	0,00%	-	-				
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,64	44,13	337,15	0,00	0,00	7,64	0,00%	-	-				
12.10.2.4	C3886	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	61,59	123,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-				
12.10.2.5	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	1,00	197,61	197,61	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-				
12.10.2.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,83	19,66	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-				
12.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	13,53	54,12	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-				
12.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	12,94	77,64	0,00	0,00	6,00	0,00%	-	-				
12.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-				
12.10.2.10	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	23,09	46,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-				
12.10.2.11	C1761	LUNA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-				
12.10.2.12	C1758	LUNA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,63	94,52	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-				
12.10.2.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-				
12.10.2.14	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	57,13	57,13	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-				

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

CONSTRUTORA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 9.908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CELAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yvone Ribeiro de Rezende
Eng. Civil - CREA - CE: 541929
RFP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA CONSTRUTORA LDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 05				CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2024 A 05/02/2024				ADITIVO:	R\$	-	
						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024				VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.547.912,67	
										VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	85.567,60	
										MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	552.333,88	
										SALDO:	R\$	995.578,79	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE													
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.3 LOUÇAS METALS E ACESSÓRIOS						R\$ 3.505,82				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.3.1	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	361,34	361,34	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
12.10.3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	940,50	1.881,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	56,89	113,78	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-
12.11 SERVIÇOS FINAIS						R\$ 104,74				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41214	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	13,80	104,74	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-
13 DIVERSOS						R\$ 11.184,08				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	4.447,94	4.447,94	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.700,29	2.700,29	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	4.035,85	4.035,85	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
14 SERVIÇOS FINAIS						R\$ 912,63				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48	912,63	0,00	0,00	616,64	0,00%	-	-	-

Antonio Fco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0002851790

Yulio RIBEIRO
Eng. Civil CREA - CE 341020
RNP: 0016515046



BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 05	CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67	
					ADITIVO:	R\$	-	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					PERÍODO DOS SERVIÇOS:	R\$	1.547.912,67	
					11/01/2024 A 05/02/2024	R\$	85.567,60	
					DATA DE EMISSÃO:	R\$	552.333,88	
					segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024	R\$	995.578,79	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL	CONTR. ATUAL:	R\$ 394.363,77	VALOR MEDIÇÃO C/ BDI: R\$ 42.448,96	VALOR ACUMULADO C/ BDI: R\$ 123.408,72	ACUMULADO	TOTAL GERAL DO BOLETIM C/ BDI (26,85%) R\$		
						R\$ 85.567,60	R\$ 466.766,28	
							R\$ 552.333,88	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM	CONTR. ATUAL:	R\$ 387.879,39	VALOR MEDIÇÃO C/ BDI: R\$ -	VALOR ACUMULADO C/ BDI: R\$ -	ACUMULADO	PORC.GERAL DOS SERV/CONCLUÍDOS		
						5,53%	30,15%	
							35,68%	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ	CONTR. ATUAL:	R\$ 381.362,57	VALOR MEDIÇÃO C/ BDI: R\$ 43.118,64	VALOR ACUMULADO C/ BDI: R\$ 113.292,81	ACUMULADO	(OITENTA E SEIS MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO	CONTR. ATUAL:	R\$ 394.306,94	VALOR MEDIÇÃO C/ BDI: R\$ -	VALOR ACUMULADO C/ BDI: R\$ 315.632,35	ACUMULADO			
		R\$ 1.547.912,67	R\$ 85.567,60	R\$ 552.333,88	ACUMULADO			
							35,68%	

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

Yulio Rodrigues Barreto
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0018515044



REALIZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023


PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

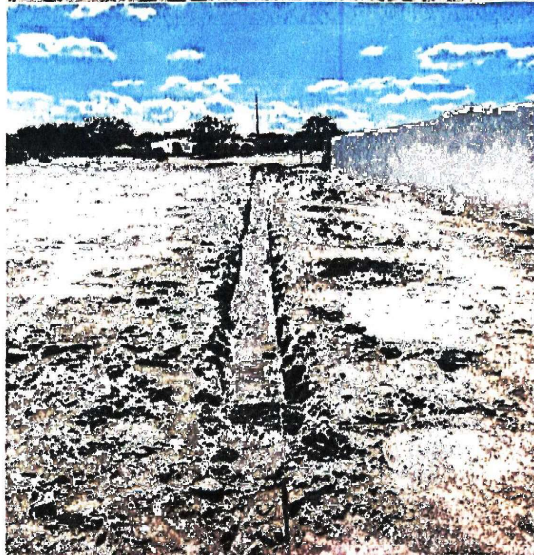


Volnei Diógenes Gazeira
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0518515244




Volnei Diógenes Gazeira
CPF: 914.201.214-9
Sócio Diretor

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 450, SALA 01, IOAD PAULO II, JAGUARIBE-CE

CONTATO: (85) 9 9909-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


REALIZA CONSTRUTORA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



REALIZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




Yukia Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RECIBO DE RECEBIMENTO DE VALORES
N.º 11/01/2024
VALOR R\$ 1.000,00
DATA 11/01/2024

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790
RNP: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




RICARDO NAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

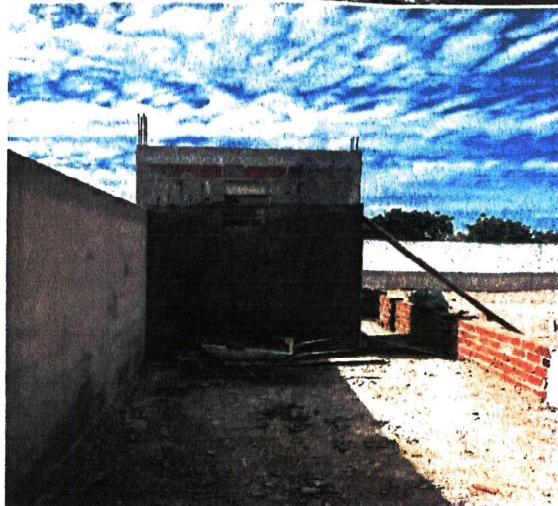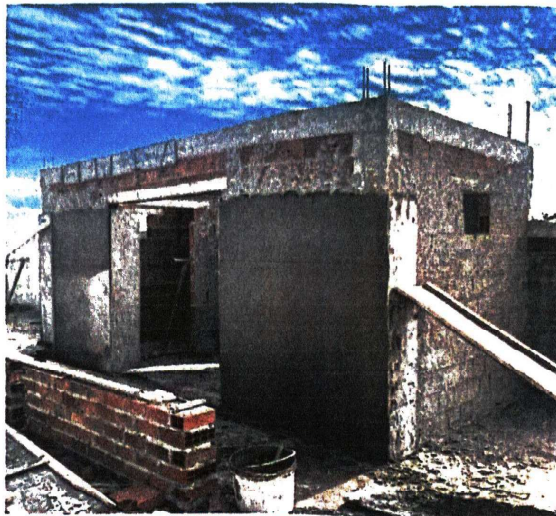


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

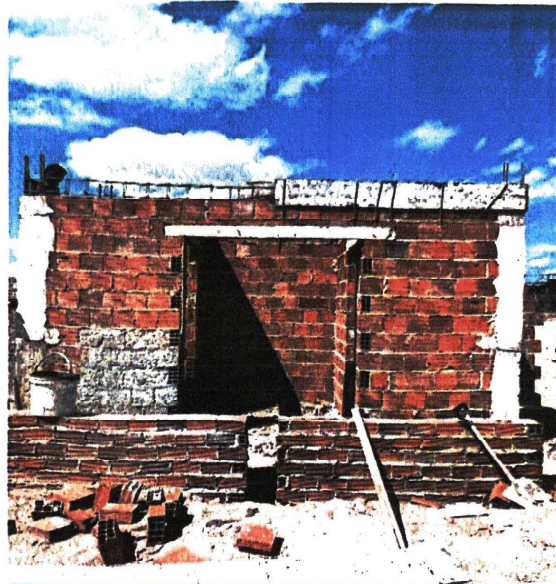


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844




SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-01
R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTADO Nº 430, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
Sócio Diretor
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

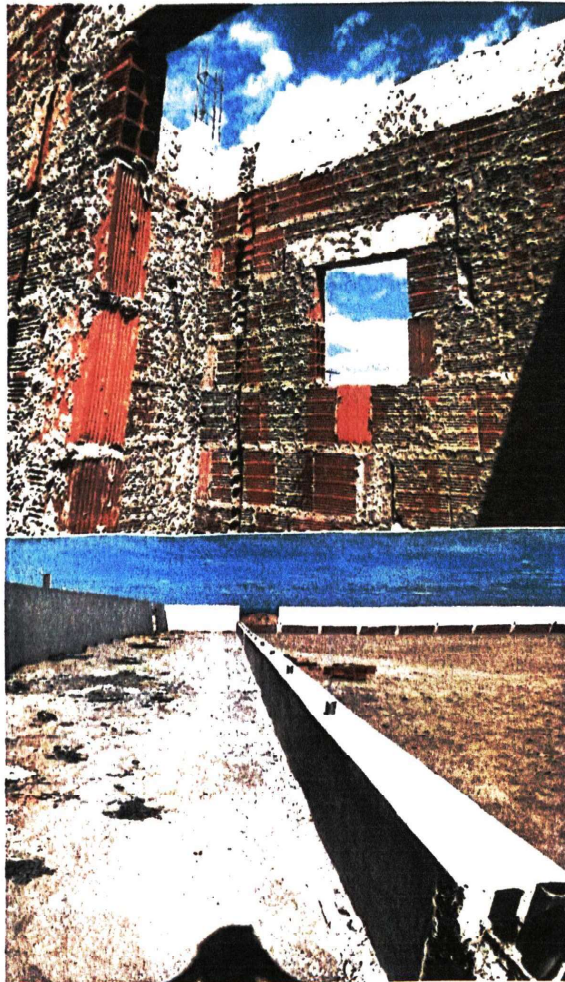




Antônio Fcy Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2024 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE MURO
- ESCAVAÇÃO DE VALA
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

EXECUÇÃO DE CHAPISCO
EXECUÇÃO DE REBOCO


Antônio Fca. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.

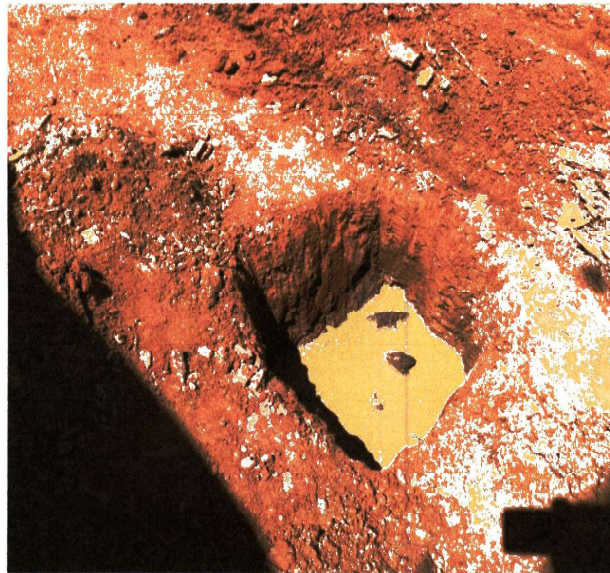


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CIVIL - CREA - CE 301602
RNP: 0818515143

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


PROJ. DE
SEC. DE
CIVIL - Nº 11.111-11111
CPF: 914.201.213-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Volto Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
RUA: 11786181-34

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yulio Cláudio de Sousa
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0818515344

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0661851790

Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0818515344

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606. E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yukio Elias de Oliveira
Eng. Civil - CREA - 06181625
RNP: 0818515344

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Elias de Oliveira
Eng. Civil - CREA - 06181625
RNP: 0818515344

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yulio T. de Souza
Eng. Civil CREA - CE 341.929
RNP: 0518515344

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
Eng. Civil - CRP - Ce 311929
RAT 0313516304

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0661851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil - CRP - Ce 311929
RAT 0313516304



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Antônio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-93
Sócio Diretor

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-93
Sócio Diretor

RICARDO CEARA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 – LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.

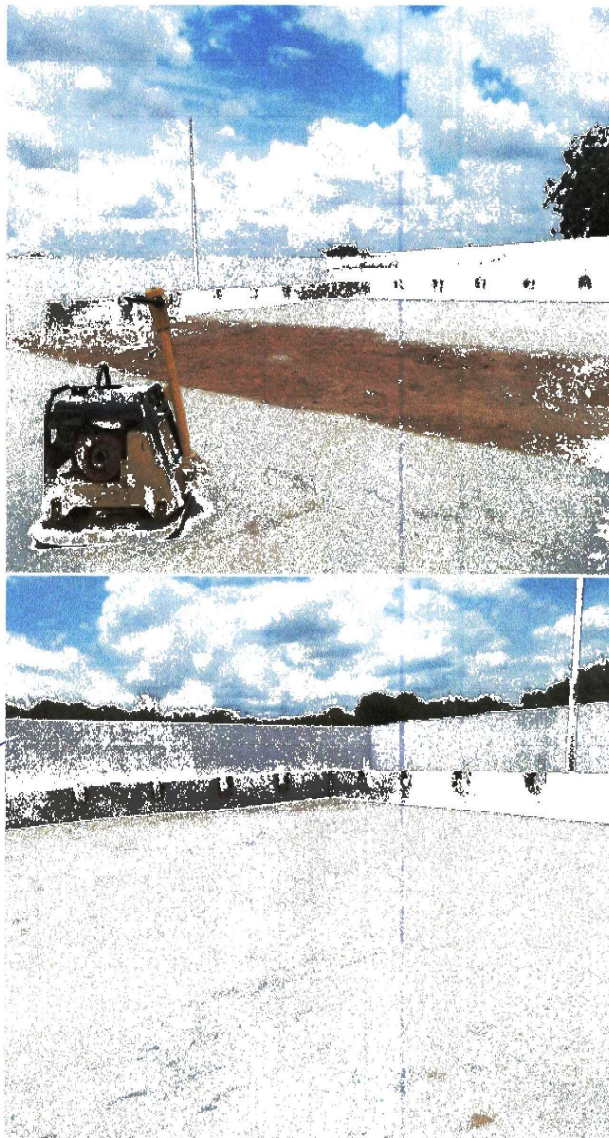

Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CRIA-CE: 0801851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.

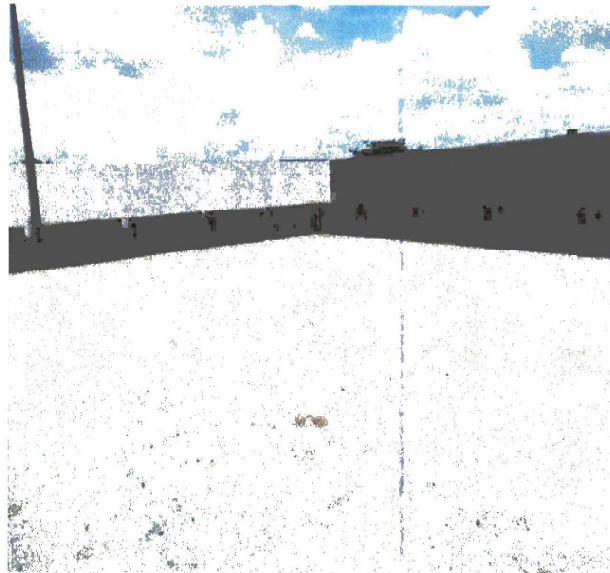


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


Eng. Civil
CREA-CE: 0601851790


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Eng. Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9 9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yádiva Diógenes de Oliveira
Eng. OBRAS - CE 04929
RNP: 0018515044

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9 9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª



BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.

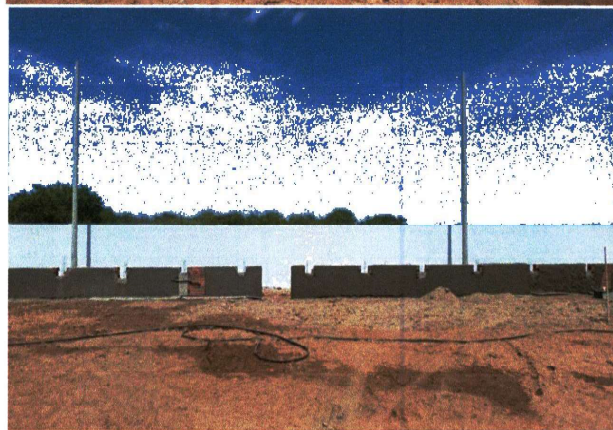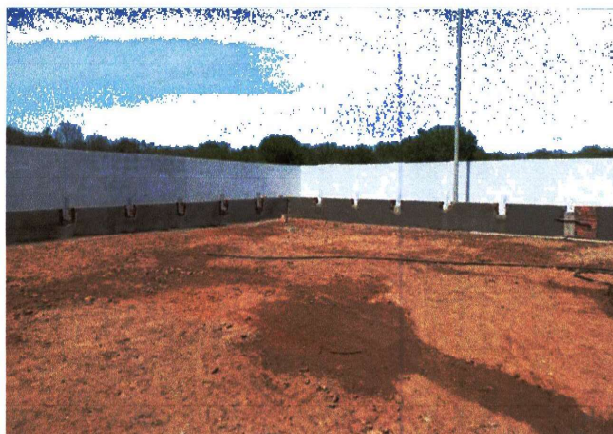


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yulda Márcia dos Anjos
Eng. Civil CREA - CE 341920
RNP: 0618515044


Fco. Diógenes de Oliveira
Sócio Diretor
CPF: 914.201.213-91

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2023 – 05/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE MURO
- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
- EXECUÇÃO DE ALVENARIAS
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
- INSTALAÇÃO DE POSTES
- REGULARIZAÇÃO COM PÓ DE PEDRA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO
- EXECUÇÃO DE REBOCO


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yúdice Dias
Eng. Civil
RNP: 0518518344


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 05/02/23	FISCAL: YUKIO DIÓGENES BEZERRA		
Nº DO CONTRATO: 20.03.02/2023	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA	PRAZO AO CONTRATO:	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 27/10/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 27/01/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO 11/01/2024 A 05/02/2024	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL	32,11%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM	0,00%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ	29,71%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO	80,05%	<input type="checkbox"/> MAU	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 35,68%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 05 de fevereiro de 2024.			

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA/CE 341929
 RNP: 6618515844

(Handwritten signature)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 PONTA CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO - CE
 CEP: 745347-003-49



REALIZA

CONSTRUTORA LTDA

REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – CNPJ: 07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 85.567,60 (OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)**, REFERENTE REF. A 5ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

NFSº.0015	VALOR (R\$)
Valor Bruto	85.567,60
ISS Retido	2.567,03
VALOR LÍQUIDO	83.000,57

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: NUBANK

AG: 0001

CONTA: 63926258-9

CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, _____ de Fevereiro de 2024.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Dados: 2024.02.06 08:00:54
-03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA

Sócio – Administrador

CPF: 914.201.213-91

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVICO


Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.02/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
Contratado		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Endereço		
RUA PROJETADA 2 – LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
35.851.118/0001-08		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias


Jaguaribe – CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.10.27 16:32:01
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Janeiro de 2024 até o dia 30 de Abril de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.


CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.


E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe/CE, 31 de Janeiro de 2024.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA**


Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345399

02.

CPF: 94152261304



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.97166/78 Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Data do cadastramento 09/11/2023 17:28

Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona Zona Rural ART CE20231308320 RRT CIB 0000000-0 Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 27/10/2023 CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

Situação da obra

Situação Ativa Data 27/10/2023

Endereço

País BRASIL Município JAGUARIBE UF CE CEP 63.475-000

Bairro ZONA RURAL Logradouro SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO Número SN

Responsável

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 35.851.118/0001-08 Vínculo Construtora

Data de início da responsabilidade 27/10/2023 Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	0,01 m ²	0,01 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 0,01 m²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA 594	
DATA APROVAÇÃO 27/10/2023	
PROCESSO	VALIDADE 31/12/2024

ENDEREÇO SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR CPF:	CREA/CAU 00A1062301	ART RRT 12883184
--	-------------------------------	----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO CPF:	CREA/CAU RNP 0601851790	ART CE 20231308320
--	-----------------------------------	------------------------------

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
594	616,64 m²	616,64 m²	0,00 %	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000


VALOR DA OBRA 1.547.912,67	DATA DO INÍCIO DA OBRA 06/11/2023
--------------------------------------	---


DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 21/01/2024
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO
 JAGUARIBE, 08 DE Novembro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361N3070000594


 Scaneie para validar este documento


Rafael Gomes Diógenes
 Secretário de Infraestrutura,
 CPMU de Jaguaribe
 PARECER Nº 771/2023 CPF 602.311.063-05

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO 1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241360580

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231311061

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601851790**

Registro: **7030D CE**

Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registro : **0010452630-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.02/2023**

Celebrado em: **31/01/2024**

Valor: **R\$ 1.547.912,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO

Nº: **S/N**

Complemento: **ZONA RURAL**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/01/2024**

Previsão de término: **30/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **67.900444, 38.621982**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **SEDE**

Proprietário: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.851.118/0001-08**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

4,00

un

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
Aditivo: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO CEZAR PESSOA
PINHEIRO:14428954387

Assinado de forma digital por RICARDO
CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387
Data: 2024.02.06 15:13:48 -03'00'

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **06/02/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bxCB8
Impresso em: 06/02/2024 às 15:07:49 por: , ip: 187.19.232.100

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



CO. ELDIR CARVALHO BARROSO
CPF: 030.400.110-00
Cidade: Jaguaribe - Ceará
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
CEP: 63475000



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241342710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0618515844

Registro: 341929CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASILÉIA**

UF: **AC**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/01/2022**

Previsão de término: **29/02/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xxBad
Impresso em: 09/01/2024 às 09:58:08 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silesc.com.br/publico/>, com a chave: x08Bad
Impresso em: 09/01/2024 às 09:58:08 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241342710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/01/2024

[Handwritten Signature]
YUKO DOUGENIS BEZERRA - CPF: 051.990.083-00
MUNICÍPIO DE JACUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jacuaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sisc.com.br/publico/>, com a chave: xxBad
Impresso em: 09/01/2024 às 09:58:08 por: ip: 177.124.16.26

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800
faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804





REALIZA

CONSTRUTORA LTDA

REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 35.851.118/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 06 de Fevereiro de 2024.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:358511180001
08

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Dados: 2024.02.06 08:01:16
-03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA

Sócio – Administrador

CPF: 914.201.213-91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 35.851.118/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:27 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **88FB.D9B8.C7B6.F123**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400494775

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061249394
CNPJ / CPF: 35851118000108
RAZÃO SOCIAL: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/01/2024 ÀS 11:08:32
VÁLIDA ATÉ 09/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000530

Razão Social

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000859379

C.N.P.J.: 35851118000108

Bairro

JOAO PAULO II

CEP

63475000

Localizado R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 SALA 1

Documento

C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000530/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 07/02/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000530





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000530


DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 07/02/24
JAGUARIBE-CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2023**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 04/01/24 às 09:28:41



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.851.118/0001-08
Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2023 a 26/01/2024

Certificação Número: 2023122803053575654969

Informação obtida em 09/01/2024 11:06:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.851.118/0001-08
Certidão nº: 2157611/2024
Expedição: 09/01/2024, às 11:08:01
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.851.118/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 2

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08
 Mês/Ano: 01/2024
 Emissão: 05/02/2024
 Estabelecimento: Matriz - 35.851.118/0001-08
 Tomador: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CEI: 9001697166/78
 Lotação: Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS
 Vínculo: Empregado

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000007 ANTONIO MATHEUS BELO FREITAS

Cargo: Pedreiro

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
310 INSS	9%		117,31
		1.538,81	117,31

FGTS: 123,10 Líquido a receber: 1.421,50

Data: / / Assinatura:

Antonio Matheus Belo Freitas

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000003 CLAUDIANO SILVA MARIANO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310 INSS	7,5%		105,90
		1.412,00	105,90

FGTS: 112,96 Líquido a receber: 1.306,10

Data: / / Assinatura:

CLAUDIANO SILVA MARIANO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000005 DIOGO RIBEIRO DE BARROS

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310 INSS	7,5%		105,90
		1.412,00	105,90

FGTS: 112,96 Líquido a receber: 1.306,10

Data: / / Assinatura:

DIOGO RIBEIRO DE BARROS

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR

Cargo: Pedreiro

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
310 INSS	9%		117,31
		1.538,81	117,31

FGTS: 123,10 Líquido a receber: 1.421,50

Data: / / Assinatura:

Francisco Barros Junior

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000008 NORMANDIO NUNES SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310 INSS	7,5%		105,90
		1.412,00	105,90

FGTS: 112,96 Líquido a receber: 1.306,10

Data: / / Assinatura:

Normandio Nunes Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Continua...

Folha de Pagamento

Folha: 2 de 2

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 05/02/2024
Estabelecimento: Matriz - 35.851.118/0001-08
Tomador: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CEI: 9001697166/78
Lotação: Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS
Vínculo: Empregado

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000006	PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ					
	Cargo: Pedreiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura: Paulo Roberto Diógenes Muniz			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (6 empregados)

011 Salário-Base	8.852,43	
310 INSS		669,63
	8.852,43	669,63
FGTS: 708,18	Líquido a receber:	8.182,80
BC-INSS: 8.852,43	BC-FGTS: 8.852,43	

Fim

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000007 ANTONIO MATHEUS BELO FREITAS		Cargo Pedreiro		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 16108257696	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000008 NORMANDIO NUNES SILVA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 20948547124	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 01/11/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000003 CLAUDIANO SILVA MARIANO		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 20113078719	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR		Cargo Pedreiro		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 16050634387	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura _ / _ / _		
Empresador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000005 DIOGO RIBEIRO DE BARROS		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 27162612020	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura _ / _ / _		
Empresador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000006 PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ		Cargo Pedreiro		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 20747252267	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/02/2024 - 19h10

Nº de controle: 291.139.186.450.472.263 | Autenticação bancária: 021.980.062

net empresa

Conta de débito: **Agência: 5394 | Conta: 11983-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA | CNPJ: 35.851.118/0001-08**

Código de barras: **8587000007-3 08190180240-5 20768518083-2 58511180001-4**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **835851118**

CNPJ/CEI: **35.851.118/0001-08**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **01/2024**

Data de validade: **07/02/2024**

Data de débito: **05/02/2024**

Valor do pagamento: **R\$ 708,19**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente REALIZA CONSTRUTORA LTDA, junto à Agência 5394, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

KnD*bxRr KQI2m495 lNzqci5n EG#I@26n BNaVMbUc N2ZVW7Sm KOPXt9Ho DJ?yBW#X
P6Ra?srC 5akodsxn 7KjiJJju XZuMgY3L 5Sgi9LBA #okXQ37C vXAxue?Z 96YXUnWf
ZhPvWyWm DRdmy5HA 6?H8BfL9 QYUFRfrK 7aZrg7Bd ts?WgwE3 00500524 00780008

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 17:10:19

01- RAZÃO SOCIAL/NOME REALIZA CONSTRUTORA LTDA				02- DDD/TELEFONE (0088)99087606
03- FPAS 507	04- SIMPLES 2	05- REMUNERAÇÃO 8.852,43	06- QTDE TRABALHADORES 6	07- ALIQUOTA FGTS 8
08- CÓD RECOLHIMENTO 150	09- ID RECOLHIMENTO 018080-1	10- INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.851.118/0001-08	11- COMPETÊNCIA 01/2024	12- DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13- DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 708,19	14- ENCARGOS 0,00	15- TOTAL A RECOLHER 708,19
---	----------------------	--------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85870000073 081901802405 207685180832 585111800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 17:10:19

01- RAZÃO SOCIAL/NOME REALIZA CONSTRUTORA LTDA				02- DDD/TELEFONE (0088)99087606
03- FPAS 507	04- SIMPLES 2	05- REMUNERAÇÃO 8.852,43	06- QTDE TRABALHADORES 6	07- ALIQUOTA FGTS 8
08- CÓD RECOLHIMENTO 150	09- ID RECOLHIMENTO 018080-1	10- INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.851.118/0001-08	11- COMPETÊNCIA 01/2024	12- DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13- DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 708,19	14- ENCARGOS 0,00	15- TOTAL A RECOLHER 708,19
---	----------------------	--------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85870000073 081901802405 207685180832 585111800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 35.851.118/0001-08	Razão Social REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.24039.3257690-8	Pagar este documento até 09/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183503598			Valor Total do Documento 2.966,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	653,07	109,91	12,86	775,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.97166/78	1.715,28	288,68	33,79	2.037,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:90.016.97166/78	128,64	21,65	2,53	152,82
Totais		2.496,99	420,24	49,18	2.966,41

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/02/2024 15:59:44

85890000029 8 66410385240 3 40071624039 0 32576908763 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000029 8	66410385240 3	40071624039 0	32576908763 3

CNPJ: 35.851.118/0001-08
Número: 07.16.24039.3257690-8
Pagar até: 09/02/2024
Valor: 2.966,41

Pague com o PIX




Comprovante de Pagamento

DARFValor total do pagamento: **R\$ 2.966,41**

Somos uma Instituição de Pagamento que realiza diversas transações em nosso próprio sistema. Seu pagamento é liquidado pelo FitBank ou por outra instituição parceira. Saiba mais em www.fitbank.com.br/hub-de-pagamentos

Dados do pagamento - DARF

 bradesco net empresa	Descritivo de Transação Bancária Data da operação: 08/02/2024 Controle/Protocolo: ED3523EC-B083-44D3-9C56-F306DBDEB5B4 Autenticação bancária: 25826354
Conta de débito: Agência: 0504 Conta: 0482242-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Bradesco	
Código de barras: 85890000298664103852403400716240390325769087633 Concessionária: DARF Valor: 2.966,41 Data de débito: 08/02/2024	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco	

Transação liquidada por BradescoControle/Protocolo **ED3523EC-B083-44D3-9C56-F306DBDEB5B4**Protocolo interno **0228e545052046129791a36f5d5dd682**Comprovante gerado em **08/02/2024**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 35.851.118/0001-08	Razão Social REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24039.3264780-5	Pagar este documento até: 09/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191598080			Valor Total do Documento 2.678,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	653,07	40,94	6,53	700,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.97166/78	1.715,28	107,54	17,15	1.839,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.016.97166/78	128,64	8,06	1,28	137,98
Totais		2.496,99	156,54	24,96	2.678,49

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/02/2024 16:01:28

85800000026 7 78490385240 9 40071624039 0 32647805790 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7	78490385240 9	40071624039 0	32647805790 6	CNPJ: 35.851.118/0001-08	
				Número: 07.16.24039.3264780-5	
				Pagar até: 09/02/2024	
				Valor: 2.678,49	

Pague com o PIX

Comprovante de Pagamento

DARFValor total do pagamento: **R\$ 2.678,49**

Somos uma Instituição de Pagamento que realiza diversas transações em nosso próprio sistema. Seu pagamento é liquidado pelo FitBank ou por outra instituição parceira. Saiba mais em www.fitbank.com.br/hub-de-pagamentos

Dados do pagamento - DARF

bradesco
net empresa

Descritivo de Transação Bancária

Data da operação: 08/02/2024

Controle/Protocolo: 4210F5EA-16BA-4B06-88F5-7D1C1D680434 | Autenticação bancária: 25828744

Conta de débito: Agência: 0504 | Conta: 0482242-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Bradesco

Código de barras: 858000000267784903852409400716240390326478057906

Concessionária: DARF

Valor: 2.678,49

Data de débito: 08/02/2024

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco

Transação liquidada por BradescoControle/Protocolo **4210F5EA-16BA-4B06-88F5-7D1C1D680434**Protocolo interno **f10fc9bf27a448a8a13c059f208b7e11**Comprovante gerado em **08/02/2024**



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/02/2024 17:13:36.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AaimfQYS5X100001.SFP é:

e165fa48-eec9-43fb-960b-62f4cbac74f5

Transmissor: MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 01/2024

NRA: AaimfQYS5X100001

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000073 081901802405 207685180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INSCRIÇÃO: 900169716678

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO MATHEUS BELO FREITAS	1.538,81	0,00	161.08257.69-6 0,00	27/10/2023	01		123,10	07152 0,00
CLAUDIANO SILVA MARIANO	1.412,00	0,00	201.13078.71-9 0,00	01/11/2023	01		112,96	07170 0,00
DIOGO RIBEIRO DE BARROS	1.412,00	0,00	271.62612.02-0 0,00	27/10/2023	01		112,96	07170 0,00
FRANCISCO BARROS JUNIOR	1.538,81	0,00	160.50634.38-7 0,00	27/10/2023	01		123,11	07152 0,00
NORMANDIO NUNES SILVA	1.412,00	0,00	209.48547.12-4 0,00	27/10/2023	01		112,96	07170 0,00
PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ	1.538,81	0,00	207.47252.26-7 0,00	27/10/2023	01		123,10	07152 0,00

*TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
8.852,43 0,00 0,00 687,63 708,19 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 17:10:19
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000073 081901802405 207685180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Nº DE CONTROLE: JQDSPrIdju10000-4
LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 BAIRRO: JOAO PAULO II
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

Nº ARQUIVO: AaimfQYSSX10000-1
INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900169716678

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	8.852,43	0,00	8.852,43	0,00
TOTAIS:	6	8.852,43	0,00	8.852,43	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Nº ARQUIVO: AaimfQYS5X10000-1
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
TOMADOR/OBRA: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Nº DE CONTROLE: JQDSPrIdjU10000-4 INSCRIÇÃO: 900169716678

LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 BAIRRO: JOAO PAULO II CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9908 7606 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	687.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	687.63
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 17:10:19
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000073 081901802405 207685180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: LZy1vD1NvCk0000-1 Nº ARQUIVO: AaimfQYS5X10000-1
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 BAIRRO: JOAO PAULO II CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	8.852,43	0,00	8.852,43	0,00
TOTAIS:	6	8.852,43	0,00	8.852,43	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 17:10:19
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000073 081901802405 207685180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA	Nº DE CONTROLE: LZy1vD1NvCk0000-1	Nº ARQUIVO: AaimfQYS5X10000-1
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0		INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1	BAIRRO: JOAO PAULO II	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000		CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	8.852,43
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
708,19	0,00	0,00	0,00	708,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: LZy1vD1NvCK0000-1 Nº ARQUIVO: AaimfQYS5X10000-1
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 BAIRRO: JOAO PAULO II CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9908 7606 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	687.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	687.63
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

HORA: 17:10:19

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Nº CONTROLE: LZy1vd1NvCk0000-1		Nº ARQUIVO: AaimfQYSSX10000-1	
COMP: 01/2024	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08			
LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1		BAIRRO: JOAO PAULO II		CNAE PREPONDERANTE: 4120400	
CIDADE: JAGUARIBE		UF: CE	CEP: 63475-000	TELEFONE: 88-99087606	CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		507	620	744	779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	687,63	0,00	0,00	0,00	687,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	687,63	0,00	0,00	0,00	687,63
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	687,63	0,00	0,00	0,00	687,63

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 081901802405 207685180832 585111800014

EMPRESA:REALIZA CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08 Nº ARQUIVO: AaimfQYS5X10000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
Nº CONTROLE: LZy1vD1NvCk0000-1

TOMADOR/OBRA : CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INSCRIÇÃO: 900169716678 Nº CONTROLE: JQDSPrIdju10000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ST P CENTRAL BRUM TAMANDUA E V JUAZEIRO SN ZONA RURAL JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.852,43	REM SEM 13º SALÁRIO	8.852,43
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	708,19
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.852,43	REM SEM 13º SALÁRIO	8.852,43
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	687,63	DEPÓSITO	708,19
VAL DEVIDO PREV SOC	687,63	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024

HORA: 17:10:19

PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 081901802405 207685180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
Nº ARQUIVO: AaimfQYS5X10000-1
Nº CONTROLE: LzylvD1NvCk0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLS: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.852,43	REM SEM 13º SALÁRIO	8.852,43
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	687,63	DEPÓSITO	708,19
VAL DEVIDO PREV SOC	687,63	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6
		TOTAL A RECOLHER	708,19

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 17:10:19

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	8.852,43
DEPÓSITO	708,19
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	708,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/02/2024
HORA: 17:10:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
REALIZA CONSTRUTORA LTDA			35.851.118/0001-08			2003	507
687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,63	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES





DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

jan/24

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
11/01/2024	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
35	55	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yukio Dionísio Dantas Eng. Civil - CREA - CE 341929 RRT - 0618815044			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 12/01/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 36	DIAS RESTANTES: 54	LIV/DIAR 001/2023 PAG: 01	MANHÃ	TARDE	NOITE
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukia Pinheiro
Eng. Civil CREA - CE 341923
RNP: 0018515344

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 13/01/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 37	DIAS RESTANTES: 53	LIV/DIAR 001/2023 PAG: 01	MANHÃ	TARDE	NOITE
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES



1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA




RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 041920
RNP: 0019510004



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
14/01/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
38	52	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
<p align="center">EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
DESCANSO SEMANAL						
<p align="center">ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
<p align="center">ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p align="center">COLABORADORES</p>						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
<p align="center">RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p align="center">RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yukio Dickson de Brito Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP 0618515246			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/01/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
39	51	001/2023	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ALVENARIA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yágor Augusto Pinheiro Eng. Civil - CREA - CE 041629 RNP: 031851524			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
16/01/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
40	50	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ALVENARIA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yukio Diógenes Ribeiro Eng. Civil CREA-CE 341920 RNB 251851834			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATO: 20.03.02/2023							
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO				
17/01/2024	quarta-feira	90					
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
41	49	001/2023 PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE		
			001/2023				
			PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS							
EXECUÇÃO DE ALVENARIA							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO							
NÃO HOUE ACIDENTES							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO							
COLABORADORES							
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO				
 RICARDO CARLOS P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790				

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
18/01/2024	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
42	48	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ALVENARIA EXECUÇÃO DE MURO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790						

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
19/01/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
43	47	001/2023 PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ALVENARIA EXECUÇÃO DE MURO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515044			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
20/01/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
44	46	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA



RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO




RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




Yukio Diogenes da Silva
Eng. Civil - CREA-CE: 041628
RNP: CE10515246

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
21/01/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
45	45	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO NAZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yulio Dias Eng. Civil CREA-CE: 0601851790 RNP: 0618515345			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
22/01/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
46	44	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE MURO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO VIZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yulio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 041920 RNP: 0016515349			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
23/01/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
47	43	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 YULIO CÉSAR BEZERRA Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
24/01/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
48	42		BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yulio Dionísioes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341829
RNP 0618518344

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 25/01/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 49	DIAS RESTANTES: 41	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES



- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Dias dos Santos
Eng. Civil CREA-CE: 341929
RN: 0518518044

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 26/01/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 50	DIAS RESTANTES: 40	LIV/DIAR 001/2023 PAG: 01	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO LUIZ P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yukio Pinheiro de Brito Eng. Civil CREA - CE 341923 RNP: 0618515344			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 27/01/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 51	DIAS RESTANTES: 39	LIV/DIAR 001/2023 PAG: 01	MANHÃ	TARDE	NOITE
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES



- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA




RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yuric Fábio
Eng. Civil CREA - CE 0601022
RNP 001851504

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 28/01/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 52	DIAS RESTANTES: 38	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yulio Márcio dos Reis Eng. Civil - CREA - CE 060341009 RPP: 0018515044			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
29/01/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
53	37	001/2023	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yulio Diógenes Ozeirina Eng. Civil CREA-CE: 041929 RA: 00016518004			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 30/01/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 54	DIAS RESTANTES: 36	LIV/DIAR 001/2023 PAG: 01	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXECUÇÃO DE REBOCO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 066.1851790			 Yúlio Fábio Pinheiro Eng. CIVIL - CREA-CE: 066.1851790			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
31/01/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
55	35		BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE REBOCO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yulio Elias Pinheiro Eng. Civil CREA - CE 341528 RN: 0618515044			







DIÁRIO DE OBRA



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**



CONTRATO: 20.03.02/2023

fev/24

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 01/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 56	DIAS RESTANTES: 34	LIV/DIAR 001/2023 PAG: 01	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE REBOCO EXECUÇÃO DE REATERRO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yukio Diógenes Pereira Eng. Civil OAB - Ce 341520 RN: 0018518044			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<p align="center"><u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></p>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
02/02/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
57	33		BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
FERIADO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO MEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yukio Yamamoto Eng. Civil - CREA - CE 341929 RNP: 0618510344			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 03/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 58	DIAS RESTANTES: 32	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yulio Dias Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341023 RNP: 0610515344			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<p align="center"><u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
04/02/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
59	31	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Yulio Dionenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RN: 0818515844			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
05/02/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
60	30	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PO DE PEDRA
INSTALAÇÃO DE POSTES

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 6601851790


Yulio Diógenes de Oliveira
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0818615246
