

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 08.08.0001

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
05.08.0012	05/08/2024	08/08/2024	12.143,92

CREDOR

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	364,32
		Total da Retenção: (R\$) 364,32

HISTÓRICO

REFERENTE A 11º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 22 E AO PERÍODO DE 28/06/2024 A 17/07/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	080801	11.779,60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 08.08.0001
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
05080012	05/08/2024	GLOBAL	12.143,92	20.03.02/2023	20.03.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
08080001	12.143,92	12.143,92	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
08/08/2024	12.143,92	364,32	11.779,60

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	364,32

Total da Retenção: (R\$) 364,32

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 22 E AO PERÍODO DE 28/06/2024 A 17/07/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	080801	11.779,60

Jaguaribe, 8 de Agosto de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.08.0012

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
05/08/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023	20.03.02/2023	63662024
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	297.453,78	12.143,92	285.309,86

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	12.143,92	12.143,92
Total dos Itens: (R\$)					12.143,92

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05080012**. A(os) **5 de Agosto de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008153

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/08/2024	05.08.0012	12.143,92	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 07/08/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 12.143,92	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 22	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 07/08/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 07/08/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: rvyds5u2lot7af89bzjc6lkp3hw		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 22 E AO PERÍODO DE 28/06/2024 A 17/07/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	12.143,920	12.143,92	0

Jaguaribe, 7 de Agosto de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

Nº Empenho: 05080012 - Global

Nº Nota Fiscal: 22

Dt Emissão NF: 07/08/2024

Dt. Solicitação 07/08/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 28/06/2024 A 17/07/2024

Vir. Liquidação: R\$ 12.143,92 (DOZE MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1	1,00	12.143,92	12.143,92

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data



Emissão de comprovantes

G3310813513300131
08/08/2024 13:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.02
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08
VALOR: R\$ 11.779,60
DEBITO EM: 08/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: C.286.A96.B4C.ED5.88A



G331080959482964012
08/08/2024 10:02:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 639262589
CNPJ 35.851.118/0001-08
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.801
Valor 11.779,60
Destinação 0
Data transferência 08/08/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C286A96B4CED588A

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	08/08/2024 09:52:31
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	08/08/2024 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3370809474360031
08/08/2024 09:52:34

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	639262589
Conta Pagamento	0000
CNPJ	35.851.118/0001-08
Nome favorecido	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	11.779,60
Data transferência	08/08/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **346026173**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 63662024

Data: 05/08/2024

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 12.143,92

Histórico

REFERENTE A 11º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1,00	12.143,92	12.143,92

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000000022
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA				
Nome Fantasia					
Endereço	R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO II				
CPF/CNPJ	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal	859379	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	SALA 1



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	69202290
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

F. LIDER CAVALLANTE FARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PO Box 191 - 63475-000
CPF: 000.047.803-49

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 439910300 - Obras de alvenaria

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	12.143,92	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.143,92
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	4.857,56
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.286,36
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	364,32	rvyds5u2lot7af89bzc6lkp3hw	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	11.779,60	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	364,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO NUBANK-AG:0001/CONTA: 63926258-9/CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/08/24 11:36

Hora da emissão: 11:36:32

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL		ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL						R\$ 27.436,08	R\$ 1.125,01	R\$ 410.654,94					R\$ 12.143,92	R\$ 301.973,73	R\$ 404.115,67
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.061,15	3,00	R\$ 5.061,15		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.061,15	R\$ 5.061,15
2		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	3,00	1.687,25	R\$ 5.061,15		R\$ 5.061,15		R\$ 5.061,15		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.061,15	R\$ 5.061,15
21	C197	PULCERIZAÇÃO DE TERRENO COM REBOCO DE CIMENTO	M2	6,00	197,14	R\$ 1.182,84		R\$ 1.182,84	6,00	R\$ 1.182,84		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.182,84	R\$ 1.182,84
22	C4919	UTILIZANDO TRATOR DE ESTERILIZADO	M2	616,64	0,24	147,99			616,64	147,99		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 147,99	R\$ 147,99
23	C873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,33	203,49			616,64	203,49		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 203,49	R\$ 203,49
3		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 7.489,22	R\$ 1.125,01	R\$ 18.040,46					R\$ 18.040,46	R\$ 18.040,46	R\$ 18.040,46
31	92398	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/02/21	M3	14,85	84,44	1.253,93			14,85	1.253,93		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.253,93	R\$ 1.253,93
32	92382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	M3	3,71	30,85	121,87			3,71	121,87		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 121,87	R\$ 121,87
33	C026	RECONSTRUÇÃO DE COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	235,98	9,70	1.988,01	115,98	1.125,01	90,00	873,00	90,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 873,00	R\$ 873,00
34	C333	TRANSPORTE DE MATERIAL, ENXERTO ROCHAS EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	91,43	30,46	2.784,96	261,93	7.978,39	353,36	10.763,35	353,36	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.763,35	R\$ 10.763,35
35	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P N	M3	91,43	4,67	426,95	261,93	1.229,21	353,36	1.650,19	353,36	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.650,19	R\$ 1.650,19
36	C330	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	91,43	9,58	874,27	261,93	2.502,55	353,36	3.376,12	353,36	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.376,12	R\$ 3.376,12
4		FORMAÇÕES				R\$ 5.979,95	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95					R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95
41	C054	ALVENARIA DE EMBAISAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95			11,14	5.979,95		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95
5		RESTRUTURA				R\$ 11.927,24	R\$ 0,00	R\$ 11.927,24					R\$ 11.927,24	R\$ 11.927,24	R\$ 11.927,24
51	92304	CINTA DE ANABRAGAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.366,62	R\$ 7.366,62
52	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, FÓRDEIRO SIMPLES, EM CHAPA DE ALUMÍNIO	M2	9,28	58,76	545,26			9,28	545,26		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 545,26	R\$ 545,26
53	C0116	ARMADURA CA-50A, MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,82	2.052,20			114,52	2.052,20		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.052,20	R\$ 2.052,20
54	C0117	ARMADURA CA-60 FIMA D=10 A 16,0mm	KG	42,87	15,67	671,77			42,87	671,77		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 671,77	R\$ 671,77
55	C0462	CONCRETO P/UBA, FCK 20 MPa COM AGRÉGO ACQUILUDO	M3	1,86	528,62	983,23			1,86	983,23		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 983,23	R\$ 983,23
56	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13			1,86	318,13		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 318,13	R\$ 318,13
6		MAIUTA				R\$ 6.167,95	R\$ 0,00	R\$ 6.167,95					R\$ 6.167,95	R\$ 6.167,95	R\$ 6.167,95
61	C0074	ALVENARIA DE TUDO CRÉMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA C/ALUMINA 200-30,0mm	M2	46,40	132,95	6.167,95			46,40	6.167,95		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.167,95	R\$ 6.167,95

PROJ. DE ARQUITETURA Nº 2023/010
 PROJ. DE ENGENHARIA Nº 2023/010
 PROJ. DE GEOMETRIA Nº 2023/010



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
CONTRATADA: REALIZA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 35.851.118/0004-08		MEDIÇÃO Nº 11										CONTRATO: 20.02.02/2023				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024										ADITIVO:				
		DATA DE EMISSÃO: sabado, 5 de agosto de 2023										VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.608.154,52				
		P. UNID. C/ UNID. R\$										MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.090.376,69				
		P. UNID. C/ UNID. R\$										SALDO: R\$ 518.175,83				
		P. UNID. C/ UNID. R\$										PERC. DE ADITIVO: 32%				
		P. UNID. C/ UNID. R\$										VALORES (R\$)				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNID. C/ UNID. R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	ACUM. ATUAL
6.2	C076	ARMARCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PERNEIRA 14x14x150cm	M2	92,80	7,77	727,96					92,80	727,96			100,00%	727,96
6.3	C028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86					92,80	5.092,86			100,00%	5.092,86
7	MURO				R\$ 79.928,77	R\$ 79.928,77					R\$ 94.497,20	R\$ 94.497,20			99,00%	R\$ 92.162,49
7.1	C1807	MURO CORTADO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR ACINTA) REBOCADO,	M2	211,62	350,89	74.235,24	41,49	14.559,43			253,11	88.813,77			100,00%	88.813,77
7.2	100701	REBOCO DE ABRELA, TIPO GRÁDE COM OUPA, COM CLAVANÇAS,	M2	7,46	724,29	5.399,75					7,46	5.399,75			59,00%	3.166,88
7.3	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68					2,00	323,68			50,00%	161,84
8	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 90.975,24	R\$ 90.975,24					R\$ 92.127,24	R\$ 92.127,24			99,00%	R\$ 79.855,24
8.1	C2864	LUSTRO DE PÓ DE PEDRA	M2	24,00	113,84	2.732,16					24,00	2.732,16			100,00%	2.732,16
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	65,49	31.455,20					480,00	31.455,20			100,00%	31.455,20
8.3	C1400	FORMA DE TUBAS DE 1 DE 3M, P/AFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	67,96	500,79					7,36	500,79			100,00%	500,79
8.4	C0071	ARMADURA EM TELA SOLDADA Q32	M2	576,00	12,44	7.165,44					576,00	7.165,44			100,00%	7.165,44
8.5	C0842	CONCRETO F/IBR. P/0,30M3 COM ARGEBECO AQUISIDO	M3	38,40	528,64	20.299,01					38,40	20.299,01			100,00%	20.299,01
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	M3	38,40	171,04	6.567,94					38,40	6.567,94			100,00%	6.567,94
8.7	13136	LANTA PLÁSTICA 11,17MM PARA PISSE	M	640,00	1,75	1.120,00					640,00	1.120,00			100,00%	1.120,00
8.8	91382	CONSTRUTORIA DE PISO COM MOTOS 4 TAMPA A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 330 MM, FURO DE 1" (H X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	30,00	279,90	8.397,00					30,00	8.397,00			100,00%	8.397,00
8.9	C4819	COMPACTADOR TIPO TROQUENO (20x10x6) DM 300MM	M2	118,07	60,71	7.168,03					118,07	7.168,03			100,00%	7.168,03
8.10	C0366	BANQUETA/MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,11	3.115,61					103,20	3.115,61			100,00%	3.115,61
9.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EMBELGAÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. PE 04/2022	M2	480,00	1,52	729,60					480,00	729,60			100,00%	729,60
9	ALAMBRAO				R\$ 94.128,16	R\$ 94.128,16					R\$ 94.128,16	R\$ 94.128,16			100,00%	R\$ 94.128,16
9.1	C4672	PORTÃO COM REVEL. EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (142,9mm) INCL.	UN	2,00	2.037,51	4.075,02					2,00	4.075,02			100,00%	4.075,02
9.2	C0056	ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUIRE PINTURA	M2	269,40	334,27	90.052,34					269,40	90.052,34			100,00%	90.052,34

(Handwritten signature and stamp)

ITEM		CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$
<p>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.881.116/0001-08</p> <p>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>MEDICÃO Nº 11</p> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023</p> <p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ← QUANT. C/ ACRESCIMO ← QUANT. C/ DECREMENTO ← TEMPO (h/Min/Seg) ← ITEM NOVO (Adicional) ← ITEM SUPRIMIDO (Excluir) ← ITEM SEM ALTERAÇÕES 									
		CONTRATO: 20.02.02/2023		ADITIVO: R\$ 1.547.912,67		VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.841,83		VALOR DA MEDICÃO R\$ 12.143,92	
		MEDICÃO ACUMULADA:		PERC. DE ADITIVO: 32%		VALORES (R\$)		ACUM. ANTERIOR R\$ 0,00	
		PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	
		R\$ 5.157,81		R\$ 5.157,81		R\$ 5.157,81		R\$ 5.157,81	
10.1	1114 LATA CLAS CERAÇÃO EM PAREDES EXTERNAS SPANISA	M2	92,80	26,36	2.446,21		2.446,21	92,80	2.446,21
10.2	10394 TINTA ACRILICA	M	271,16	10,00	2.711,60		2.711,60	271,16	2.711,60
11	1111 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS				R\$ 28.244,22		R\$ 28.244,22		R\$ 28.244,22
11.1	C486 INTERRUPTOR EM LÍD. CORPO EM ALUMÍNIO. POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00		7.764,00	8,00	7.764,00
11.2	C530 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, 200X200X150X150MM, C/ARMAMENTO	UN	4,00	1.126,00	4.504,00		4.504,00	4,00	4.504,00
11.3	C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERMELD 50X7, 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08		1.304,08	4,00	1.304,08
11.4	C207 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 350X150X150MM, C/ARMAMENTO	UN	1,00	342,57	342,57		342,57	1,00	342,57
11.5	C1099 DISSOLVOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49		34,49	1,00	34,49
11.6	C1095 DISSOLVOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32		105,32	4,00	105,32
11.7	C1090 DISSOLVOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33		26,33	1,00	26,33
11.8	C1196 RELEUTODUTO PVC RIGID INCL. CONDIÇÕES D= 25mm (2")	M	61,76	1.183,94	72.800,00		72.800,00	61,76	72.800,00
11.9	C1197 RELEUTODUTO PVC RIGID INCL. CONDIÇÕES D= 32mm (1 1/2")	M	63,08	29,05	1.832,47		1.832,47	63,08	1.832,47
11.10	C1199 RELEUTODUTO PVC RIGID INCL. CONDIÇÕES D= 50mm (2 1/2")	M	9,44	375,05	3.535,05		3.535,05	9,44	3.535,05
11.11	91695 BLOQUE DE CONCRETO (15X15X15) PARA CIMENTOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 132015	M	11,69	12,63	147,53		147,53	11,69	147,53
11.12	C294 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	4.871,04	2.505.000,00		2.505.000,00	516,00	2.505.000,00
11.13	C294 CABO ISOLADO PVC 750V 2MM2	M	78,60	6.115,1	480.600,00		480.600,00	78,60	480.600,00
11.14	C294 CABO ISOLADO PVC 750V 1MM2	M	7,00	1.397,34	9.781,38		9.781,38	7,00	9.781,38
11.15	C290 QUADRO 7/16 MEDIDA EM PAREDE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,08	1.715,08		1.715,08	1,00	1.715,08
11.16	C180 MARETA C/ TUBO MACTO, REBOCALO, INCL. FUNDAMENTOS	M2	1,80	438,08	788,54		788,54	1,80	788,54
11.17	C497 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PISO 200X200X150X150MM, C/ARMAMENTO	UN	1,00	933,45	933,45		933,45	1,00	933,45
11.18	C1496 INTERRUPTOR LUMINA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52		38,52	1,00	38,52
11.19	C1494 INTERRUPTOR LUMINA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	39,28	78,56		78,56	2,00	78,56

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060185170n

Andrônio Fco. Biogentes de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060185170n

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.110/0001-08 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANHANGUA E VARZEA DO JANEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE MEDICÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: MEDICÃO ACUMULADA: SALDO: PERC. DE ADITIVO: 3,02%			LEGENDA: ◀ QUANT. ACRESCIMADO ◀ QUANT. DEDUZIDO ◀ ITEM NOVO (a Preço Excl.) ◀ ITEM NOVO (a Valor Excl.) ◀ ITEM SUPRIMIDO (a Valor Excl.) ◀ ITEM SUPRIMIDO (a Preço Excl.)		VALORES (R\$) CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. VALOR DA MEDIÇÃO MEDICÃO ACUMULADA: SALDO: PERC. DE ADITIVO: 3,02%									
11.20	9136	CAIXA OBTORTONA 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - ROMEAMENTO E RIGELIZADA	UN	3,00	13,42		40,26		3,00	40,26	100,00%		40,26	40,26
11.21	16432	CAIXA DE RESERVA PVC - 143,5x126x126	UN	3,00	2,22		6,66		3,00	6,66	100,00%		6,66	6,66
11.22	18115	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO X/UE 04/0V 10MM²	M	100,80	1,99		200,59		100,80	200,59	100,00%		200,59	200,59
12	MANUTENÇÃO						R\$ 36.902,02			R\$ 36.902,02	95,00%		R\$ 35.446,66	R\$ 37.762,19
12.1	5180	SERVICOS PRELIMINARES	M2	9,37	7,73		72,43		9,37	72,43	100,00%		72,43	72,43
12.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 9.000,00			R\$ 9.000,00	100,00%		R\$ 9.000,00	516,30
12.2.1	93598	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. JORNAL	M3	2,46	84,44		207,72		2,46	207,72	100,00%		207,72	207,72
12.2.2	93582	REBENTIVO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO INCONDIÇÃO AF. JORNAL	M3	0,69	30,85		21,27		0,69	21,27	100,00%		21,27	21,27
12.2.3	03330	ATERRO COMPACTADO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CASUSADO	M3	2,43	119,46		289,31		2,43	289,31	100,00%		289,31	289,31
12.3	PONDAÇÕES E ESTRUTURA						R\$ 6.434,68			R\$ 6.434,68	77,00%		R\$ 6.487,08	R\$ 6.487,08
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS	M2	0,64	22,23		14,27		0,64	14,27	100,00%		14,27	14,27
12.3.2	02326	ARMADURA CERVA MEDIA D= 8,3 A 10mm	KG	101,17	17,92		1.812,97		74,12	1.812,97	73,00%		1.328,26	1.328,26
12.3.3	02117	ARMADURA CADO FUS D= 8,3 A 16,0mm	KG	31,77	15,67		497,84		23,28	497,84	73,00%		364,79	364,79
12.3.4	02842	CONCRETO F/10R - F02 30 MPa COM AGREGADO AQUISIDO	M3	1,98	526,62		1.032,34		1,98	1.032,34	65,00%		660,56	660,56
12.3.5	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04		143,67		0,84	143,67	19,00%		27,37	27,37
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	M3	1,06	289,54		315,60		1,06	315,60	100,00%		315,48	315,48
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPONIDA P/JUSTIFICADA, ESP = 8mm	M2	24,83	136,08		3.330,57		17,90	3.330,57	71,00%		2.259,83	2.259,83
12.3.8	C461	LAJE PRÉ-FABRICADA RELIQUADA P/PRO-VIÃO DE 181 A 230	M2	9,37	159,97		1.498,92		9,37	1.498,92	100,00%		1.498,92	1.498,92
12.4	SISTEMA DE MEDIÇÃO VERTICAL						R\$ 4.199,96			R\$ 4.199,96	100,00%		R\$ 4.199,96	R\$ 4.199,96
12.4.1	C0075	ALVARIA DE TIXALO CERÂMICO RABADO (R-19-19150m) /CARAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=100(L12.8)	M2	44,71	75,88		3.392,59		44,71	3.392,59	100,00%		3.392,59	3.392,59
12.4.2	C4992	ALVARIA DE EMBASAMENTO EM TIXALO CERÂMICO RABADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	776,32		807,37		1,04	807,37	100,00%		807,37	807,37
12.5	REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORS						R\$ 8.187,22			R\$ 8.187,22	100,00%		R\$ 8.187,22	R\$ 8.187,22
12.5.1	C446	CERÂMICA EMALTAADA REFITICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ADMA DE 30x30cm) - PRÉ-SPEI 4 - P/ PARDE	M2	17,60	114,38		2.013,09		17,60	2.013,09	100,00%		2.013,09	2.013,09
12.5.2	C1427	RELINAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 10mm E 6mm EM CEMENTO PORTLAND DE 30x30cm (100 c/m²) E PORCELANITOS (PARA PISOS)	M2	17,60	111,41		196,06		17,60	196,06	100,00%		196,06	196,06

REC. PROJETOS
 DATA: 20/07/2024
 HORA: 14:55
 LOCAL: JAGUARIBE-CE
 PROJETO: 11010000150
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
 CREA-CE: 0601851760

RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851760

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

REC. PROJETOS
 DATA: 20/07/2024
 HORA: 14:55
 LOCAL: JAGUARIBE-CE
 PROJETO: 11010000150
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
 CREA-CE: 0601851760

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 16.068.554/0001-08			MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: 28/06/2024			LEGENDA: ▲ QUANT. ACRESCIMOS ▼ QUANT. DECRESCIMOS ▲ ITEM NOVO (p/ Preço Esq) ▼ ITEM NOVO (Adicional) ▲ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ▼ ITEM SEMALTERAÇÕES			CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,85 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.608.554,52 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 12.432,02 SALDO: R\$ 1.600.378,69 PERÍODO DE ADITIVO: R\$ 518.177,89 VALORES (R\$)						
12.5.3	C078	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	7,59	15,39	116,81	7,59	116,81	7,59	7,59	0,00	100,00%	116,81	116,81	
12.5.4	C034	REDELETRADA DE GALVANIZADA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2,8, ESP=20mm E TETO	M2	7,59	45,95	346,76	7,59	346,76	7,59	7,59	0,00	100,00%	346,76	346,76	
12.5.5	C076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	89,42	7,84	701,05	89,42	701,05	89,42	89,42	0,00	100,00%	701,05	701,05	
12.5.6	C028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	54,88	3.941,48	71,82	3.941,48	71,82	71,82	0,00	100,00%	3.941,48	3.941,48	
12.5.7	C029	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	17,60	49,43	869,97	17,60	869,97	17,60	17,60	0,00	100,00%	869,97	869,97	
12.5.8	SISTEMA DE FIBROS					R\$ 1.700,74		R\$ 1.700,74				100,00%	R\$ 1.700,74	R\$ 1.700,74	
12.6.1	C167	LAJE DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	59,58	452,21	7,59	452,21	7,59	7,59	0,00	100,00%	452,21	452,21	
12.6.2	C179	REESTRUTURIZADO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E TRACO 1:4,8,8,8	M2	7,59	28,34	215,10	7,59	215,10	7,59	7,59	0,00	100,00%	215,10	215,10	
12.6.3	C001	GRANICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA	M2	7,59	108,66	826,25	7,59	826,25	7,59	7,59	0,00	100,00%	826,25	826,25	
12.6.4	C147	REVESTIMENTO DE ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 6cm EM GRANICA ACIMA DE 3030 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARADEISOS)	M2	7,59	11,14	84,55	7,59	84,55	7,59	7,59	0,00	100,00%	84,55	84,55	
12.6.5	C418	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20x10x6,0x) COM CIMENTO E ARGAMASSA	M2	2,02	60,71	122,63	2,02	122,63	2,02	2,02	0,00	100,00%	122,63	122,63	
12.7	SISTEMA DE COBERTURA					R\$ 1.862,25		R\$ 1.862,25				100,00%	R\$ 1.862,25	R\$ 1.862,25	
12.7.1	C092	COBERTURA C/TELA C/CHUVA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (CAMBERAMENTO)	M2	7,04	154,15	1.086,22	7,04	1.086,22	7,04	7,04	0,00	100,00%	1.086,22	1.086,22	
12.7.2	C072	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,27	354,84	2,51	354,84	2,51	2,51	0,00	100,00%	354,84	354,84	
12.7.3	C249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DERENOVAMENTO 30cm	M	7,54	43,17	325,50	7,54	325,50	7,54	7,54	0,00	100,00%	325,50	325,50	
12.7.4	C062	CALHA DE FIBRGLAS ESP = 2mm DERENOVAMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	4,14	196,69	4,14	4,14	0,00	100,00%	196,69	196,69	
12.8	ENQUADRAMOS					R\$ 2.504,00		R\$ 2.504,00				97,00%	R\$ 2.436,59	R\$ 2.436,59	
12.8.1	100701	PORTA DE FIBRO, DE ABRIR, TIPO GRAZE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES	M2	2,94	724,29	2.129,41	2,94	2.129,41	2,94	2,94	0,00	100,00%	2.129,41	2.129,41	
12.8.2	C1961	FECHADORA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59	307,18	2,00	307,18	2,00	2,00	0,00	100,00%	307,18	307,18	
12.8.3	C034	REBOCO ANTI-CHUVA (50x40cm) CARGO CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,64	105,45	67,48	0,64	67,48	0,64	0,64	0,00	0,00%	67,48	67,48	

RICARDO PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 060185170n

RICARDO PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 060185170n

Antônio Rodrigues de Oliveira

PROJETADA E EXECUTADA POR
 RICARDO PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 060185170n

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)		
			UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	P. TOTAL	PERÍODO	PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR
PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.117/0001-08 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANQUINHA E VÁZEA DO JAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV.: VALOR DA MEDIÇÃO: MEDIÇÃO ACUMULADA: SALDO:			MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: sexta, 5 de agosto de 2023			VALORES (R\$) R\$ 1.599,69 R\$ 1.599,69 R\$ 1.599,69 R\$ 1.599,69					
12.9 PINTURAS E ACABAMENTOS			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
12.9.1	89488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS FOLHAS DE 200x300cm	M2	7,59	17,99	-	-	-	-	7,59	7,59	100,00%	136,54	136,54
12.9.2	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE 200x300cm	M2	71,92	15,69	-	-	-	-	71,92	71,92	100,00%	1.140,50	1.140,50
12.9.3	C1279	SMALTE DUAS FOLHAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	-	-	-	-	5,88	5,88	100,00%	261,65	261,65
12.10 INSTALAÇÕES HIDROALIMENTARES			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
12.10.11			R\$ 519,50			R\$ 519,50			R\$ 519,50			R\$ 519,50		
12.10.11.1	C255	TUBO PVC SÓL. MAROM D= 25mm (1/2")	M	1,62	7,02	-	-	-	-	1,62	1,62	100,00%	11,29	11,29
12.10.11.2	C256	TUBO PVC SÓL. MAROM D= 25mm (1/2")	M	15,80	9,51	-	-	-	-	15,80	15,80	100,00%	150,26	150,26
12.10.11.3	C257	TUBO PVC SÓL. MAROM D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	-	-	-	-	0,64	0,64	100,00%	9,45	9,45
12.10.11.4	C258	TUBO PVC SÓL. MAROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	21,98	-	-	-	-	0,66	0,66	100,00%	14,51	14,51
12.10.11.5	94708	ADAPTADOR CONFLUENTE ANEL DE RESERVAÇÃO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FIM DE LINHA PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	26,60	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	26,60	26,60
12.10.11.6	94704	ADAPTADOR CONFLUENTE ANEL DE RESERVAÇÃO PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FIM DE LINHA PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	35,57	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	35,57	35,57
12.10.11.7	C1288	REGISTRO DE SANITA BRUNO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	-	-	-	-	2,00	2,00	100,00%	143,92	143,92
12.10.11.8	103041	REGISTRO DE SERRA, PVC, ROSCÁVEL, COM MANOBRALTA 1/2"	UN	1,00	26,09	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	26,09	26,09
12.10.11.9	103947	BLOCO DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 25 X 20 CM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	6,65	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	6,65	6,65
12.10.11.10	89409	VALVULA DE SINALS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	10,20	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	10,20	10,20
12.10.11.11	89258	VALVULO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	8,31	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	8,31	8,31
12.10.11.12	89862	VALVULO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	9,99	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	9,99	9,99

REALIZA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
 RUA ... Nº ...
 CEP: ...

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 060185170n

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	QUANTIDADE - ADITIVO			P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	PERÍODO	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$					QUANT. DEFINITIVO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL							PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR
<p>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.881.116/0001-08</p>																				
<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BOM, TAVANÓLIA E VÁZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																				
<p>LEGENDA: ◀ QUANT. C/ACRÉSCIMO ▶ QUANT. C/DECRÉSCIMO ◀ ITEM NOVO (P/Preço Escl.) ▶ ITEM NOVO (Acrescimo) ▶ ITEM SUPRIMENTO (E e/ou) ▶ ITEM SEML. TERAÇÕES</p>										<p>MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: setembro, 5 de agosto de 2023</p>										
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.608.534,52 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 12.432,92 SALDO: R\$ 1.090.376,69 VALORES (R\$) PERÍODO DE ADIÇÃO: R\$ 518.175,81 VALORES (R\$) R\$ 32,25</p>																				
<p>12.10.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</p>																				
12.10.1.13	8957	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	14,25	14,25	-	-	-	1,00	14,25	100,00%	-	-	14,25	14,25	-	-	-	-
12.10.1.14	3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA RAMAL SANITÁRIO	UN	1,00	9,39	9,39	-	-	-	1,00	9,39	100,00%	-	-	9,39	9,39	-	-	-	-
12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA RAMAL SANITÁRIO	UN	1,00	7,73	7,73	-	-	-	1,00	7,73	100,00%	-	-	7,73	7,73	-	-	-	-
12.10.1.16	89624	JOELHO DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	21,68	21,68	-	-	-	1,00	21,68	100,00%	-	-	21,68	21,68	-	-	-	-
12.10.1.17	89440	TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	12,69	12,69	-	-	-	1,00	12,69	100,00%	-	-	12,69	12,69	-	-	-	-
<p>12.10.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</p>						<p>R\$ 6.634,53</p>						<p>R\$ 6.634,53</p>						<p>R\$ 6.634,53</p>		
12.10.2.1	89711	TEUO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	2,54	22,95	57,26	-	-	-	2,54	57,26	100,00%	-	-	57,26	57,26	-	-	-	-
12.10.2.2	89798	TEUO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	M	10,94	15,56	170,23	-	-	-	10,94	170,23	100,00%	-	-	170,23	170,23	-	-	-	-
12.10.2.3	89714	BOIA SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	M	7,64	44,13	337,15	-	-	-	7,64	337,15	100,00%	-	-	337,15	337,15	-	-	-	-
12.10.2.4	C3986	CAIXA SIFONADA, ISOLADO/SEM COM GRELHA - PADRÃO SICALUR	UN	2,00	61,56	123,18	-	-	-	2,00	123,18	100,00%	-	-	123,18	123,18	-	-	-	-
12.10.2.5	C0365	CAIXA DE INSERÇÃO EM ALUMÍNIO - 1/2 TIPO COMUM	MQ	1,00	197,61	197,61	-	-	-	1,00	197,61	100,00%	-	-	197,61	197,61	-	-	-	-
12.10.2.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	2,00	9,83	19,66	-	-	-	2,00	19,66	100,00%	-	-	19,66	19,66	-	-	-	-
12.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	4,00	13,53	54,12	-	-	-	4,00	54,12	100,00%	-	-	54,12	54,12	-	-	-	-
12.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	6,00	12,64	77,84	-	-	-	6,00	77,84	100,00%	-	-	77,84	77,84	-	-	-	-
12.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	1,00	35,84	35,84	-	-	-	1,00	35,84	100,00%	-	-	35,84	35,84	-	-	-	-
12.10.2.10	3659	MOCAÇO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE PREDIAL	UN	2,00	23,26	46,18	-	-	-	2,00	46,18	100,00%	-	-	46,18	46,18	-	-	-	-

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
 RUA ... Nº ...
 CEP: ...
 JAGUARIBE - CE

RICARDO OLIVEIRA P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700

PROFESSOR ...
 ...

Andréo Eco. Biogenes de Oliveira

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATO: 20.03.02/2023		MEDIÇÃO Nº 11		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024		VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.608.354,52		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		P. UNIT. C/BDI R\$		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 12.143,92		ACUM. ANTERIOR	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
UNED	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.10.2.11	C1761	LAVA SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 50mm (2')	8,00	11,25	90,00	8,00	90,00	8,00	90,00	0,00	100,00%	90,00	90,00
12.10.2.12	C1798	LAVA SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 100mm (4')	4,00	23,63	94,52	4,00	94,52	4,00	94,52	0,00	100,00%	94,52	94,52
12.10.2.13	89825	1" PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JANTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA, DE ESGOTO SANITÁRIO OU	2,00	23,66	47,32	2,00	47,32	2,00	47,32	0,00	100,00%	47,32	47,32
12.10.2.14	89796	1" PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JANTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 30/2022	1,00	57,13	57,13	1,00	57,13	1,00	57,13	0,00	100,00%	57,13	57,13
12.10.2.15	C1832	POISA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	1,00	5.236,27	5.236,27	1,00	5.236,27	1,00	5.236,27	0,00	100,00%	5.236,27	5.236,27
12.10.3	LOUÇAL, METAS E ACESSÓRIOS				R\$ 3.509,62		R\$ 3.509,62		R\$ 3.509,62		100,00%	R\$ 3.509,62	R\$ 3.509,62
12.10.3.1	102655	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIDO E INSTALADO. AF. 06/2021	1,00	361,34	361,34	1,00	361,34	1,00	361,34	0,00	100,00%	361,34	361,34
12.10.3.2	02348	BACIA DE LOUÇA BRANCA CICLADA ACOPIADA	2,00	940,50	1.881,00	2,00	1.881,00	2,00	1.881,00	0,00	100,00%	1.881,00	1.881,00
12.10.3.3	102649	ASBESTO - SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALADO. AF. 06/2021	2,00	56,89	113,78	2,00	113,78	2,00	113,78	0,00	100,00%	113,78	113,78
12.10.3.4	C1619	REDE DE COÇA BRANCA, 5 COLUNA C/70MM E ACESSÓRIOS	2,00	574,85	1.149,70	2,00	1.149,70	2,00	1.149,70	0,00	100,00%	1.149,70	1.149,70
12.11	SERVICIOS FINAIS				R\$ 104,74		R\$ 104,74		R\$ 104,74		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.11.4	C1028	LIMPEZA GERAL	7,99	13,20	104,74	7,99	104,74	7,99	104,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	DIVERSOS				R\$ 11.184,08		R\$ 11.184,08		R\$ 11.184,08		100,00%	R\$ 11.184,08	R\$ 11.184,08
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FURAR, COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 MM, PARA FURAR EM ALVENARIA, COM REQUILIBRO EM TUBO DE 1" PAV. BA. EM PARALELO	1,00	4.447,94	4.447,94	1,00	4.447,94	1,00	4.447,94	0,00	100,00%	4.447,94	4.447,94
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H * 759P CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO REPERTE INTON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E REPERTE SINTÉTICO	1,00	2.700,29	2.700,29	1,00	2.700,29	1,00	2.700,29	0,00	100,00%	2.700,29	2.700,29
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPREGADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05x1,05M, ESP. 30MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMEIR E SEGUNDA MÃO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO NAO AVANÇADO LIVRE DE 2,20M	1,00	4.036,85	4.036,85	1,00	4.036,85	1,00	4.036,85	0,00	100,00%	4.036,85	4.036,85

RICARDO ZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 06D185170n

RICARDO ZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 06D185170n

Andréio Fco. Rodrigues de Oliveira

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 08.043.888/0001-07			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.681.118/0001-08			MEDIÇÃO Nº 11			VALORES (R\$)			
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/B/DI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
14	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 912,63	R\$ 0,00		R\$ 912,63					R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1	C340	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48	912,63			912,63						
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 397,879,39	R\$ 0,00		R\$ 397,879,39						
1.1	PM1 - 0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.667,95	5.003,15			5.003,15						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.085,15	R\$ 0,00		R\$ 2.085,15						
2.1	C1807	PLACAS PAVIMENTO DE CIMENTO	M2	6,00	352,14	2.112,84			2.112,84						
2.2	C4919	LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO DE TERRENO COM REMOÇÃO DE ENTULHO E RECONSTRUÇÃO DE ESTREBAS	M2	616,64	0,34	147,99			147,99						
2.3	C873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUGUÉ TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	M2	616,64	0,33	203,49			203,49						
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 9.257,85	R\$ 4.659,82		R\$ 13.917,67						
3.1	93356	RECONSTRUÇÃO MANUVAIS DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M	M3	14,85	64,44	956,84			956,84						
3.2	93362	RETRABALHO MANUVAIS DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	M3	3,71	32,85	121,87			121,87						
3.3	C0926	CORTE E TERMO COMPENSADO E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	176,53	9,70	1.711,74	73,99		1.785,73						
3.4	C2330	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO DOCHIM CARRETILO ATE 5,00M	M3	148,81	30,46	4.532,75	104,27		4.637,02						
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE TERREÇOS 100% P.N	M3	148,81	4,77	703,94	104,27		808,21						
3.6	C3300	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT	M3	148,81	9,56	1.422,62	104,27		1.526,89						
4	FUNDAÇÕES					R\$ 5.979,95	R\$ 0,00		R\$ 5.979,95						
4.1	C0364	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE PEDRA ALGAMUSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95			5.979,95						
5	ESTRUTURA					R\$ 11.927,24	R\$ 3.415,40		R\$ 15.342,64						
5.1	93204	CONCRETO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO	M3	90,80	81,02	7.368,62	42,16		7.410,78						
5.2	92435	REBARME E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES METÁLICOS E ALUMINUMES, REFORÇO EMPRELES EM CHAPA DE MADEIRA, REFORÇO COMPENSADO PLASTIFICADO, UTILIZANDO RE. 08/2020	M2	9,38	58,76	548,29			548,29						
5.3	C0216	ARMADURA CA-508, MEDIA Ø= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,52	2.006,20			2.006,20						
5.4	C0217	ARMADURA CA-60, FINAL Ø= 3,40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77			671,77						

RECIBO DE MEDIÇÃO
Nº 11
DATA: 28/06/2024

RICARDO ZAR, P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060185170n

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira

CONTRATO Nº 001/2024
DATA: 28/06/2024
VALOR: R\$ 1.000.000,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. UNID. C/ UNID. \$	QUANTIDADE - ADITIVO		P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.		QUANT. ADICIONADO	QUANT. REDUZIDO				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.116/0001-08			CONTRATO: 20.02.02/2023 ADITIVO: 60.541.85 VALOR TOTAL SERV. 1.688.324,52 VALOR DA MEDIÇÃO 323.853,82 MEDIÇÃO ACUMULADA: 1.090.378,69 SALDO: 518.175,83 PERC. DE ADITIVO: 3,92%									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VAZEO DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			LEGENDA: ▲ QUANT. ACRESCIM. ▼ QUANT. DECRESCIM. ▲ ITEM NOVO (p/ Preço Esol) ▼ ITEM NOVO (Adesão) ▲ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ▼ ITEM SEM ALTERAÇÕES												
MEDIDAÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: setembro, 5 de agosto de 2023															
55	C082	CONCRETO 7/MBR. FOX 20 MPa COM AGREGADO AQUISIÇÃO	M3	1,86	529,62	983,23		983,23	1,86	529,62	0,00	0,00	0,00%	-	-
56	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13		318,13	1,86	171,04	0,00	0,00	0,00%	-	-
6	MURETA					R\$ 11.989,26		R\$ 11.989,26		R\$ 11.989,26			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1	C004	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FLUIDO (0x19x19)CM	M2	46,40	132,92	6.167,95		6.167,95	46,40	132,92	0,00	0,00	0,00%	-	-
6.2	C0776	ARGAMASSA MISTA 1:3:6	M2	92,80	7,84	727,55		727,55	92,80	7,84	0,00	0,00	0,00%	-	-
6.3	C0328	TRACO 1:3 ESP. * Somo 2/3/4/5/6	M2	92,80	54,88	5.092,86		5.092,86	92,80	5,092,86	0,00	0,00	0,00%	-	-
7	MURO					R\$ 81.159,26		R\$ 81.159,26		R\$ 81.159,26			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILA-CINTA) REBOCADO, COM REDELA	M2	212,09	350,89	75.472,39		75.472,39	212,09	350,89	0,00	0,00	0,00%	-	-
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABIRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	M2	7,40	2,41	5.359,75		5.359,75	7,40	5,359,75	0,00	0,00	0,00%	-	-
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	151,84	323,68		323,68	2,00	323,68	0,00	0,00	0,00%	-	-
8	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.152,00		R\$ 1.152,00		R\$ 1.152,00			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.1	C264	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	113,84	2.732,16		2.732,16	24,00	113,84	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.2	C148	POUMENTO EMPISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	31.915,20		31.915,20	480,00	66,49	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.3	C140	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3M PARALÂNGOS UTIL. 5 X	M2	7,36	83,96	617,95		617,95	7,36	617,95	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADURA Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44		7.165,44	576,00	12,44	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.5	C0842	CONCRETO 7/MBR. FOX 20 MPa COM AGREGADO AQUISIÇÃO	M3	38,40	528,62	20.299,01		20.299,01	38,40	528,62	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	171,04	6.567,84		6.567,84	38,40	171,04	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.7	13136	JUNTA PLÁSTICA 1" 20MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00		1.120,00	640,00	1,75	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.8	91382	CONTROLO DE PISO COM MOTOR 4 TEMAS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE E LÂMINA DE 360 MM, RUO DE 1" (4 X 1) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	30,00	9,13	273,90		273,90	30,00	9,13	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.9	C4819	PISO INVERNADO TIPO TIO LINHO (20X10)CM	M2	118,07	60,71	7.188,03		7.188,03	118,07	60,71	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.10	C0366	BANQUETE P/ PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61		3.115,61	103,20	30,19	0,00	0,00	0,00%	-	-
8.11	97113	APLICADOR DE TUBO ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO 7/MBR. FOX 20 MPa	M2	2,40	2,40	1.152,00		1.152,00	2,40	1,152,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
9	ALAMBRADO					R\$ 94.129,16		R\$ 94.129,16		R\$ 94.129,16			0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	C4872	POSTO COM RESEL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (102,5)M, INCL. PILARES DE SUSTENTÇÃO.	UN	2,00	2.037,91	4.075,82		4.075,82	2,00	4,075,82	0,00	0,00	0,00%	-	-
9.2	C0056	ALAMBRADO 7/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUIVE PINTURA	M2	269,40	334,27	90.052,34		90.052,34	269,40	334,27	0,00	0,00	0,00%	-	-

REALIZA CONSTRUTORA
 REALIZA CONSTRUTORA
 REALIZA CONSTRUTORA
 REALIZA CONSTRUTORA
 REALIZA CONSTRUTORA

RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro-Civil
 CREA-CE: 0601851700

Antônio Eco. Diogenes de Oliveira

PROFESSOR DE LICENCIAMENTO EM PEDAGOGIA
 CONTA: (85) 35963768, E-MAIL: COELHO@REALIZA-CE.COM
 REALIZA CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 07.043.888/0001-07		CONTRATO: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 11		VALORES (R\$)																																																																																																																																																											
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNIA, TAMANHA E VAREZA DO JAGUARIBE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024		VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.608.534,52																																																																																																																																																											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023		VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 12.433,92																																																																																																																																																											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.090.378,69		VALORES (R\$)																																																																																																																																																											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								SALDO: R\$ 518.175,83		VALORES (R\$)																																																																																																																																																											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERC. DE ADIÇÃO: 3,52%		VALORES (R\$)																																																																																																																																																											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								VALORES (R\$)		VALORES (R\$)																																																																																																																																																											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL																																																																																																																																																					
CONTRATUAL																																																																																																																																																																					
LEGENDA:																																																																																																																																																																					
<ul style="list-style-type: none"> ← QUANT. C/ACRÉSCIMO ← QUANT. C/DECRÉSCIMO ← ITEM NOVO (p/ Prop. Ext) ← ITEM NOVO (Adornado) ← ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ← ITEM SEMAL. TERAÇÕES 																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">QUANTIDADE - ADITIVO</th> <th colspan="2">QUANTIDADE REALIZADA</th> <th colspan="2">VALORES (R\$)</th> </tr> <tr> <th>QUANT. DEFINITIVO</th> <th>P. TOTAL</th> <th>QUANT. ANTERIOR</th> <th>ACUM. ANTERIOR</th> <th>PERÍODO</th> <th>ACUM. ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92,80</td> <td>R\$ 2.446,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>271,16</td> <td>R\$ 2.711,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>8,00</td> <td>R\$ 776,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>R\$ 4.504,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>R\$ 1.304,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>R\$ 342,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>R\$ 34,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>R\$ 105,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>R\$ 26,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>61,76</td> <td>R\$ 1.183,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>63,08</td> <td>R\$ 1.832,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>9,44</td> <td>R\$ 375,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11,69</td> <td>R\$ 147,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>516,00</td> <td>R\$ 4.871,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>79,60</td> <td>R\$ 611,51</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>7,00</td> <td>R\$ 1.397,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>R\$ 1.715,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,80</td> <td>R\$ 770,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>R\$ 933,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>R\$ 38,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>R\$ 39,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>R\$ 40,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>R\$ 6,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>																QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANT. ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	92,80	R\$ 2.446,21	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	271,16	R\$ 2.711,60	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 776,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 4.504,20	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.304,08	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 342,57	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 34,49	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 105,32	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 26,33	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	61,76	R\$ 1.183,94	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	63,08	R\$ 1.832,47	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,44	R\$ 375,05	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,69	R\$ 147,33	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	516,00	R\$ 4.871,04	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	79,60	R\$ 611,51	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 1.397,34	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.715,05	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,80	R\$ 770,54	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 933,45	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 38,52	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 39,28	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 40,26	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 6,66	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)																																																																																																																																																																	
QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANT. ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR																																																																																																																																																																
92,80	R\$ 2.446,21	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
271,16	R\$ 2.711,60	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
8,00	R\$ 776,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
4,00	R\$ 4.504,20	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
4,00	R\$ 1.304,08	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
1,00	R\$ 342,57	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
1,00	R\$ 34,49	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
4,00	R\$ 105,32	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
1,00	R\$ 26,33	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
61,76	R\$ 1.183,94	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
63,08	R\$ 1.832,47	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
9,44	R\$ 375,05	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
11,69	R\$ 147,33	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
516,00	R\$ 4.871,04	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
79,60	R\$ 611,51	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
7,00	R\$ 1.397,34	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
1,00	R\$ 1.715,05	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
1,80	R\$ 770,54	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
1,00	R\$ 933,45	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
1,00	R\$ 38,52	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
2,00	R\$ 39,28	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
3,00	R\$ 40,26	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
3,00	R\$ 6,66	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																
10.1	C164	LATELHAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MAISA	M2	92,80	26,36	2.446,21		R\$ 0,00		R\$ 2.446,21	92,80	R\$ 2.446,21		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.446,21																																																																																																																																																					
10.2	10204	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	M	271,16	10,00	2.711,60		R\$ 0,00		R\$ 2.711,60	271,16	R\$ 2.711,60		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.157,81																																																																																																																																																					
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																																																																																																																																																																					
11.1	C400	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	97,00	776,00		R\$ 0,00		R\$ 776,00	8,00	R\$ 776,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.933,81																																																																																																																																																					
11.2	C300	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL EM 100KG, 4,00M	UN	4,00	1.126,05	4.504,20		R\$ 0,00		R\$ 4.504,20	4,00	R\$ 4.504,20		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.438,01																																																																																																																																																					
11.3	C476	ABRIGAMENTO COMPLETO C/MADE COFREVELD 58X72,40X	UN	4,00	326,02	1.304,08		R\$ 0,00		R\$ 1.304,08	4,00	R\$ 1.304,08		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.742,09																																																																																																																																																					
11.4	C202	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPORTE 12 DIVISÕES	UN	1,00	342,57	342,57		R\$ 0,00		R\$ 342,57	1,00	R\$ 342,57		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.084,66																																																																																																																																																					
11.5	C109	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49		R\$ 0,00		R\$ 34,49	1,00	R\$ 34,49		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.119,15																																																																																																																																																					
11.6	C106	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32		R\$ 0,00		R\$ 105,32	4,00	R\$ 105,32		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.224,47																																																																																																																																																					
11.7	C108	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33		R\$ 0,00		R\$ 26,33	1,00	R\$ 26,33		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.250,80																																																																																																																																																					
11.8	C118	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 25mm (Q/M)	M	61,76	19,17	1.183,94		R\$ 0,00		R\$ 1.183,94	61,76	R\$ 1.183,94		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.434,74																																																																																																																																																					
11.9	C117	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 32mm (1')	M	63,08	29,05	1.832,47		R\$ 0,00		R\$ 1.832,47	63,08	R\$ 1.832,47		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.267,21																																																																																																																																																					
11.10	C119	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 50mm (1,127')	M	9,44	39,73	375,05		R\$ 0,00		R\$ 375,05	9,44	R\$ 375,05		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.642,26																																																																																																																																																					
11.11	9189	PARDELETA DE CONCRETO REFORÇADO PVC 10X15	M	11,69	12,62	147,33		R\$ 0,00		R\$ 147,33	11,69	R\$ 147,33		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.789,59																																																																																																																																																					
11.12	C034	PARDELETA DE CONCRETO REFORÇADO PVC 10X15	M	516,00	9,44	4.871,04		R\$ 0,00		R\$ 4.871,04	516,00	R\$ 4.871,04		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 20.660,63																																																																																																																																																					
11.13	C094	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	79,60	7,58	611,51		R\$ 0,00		R\$ 611,51	79,60	R\$ 611,51		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 21.272,14																																																																																																																																																					
11.14	C094	CABO ALUMÍNIO 7 FIBROCO / 7 TAMPA CONCRETO 3/ FIBROCO 10X15 3000cm	UN	7,00	199,62	1.397,34		R\$ 0,00		R\$ 1.397,34	7,00	R\$ 1.397,34		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 22.669,48																																																																																																																																																					
11.15	C200	QUADRO 17 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05		R\$ 0,00		R\$ 1.715,05	1,00	R\$ 1.715,05		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 24.384,53																																																																																																																																																					
11.16	C183	MURETA C/TELADO MACIÇO, REBOCALADA, INCL. FUND. 40X40	M2	1,80	428,08	770,54		R\$ 0,00		R\$ 770,54	1,80	R\$ 770,54		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 25.155,07																																																																																																																																																					
11.17	C497	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 8,00M, PISO ATOMIZADO 0,00KG	UN	1,00	933,45	933,45		R\$ 0,00		R\$ 933,45	1,00	R\$ 933,45		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.088,52																																																																																																																																																					
11.18	C194	INTERFURTOUR LAM. TELA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A	UN	1,00	38,52	38,52		R\$ 0,00		R\$ 38,52	1,00	R\$ 38,52		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.473,74																																																																																																																																																					
11.19	C194	INTERFURTOUR LAM. TELA SIMPLES 30A 250V	UN	2,00	19,64	39,28		R\$ 0,00		R\$ 39,28	2,00	R\$ 39,28		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.513,02																																																																																																																																																					
11.20	9193	PROTEÇÃO 4" X 1", PVC, INSTALAÇÃO EM LUZ	UN	3,00	13,42	40,26		R\$ 0,00		R\$ 40,26	3,00	R\$ 40,26		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.553,28																																																																																																																																																					
11.21	9143	CAIXA DE EMBUITIR PVC - 412 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66		R\$ 0,00		R\$ 6,66	3,00	R\$ 6,66		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.559,94																																																																																																																																																					

RECIBO DE RECEBIMENTO
 Nº 001/2024
 Valor: R\$ 12.433,92
 Data: 05/08/2023
 Assinado digitalmente por
 RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 CPF: 034.559.559-00
 RNF: 05120/19386

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 060185170n
 CONTATO: (85) 91908-7004, E-MAIL: COORDENADOR@REALIZA-CE.COM.BR

Antônio Eco. Rodrigues de Oliveira

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/BDI R\$	P. TOTAL	QUANT. ADICIONADO	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.318/0001-08 OBRA: CONTRATO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TANCIANA E VAREZA DO JACAREI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			CONTRATO: 26.05.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 60.641,85 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.608.554,52 SALDO: R\$ 12.143,92 PERC. DE ADITIVO: R\$ 1.090.376,69 PERC. DE ADITIVO: R\$ 518.175,83 PERC. DE ADITIVO: 3,52%												
LEGENDA: ◀ QUANT. C/ ACRESCIMO ◀ QUANT. C/ DECREMENTO ◀ ITEM NOVO (P/ Prop. Extm) ◀ ITEM NOVO (Adomemal) ◀ ITEM CANCELADO (E extm) ◀ ITEM SEMEL. TERAÇÕES			MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023												
11.22	18815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO ALPE 06/20V, 10Mx2	M	100,00	1,99	200,99	-	-	200,99	300,99	0,00	100,00	0,00%	-	-
SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 396.002,02			R\$ 72,43			R\$ 396.002,02			R\$ 0,00			
12.11	C160	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARANTO	M2	9,37	7,73	72,43	-	-	72,43	72,43	0,00	9,37	0,00%	-	-
12.2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 538,30			R\$ 538,30						
12.2.1	9239	REGULAGEM MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/02/21	M3	2,46	84,44	207,72	-	-	207,72	207,72	0,00	2,46	0,00%	-	-
12.2.2	9282	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/01/18	M3	0,69	32,85	22,67	-	-	22,67	22,67	0,00	0,69	0,00%	-	-
12.2.3	C030	TERRA C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDA	M3	2,43	118,48	287,91	-	-	287,91	287,91	0,00	2,43	0,00%	-	-
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			R\$ 8.424,48			R\$ 0,00			R\$ 8.424,48			R\$ 0,00			
12.3.1	94617	LASTRO DE CONCRETO M3R0, APLICADO EM BLOCOS DE FORAMENTO OU SEPTOS ESPECIAIS DE 04 AF. 08/2017	M2	0,64	22,29	14,27	-	-	14,27	14,27	0,00	0,64	0,00%	-	-
12.3.2	C0218	ARMADURA CADEIA M3R0 D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	-	-	1.812,97	1.812,97	0,00	101,17	0,00%	-	-
12.3.3	C0217	ARMADURA CADEIA F3R0 D= 4,0 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	497,84	-	-	497,84	497,84	0,00	31,77	0,00%	-	-
12.3.4	C0942	CONCRETO P/HR. FOX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,89	539,62	1.020,24	-	-	1.020,24	1.020,24	0,00	1,89	0,00%	-	-
12.3.5	C1004	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	-	-	143,67	143,67	0,00	0,84	0,00%	-	-
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	286,54	310,60	-	-	310,60	310,60	0,00	1,09	0,00%	-	-
12.3.7	C0991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSA RUSTIFICADA, ESP = 18mm	M2	24,83	126,08	3.130,57	-	-	3.130,57	3.130,57	0,00	24,83	0,00%	-	-
12.3.8	C461	LAJE PRE-FABRICADA TRILIÇA P/FIBRO-VIÃO DE 1,81 A 2,10 m	M2	9,37	159,97	1.498,92	-	-	1.498,92	1.498,92	0,00	9,37	0,00%	-	-
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			R\$ 4.199,06			R\$ 0,00			R\$ 4.199,06			R\$ 0,00			
12.4.1	C0279	ALVENARIA DE TIXALO CERÂMICO FURADO (9x19x13)cm	M2	44,71	75,88	3.392,59	-	-	3.392,59	3.392,59	0,00	44,71	0,00%	-	-
12.4.2	C492	ALVENARIA DE EMPLASTAMENTO EM TIXALO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA	M3	1,04	779,32	807,27	-	-	807,27	807,27	0,00	1,04	0,00%	-	-
REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES			R\$ 8.187,22			R\$ 0,00			R\$ 8.187,22			R\$ 0,00			
12.5.1	C446	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA 30x30x5cm	M2	17,60	114,38	2.013,09	-	-	2.013,09	2.013,09	0,00	17,60	0,00%	-	-
12.5.2	C1427	CERÂMICA, ACIMA DE 30,00 cm (900 cm) E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	M2	17,60	11,14	196,06	-	-	196,06	196,06	0,00	17,60	0,00%	-	-
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PRIMEIRAR 1:3:6 SP-5	M2	7,59	15,39	116,81	-	-	116,81	116,81	0,00	7,59	0,00%	-	-

ATA DE MEDIÇÃO
 28/06/2024
 17/07/2024
 05/08/2023

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851740

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851740

PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VALADARES
 RUA DA VILA, S/Nº - JAGUARIBE - CE
 CEP: 55908-7006. E-MAIL: COORDENADOR@REALIZA-CE.COM.BR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.			QUANT. REDUZIDO	QUANT. ADICIONADO			P. TOTAL	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.110/0001-08			MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: subseq. 5 de agosto de 2023												
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BOM, TAVANÓIA E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			LEGENDA: ◀ QUANT. C/ACRÉSCIMO ▶ QUANT. C/DECRÉSCIMO ◀ ITEM NOVO (a/Preço Est.) ▶ ITEM NOVO (Adicional) ◀ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ▶ ITEM SEM ALTERAÇÕES												
125.4	C304	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ FERRUGEM. TRACO 1:3:10. ESP. 20 mm/27,00	M2	7,59	46,95	348,76	-	-	7,59	348,76	0,00	7,59	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 348,76
125.5	C376	TRACO 1:3:10. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRUGEM. TRACO 1:3:10. ESP. 20 mm/27,00	M2	89,42	7,94	701,05	-	-	89,42	701,05	0,00	89,42	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 701,05
125.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA. TRACO 1:3:10. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA. TRACO 1:3:10. ESP. 20 mm/27,00	M2	71,82	54,88	3.941,48	-	-	71,82	3.941,48	0,00	71,82	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.941,48
125.7	C3028	TRACO 1:3:10. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA. TRACO 1:3:10. ESP. 20 mm/27,00	M2	17,60	49,43	869,97	-	-	17,60	869,97	0,00	17,60	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 869,97
125.8	C1607	SISTEMA DE FISSOS	M2	59,58	60,71	3.582,25	-	-	59,58	3.582,25	0,00	59,58	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.582,25
125.9	C179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FERRUGEM. TRACO 1:3:10. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA. TRACO 1:3:10. ESP. 20 mm/27,00	M2	28,34	108,86	3.062,25	-	-	28,34	3.062,25	0,00	28,34	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.062,25
125.3	C3001	ACIMA DE 30x30	M2	7,59	84,55	640,25	-	-	7,59	640,25	0,00	7,59	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 640,25
125.4	C1427	RELEVAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE C/ ARG. MISTO DE 20x20 cm (800 cm²) E PORCELANITOS (PARALELEGRAMO)	M2	7,59	11,14	84,55	-	-	7,59	84,55	0,00	7,59	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 84,55
125.5	C4819	FISO INTERTRAVADO TIPO TROQUINHO (20x10x5 CM) 50MPa, COR CINZA - CONCRETAGEM LOCALIZADA	M2	2,02	60,71	122,63	-	-	2,02	122,63	0,00	2,02	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 122,63
12.7	SISTEMA DE COBERTURA														
127.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO 6mm	M2	7,04	154,15	1.085,22	-	-	7,04	1.085,22	0,00	7,04	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.085,22
127.2	C0778	CHAPIS PRENDIDOR DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	354,84	-	-	2,51	354,84	0,00	2,51	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 354,84
127.3	C1249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 30cm	M	7,54	43,17	325,50	-	-	7,54	325,50	0,00	7,54	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 325,50
127.4	C0662	CALHA DE FIBRILGAS ESP=2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	-	-	4,14	196,69	0,00	4,14	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 196,69
12.8	ESQUADRIAS														
128.1	100701	PORTA DE FERRO DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	724,29	2.129,41	-	-	2,94	2.129,41	0,00	2,94	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.129,41
128.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59	307,18	-	-	2,00	307,18	0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 307,18
128.3	C0364	CORRIGÃO ANTICHAUVA (60x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3:10	M2	0,64	105,45	67,49	-	-	0,64	67,49	0,00	0,64	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 67,49
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS														
129.1	89488	APLICADOR MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EMERSONE DE BRANCO	M2	7,59	17,99	136,54	-	-	7,59	136,54	0,00	7,59	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 136,54
129.2	89489	APLICADOR MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES	M2	71,82	15,88	1.140,50	-	-	71,82	1.140,50	0,00	71,82	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.140,50
129.3	C1179	ESPALENTE DUAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65	-	-	5,88	281,65	0,00	5,88	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 281,65

PROFESSOR RICARDO ZAR P. PINHEIRO
 CREA-CE: 0601851700

RICARDO ZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira

PROFESSOR RICARDO ZAR P. PINHEIRO
 CREA-CE: 0601851700

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			UNED	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08			MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: subado, 5 de agosto de 2023			VALORES (R\$)			CONTRATO: 20.0202/2023			
						R\$ 38.598,93			R\$ 10.658,93			ADITIVO:			
						R\$ 518,58			R\$ 518,58			VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.541,85			
												VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 12.143,82			
												MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.090.378,69			
												SALDO: R\$ 518.175,83			
												PERC. DE ADITIVO: 3,62%			
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10.1.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 518,58	R\$ 518,58	R\$ 518,58	R\$ 518,58	R\$ 518,58	R\$ 518,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10.1.1.1	12.10.1.1.1	1.62	7,00	11,39	11,39	1,62	11,39	1,62	11,39	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00%	-
12.10.1.1.2	12.10.1.1.2	15,80	9,51	150,26	150,26	15,80	150,26	15,80	150,26	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00%	-
12.10.1.1.3	12.10.1.1.3	0,64	14,77	9,45	9,45	0,64	9,45	0,64	9,45	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00%	-
12.10.1.1.4	12.10.1.1.4	0,66	21,98	14,51	14,51	0,66	14,51	0,66	14,51	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00%	-
12.10.1.5	9470B	1,00	26,60	26,60	26,60	1,00	26,60	1,00	26,60	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.6	9470H	1,00	35,57	35,57	35,57	1,00	35,57	1,00	35,57	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.7	C138	2,00	71,86	143,72	143,72	2,00	143,72	2,00	143,72	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
12.10.1.8	10304	1,00	26,09	26,09	26,09	1,00	26,09	1,00	26,09	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.9	10347	1,00	6,65	6,65	6,65	1,00	6,65	1,00	6,65	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.10	89409	1,00	10,20	10,20	10,20	1,00	10,20	1,00	10,20	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.11	89386	1,00	8,31	8,31	8,31	1,00	8,31	1,00	8,31	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.12	89362	1,00	9,89	9,89	9,89	1,00	9,89	1,00	9,89	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.13	89367	1,00	14,25	14,25	14,25	1,00	14,25	1,00	14,25	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.14	3515	1,00	9,39	9,39	9,39	1,00	9,39	1,00	9,39	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.1.15	20147	1,00	7,73	7,73	7,73	1,00	7,73	1,00	7,73	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-

PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO VOLTA DO SERRA DO SUCUPIRA, JAGUARIBE - PE
SINOPSE Nº 001/2023
PROJETO Nº 001/2023
PROJETO Nº 001/2023
PROJETO Nº 001/2023
PROJETO Nº 001/2023

RICARDO AZAR B. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060185170n

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira

PROJETO Nº 001/2023
PROJETO Nº 001/2023
PROJETO Nº 001/2023
PROJETO Nº 001/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 11		VALORES (R\$)						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	ACUM. ATUAL
			CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)		
			QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	ACUM. ATUAL	
12.10.1.16	8924	18 DE MEDIÇÃO, PVC SOLVÁVEL, DN 100MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1,00	21,68	21,68	-	-	1,00	21,68	-	-	0,00%	-
12.10.1.17	8940	18 PVC SOLVÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	12,69	12,69	-	-	1,00	12,69	-	-	0,00%	-
12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 6.634,53		R\$ 0,00		R\$ 6.634,53			0,00%	R\$ 0,00
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_06/2022	M	2,54	22,55	57,28	-	-	2,54	57,28	-	-	0,00%	-
12.10.2.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 80 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_06/2022	M	10,94	15,56	170,29	-	-	10,94	170,29	-	-	0,00%	-
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_06/2022	M	7,64	44,13	337,15	-	-	7,64	337,15	-	-	0,00%	-
12.10.2.4	8986	CAIXA SIFONADA ISOLADA SEM COM GRELHA - PUXÃO POPULAR	UN	2,00	61,59	123,18	-	-	2,00	123,18	-	-	0,00%	-
12.10.2.5	8985	CAIXA DE INSERÇÃO EM ALUMÍNIO - 1/2 TÍDULO COMUM	M2	1,00	197,61	197,61	-	-	1,00	197,61	-	-	0,00%	-
12.10.2.6	89726	DESLHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLVÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	2,00	9,85	19,66	-	-	2,00	19,66	-	-	0,00%	-
12.10.2.7	89724	DESLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLVÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	4,00	13,33	54,12	-	-	4,00	54,12	-	-	0,00%	-
12.10.2.8	89801	DESLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_06/2022	UN	6,00	12,64	77,64	-	-	6,00	77,64	-	-	0,00%	-
12.10.2.9	8974	DESLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_06/2022	UN	1,00	35,84	35,84	-	-	1,00	35,84	-	-	0,00%	-
12.10.2.10	3659	LANÇAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESCOTO	UN	2,00	23,09	46,18	-	-	2,00	46,18	-	-	0,00%	-
12.10.2.11	C1761	LUMI SIMPLES PVC BRANCO (ESOTO 50mm (2"))	UN	8,00	11,25	90,00	-	-	8,00	90,00	-	-	0,00%	-
12.10.2.12	C1768	LUMI SIMPLES PVC BRANCO (ESOTO 100mm (4"))	UN	4,00	23,63	94,52	-	-	4,00	94,52	-	-	0,00%	-
12.10.2.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO DE ESCOTO	UN	2,00	23,86	47,72	-	-	2,00	47,72	-	-	0,00%	-

REALIZA CONSTRUTORA
 RUA PROF. CARLOS DE FREITAS BARROSO
 Nº 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA - JAGUARIBE - PE
 CEP: 55.900-000
 FONE: (51) 3333-1000
 E-MAIL: contato@realiza.com.br

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUIRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		LEGENDA: ◀ QUANT. C/ ACRESCIMO ◀ QUANT. C/ DECRESCIMO ◀ ITEM NOVO (p/ Preço Excl) ◀ ITEM NOVO (Adicional) ◀ ITEM SUPRIMENTO (Excluder) ◀ ITEM SEM ALTERAÇÕES		MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023		VALORES (R\$) ADITIVO: R\$ 1.547.912,67 VALOR TOTAL SERV.: R\$ 60.561,85 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.608.534,52 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 323.859,92 SALDO: R\$ 1.090.779,89 PERC. DE ADITIVO: 3,92%	
---	--	--	--	---	--	---	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR
5.1	C028	CORTE E ATERRO COMPENSO S/CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO	M3	259,33	9,74	2.515,50	143,84	1.395,25	115,49	1.120,25	100,00%	0,00	1.120,25	1.120,25
5.2	C233	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO LIXO EM CAMINHÃO ATÉ 50M	M3	7,36	30,46	223,88	49,78	1.516,30	57,13	1.740,18	100,00%	0,00	1.740,18	1.740,18
5.3	C146	CONTAÇÃO DE ATERROS 100M P.N	M3	7,36	4,67	34,32	49,78	232,47	57,13	366,80	100,00%	0,00	266,80	266,80
5.4	C309	REGIÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2.CAT.	M3	7,36	9,56	70,27	49,78	475,90	57,13	546,16	100,00%	0,00	546,16	546,16
4	RENDIMENTOS					R\$ 5.979,95		R\$ 0,00		R\$ 5.979,95	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95
5	ESTRUTURA					R\$ 979,95		R\$ 0,00		R\$ 979,95	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 979,95	R\$ 11.927,24
5.1	9304	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.356,62			90,80	7.356,62	100,00%	0,00	7.356,62	7.356,62
5.2	9435	MOZARTE E DESMONTAGEM DE PÓRTO DE REJARES RETANGULARES E ESTRELADES SIMILARES, FECHAMENTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	58,76	546,29			9,28	546,29	100,00%	0,00	546,29	546,29
5.3	C0216	ARMADURA CADA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.052,20			114,52	2.052,20	100,00%	0,00	2.052,20	2.052,20
5.4	C0217	ARMADURA C-60 FVNA D=8,0 A 6,0mm	KG	42,87	15,67	671,77			42,87	671,77	100,00%	0,00	671,77	671,77
5.5	C0842	CONCRETO F/IBR. FOX 20 MPa COM AGRÉGIO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	983,23			1,86	983,23	100,00%	0,00	983,23	983,23
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/FELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13			1,86	318,13	100,00%	0,00	318,13	318,13
6	MURETA					R\$ 11.989,36		R\$ 0,00		R\$ 11.989,36	96,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.450,54	R\$ 11.450,54
6.1	C074	ALVENARIA DE TIZO CERÂMICO FURADO (0x19x19)cm	M2	46,40	132,93	6.157,95			46,40	6.157,95	100,00%	0,00	6.157,95	6.157,95
6.2	C076	ALVENARIA DE TIZO CERÂMICO FURADO (0x19x19)cm	M2	92,80	7,84	727,85			92,80	727,85	100,00%	0,00	727,85	727,85
6.3	C038	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRAVA, 2.CAT. 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86			92,80	5.092,86	89,00%	9,80	4.955,04	4.955,04
7	MURO					R\$ 15.284,77		R\$ 0,00		R\$ 15.284,77	94%	R\$ 89.824,33	R\$ 89.824,33	
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (P/L+CHOTA) REBOCADO	M2	212,43	390,89	74.539,56	49,56	15.284,77	255,99	89.824,33	100,00%	0,00	89.824,33	89.824,33
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	7,40	724,29	5.359,75			7,40	5.359,75	0,00%	7,40	-	-
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68			2,00	323,68	0,00%	2,00	-	-
8	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 80.975,24		R\$ 0,00		R\$ 80.975,24	86,00%	R\$ 66.571,40	R\$ 66.571,40	
8.1	C266	LUSTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	113,84	2.732,16			24,00	2.732,16	100,00%	0,00	2.732,16	2.732,16
8.2	C198	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	31.915,20			480,00	31.915,20	100,00%	0,00	31.915,20	31.915,20
8.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1 DE 3A F. PLACAGEM UTIL. 5 X	M2	7,36	83,96	617,95			7,36	617,95	100,00%	0,00	617,95	617,95
8.4	C0071	ARMADURA EM TELA SOLDADA Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44			576,00	7.165,44	100,00%	0,00	7.165,44	7.165,44
8.5	C0842	CONCRETO F/IBR. FOX 20 MPa COM AGRÉGIO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62	20.299,01			38,40	20.299,01	0,00%	38,40	20.299,01	20.299,01
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/FELEVAÇÃO	M3	38,40	171,04	6.567,94			38,40	6.567,94	100,00%	0,00	6.567,94	6.567,94

REALIZA
 Engenharia e Arquitetura

CARTE PARADO
 com data de emissão
 08/08/2023
 17:00:33-49

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira

PROJETADA 2 - LOTAMENTO VOLT...
 CONTATO: (81) 9.9058-7606, E MAIL: CO...
 9111-0016/15884

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
			UNID	QUANT.			QUANT. REDUZIDO	QUANT. ADICIONADO											
<p>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.85.118/0001-08</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANUÁ E VÁZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																			
<p>LEGENDA:</p> <p>▲ QUANT. C/ACRESCIMO ▼ QUANT. C/DECRESCIMO ◀ ITEM NOVO (e Preço Excl) ▶ ITEM NOVO (Adicional) ◀ ITEM SUPRIMIDO (E-valor) ▲ ITEM SEM ALTERAÇÕES</p>																			
<p>MEDIDAÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023</p>																			
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.008.334,52 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 12.432,92 SALDO: R\$ 1.090.376,69 PERC. DE ADITIVO: R\$ 518.175,83 VALORES (R\$) VALORES (R\$)</p>																			
8.7	11316	LANTA PLASTICA 11.2MM PARA FISCOS	M	640,00	1,75	1.120,00			640,00		1.120,00			0,00%	640,00				
<p>CONTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 300 MM, RAIO DE 1' (14 X 17) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.</p>																			
8.8	91282		H	30,00	9,15	279,90			30,00		279,90			100,00%	0,00			279,90	279,90
<p>PISO INTERTRAVADO TIPO TOLUINO (20X20XCM 3899A, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA</p>																			
8.9	C4819		M2	118,07	60,71	7.188,03			118,07		7.188,03			0,00%	118,07				
8.10	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,18	3.115,61			103,20		3.115,61			0,00%	103,20				
<p>9 ALAMBADO R\$ 94.128,16</p>																			
9.1	C4872	PORTÃO COM REPEL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (10X15)M, INCL.	UN	2,00	2.037,91	4.075,82			2,00		4.075,82			100,00%	0,00			4.075,82	4.075,82
<p>PLUMBERE DE SUSTENTADOR</p>																			
9.2	C0035	ALAMBADO Q/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE BARRA	M2	269,40	334,27	90.052,34			269,40		90.052,34			100,00%	0,00			90.052,34	90.052,34
<p>10 PINTURA R\$ 5.157,81</p>																			
10.1	C1614	LATELUMAS CEMAS EM PAREDES EXTERNAS SPANESL	M2	92,80	25,38	2.462,21			92,80		2.462,21			0,00%	92,80				
10.2	102584	TINTA ACRILICA EMBRANCO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60			271,16		2.711,60			0,00%	271,16				
<p>11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R\$ 28.196,05</p>																			
11.1	C1806	RELETOR EM LED, CORPO EM ALUMINIO, POTÊNCIA MÁXIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00			8,00		7.764,00			0,00%	8,00				
11.2	C0330	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, BARRAS ARMADORIO 6X16G	UN	4,00	1.126,05	4.504,20			4,00		4.504,20			100,00%	0,00			4.504,20	4.504,20
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 60X4, 2-40M	UN	4,00	336,02	1.304,08			4,00		1.304,08			0,00%	4,00				
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBIBFOR ATE 13, 01/2025	UN	1,00	342,57	342,57			1,00		342,57			0,00%	1,00				
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49			1,00		34,49			0,00%	1,00				
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	26,33	26,33			1,00		26,33			0,00%	1,00				
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33			1,00		26,33			0,00%	1,00				
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC INCL. CONEXÕES Ø = 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94			61,76		1.183,94			0,00%	61,76				
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC INCL. CONEXÕES Ø = 32mm (1 1/4")	M	63,08	29,05	1.832,47			63,08		1.832,47			0,00%	63,08				
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC INCL. CONEXÕES Ø = 25mm (3/4")	M	9,44	39,73	375,05			9,44		375,05			0,00%	9,44				
11.11	91855	ELETRODUTO PVC INCL. CONEXÕES Ø = 32mm (1 1/4")	M	11,69	12,62	147,53			11,69		147,53			0,00%	11,69				
<p>MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - PREENCHIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2015</p>																			
11.12	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04			516,00		4.871,04			0,00%	516,00				
11.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51			78,60		611,51			0,00%	78,60				
11.14	C0504	CHUVA ALUMINIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO	UN	7,00	199,62	1.397,34			7,00		1.397,34			0,00%	7,00				
11.15	C2080	QUADRO 07/MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05			1,00		1.715,05			0,00%	1,00				
11.16	C1800	MURETA C/ TUDOLO MÓDULO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54			1,80		770,54			0,00%	1,80				

PROF. DR. RICARDO PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 06D185170N

RICARDO PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 06D185170N

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira

PROF. DR. RICARDO PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 06D185170N

BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)						
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 25.851.118/0001-08											CONTRATO: 26.03.02/2023		RE				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA											ADITIVO:		RE				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											MEDIÇÃO Nº 11		RE				
LEGENDA:											PERÍODO DOS SERVIÇOS:		RE				
◀ QUANT. C/ADRESCIMO ▶ QUANT. C/DECRESCIMO ◀ ITEM NOVO (P/ Preço Excl) ▶ ITEM NOVO (Adicionado) ◀ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ▶ ITEM SEM ALTERAÇÕES											28/06/2024 A 17/07/2024		RE				
CONTRATUAL											DATA DE EMISSÃO:		RE				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ATUAL
											PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ATUAL		
11.17	C467	FORTE DE CIMENTO DUPOLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG.	UN	1,00	933,46	933,46					1,00	933,46			0,00%	1,00	933,46
11.18	C196	INTERLUPOR LAMA TELAS SIMILAR E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V.	UN	1,00	38,52	38,52					1,00	38,52			0,00%	1,00	77,43
11.19	C199	INTERLUPOR LAMA TELAS SIMILAR 10A 250V.	UN	2,00	19,64	39,28					2,00	39,28			0,00%	2,00	116,71
11.20	9138	FORNHEIRO 4" X 4" PVC, INSTALADO EM LULA - INSTALAÇÃO 172015.	UN	3,00	13,42	40,26					3,00	40,26			0,00%	3,00	156,97
11.21	16432	CAMA DE EMBUTIR PVC - 402 RETANGULAR	UN	3,00	6,66	19,98					3,00	19,98			0,00%	3,00	176,95
11.22	18915	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO ALPI 0670V, 10MM2	M	78,00	155,22	12.099,96					78,00	12.099,96			0,00%	78,00	12.276,91
12		SANHUMBROS				R\$ 39.902,02				R\$ 0,00					4,00%		R\$ 1.399,10
12.1		SERVIDOR PREENHIMES				R\$ 72,43				R\$ 0,00					100,00%		R\$ 72,43
12.1.1	C180	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARANTO	M2	9,37	7,79	72,93					9,37	72,93			100,00%	9,37	72,93
12.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 519,30				R\$ 0,00					100,00%		R\$ 519,30
12.2.1	9258	REGIMENTAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.	M3	2,46	84,44	207,72					2,46	207,72			100,00%	2,46	207,72
12.2.2	9262	REABTERIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF.04/2016	M3	0,69	32,85	22,67					0,69	22,67			100,00%	0,69	22,67
12.2.3	0030	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, SFCONTROLE, MAT. CAUSTICAÇÃO	M3	2,43	118,48	287,91					2,43	287,91			100,00%	2,43	287,91
12.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				R\$ 8.434,68				R\$ 0,00					0,00%		R\$ 0,00
12.3.1	9617	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, ARTICADO EM BLOCOS DE FORAMENTO OU SÓLIDOS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 08/2017	M2	0,64	29,29	18,87					0,64	18,87			0,00%	0,64	18,87
12.3.2	0216	ARMAÇURA CA-50A MÉDIA D=8,3 A 10,0mm	KG	10,17	17,52	178,29					10,17	178,29			0,00%	10,17	178,29
12.3.3	0217	ARMAÇURA CA-60 FINE D=8,40 A 6,40mm	KG	15,67	49,74	778,43					15,67	778,43			0,00%	15,67	778,43
12.3.4	0282	CONCRETO P/B, FOR 20 MPa, COM AGREGADO ACQUIRDO	M3	1,88	528,62	993,80					1,88	993,80			0,00%	1,88	993,80
12.3.5	C184	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67					0,84	143,67			0,00%	0,84	143,67
12.3.6	C180	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60					1,09	315,60			0,00%	1,09	315,60
12.3.7	C391	FORMA PLANA CHAPA COMPRESSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm	M2	24,83	136,08	3.385,57					24,83	3.385,57			0,00%	24,83	3.385,57
12.3.8	C461	CHAVE PREFABRICADA TELADA P/PISO - VÍDEO DE 181 A 230	M2	9,37	159,97	1.498,92					9,37	1.498,92			0,00%	9,37	1.498,92
12.4		SISTEMA DE VIGIÇÃO VERTICAL				R\$ 4.199,96				R\$ 0,00					19,00%		R\$ 807,37
12.4.1	C079	ALTERNATIVA DE TIXO CERÂMICO FURADO (8x19x19cm)	M2	44,71	75,88	3.392,59					44,71	3.392,59			0,00%	44,71	3.392,59
12.4.2	C492	ALTERNATIVA DE PAINEL EM TIXO CERÂMICO FURADO (600x600x12,5mm)	M2	1,04	776,33	807,37					1,04	807,37			100,00%	1,04	807,37
12.5		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 8.187,22				R\$ 0,00					0,00%		R\$ 0,00
12.5.1	C446	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PREFABRICADA (600x600x12,5mm)	M2	17,60	114,38	2.013,09					17,60	2.013,09			0,00%	17,60	2.013,09
12.5.2	C147	REVESTIMENTO C/ ARG. PREFABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm, EM ZIMB. EM LAMA, COMINHA DE 30x30 cm (600 cm) E PORCELANITOS (60x60cm)	M2	17,60	114,38	2.013,09					17,60	2.013,09			0,00%	17,60	2.013,09

PROJETAÇÃO DE OBRAS

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Biogenes de Oliveira

[Handwritten signature]

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATO: 20.03.02/2023		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LDA CNPJ: 35.893.119/0001-08		ADITIVO:		R\$ 1.47.912,67	
				MEDIÇÃO Nº 11		R\$ 60.641,85	
				PERÍODO DOS SERVIÇOS:		R\$ 1.088.357,52	
				28/06/2024 A 11/07/2024		R\$ 22.449,92	
				DATA DE EMISSÃO:		R\$ 1.090.376,99	
				VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 518.175,83	
				VALOR ACUMULADO:		R\$ 332%	
				PERCENTUAL DE PAGAMENTO:			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTABILIZADO			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.5.3	C078	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	7,59	35,39	116,81		7,59	116,81		0,00	7,59	0,00%	
12.5.4	C004	TRACO 1:3 ESP=5	M2	7,59	46,86	346,76		7,59	346,76		0,00	7,59	0,00%	
12.5.5	C076	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	89,42	7,84	701,05		89,42	701,05		0,00	89,42	0,00%	
12.5.6	C028	TRACO 1:3 ESP=5	M2	71,82	54,88	3.941,48		71,82	3.941,48		0,00	71,82	0,00%	
12.5.7	C029	TRACO 1:3	M2	17,60	49,43	869,97		17,60	869,97		0,00	17,60	0,00%	
12.6. SISTEMA DE FERROS						R\$ 1.200,74			R\$ 1.200,74			0,00%		R\$ 0,00
12.6.1	C167	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 6x6cm	M2	7,59	59,58	452,21		7,59	452,21		0,00	7,59	0,00%	
12.6.2	C179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	7,59	26,34	215,10		7,59	215,10		0,00	7,59	0,00%	
12.6.3	C301	REBOCO DE 20MM DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	7,59	108,86	826,25		7,59	826,25		0,00	7,59	0,00%	
12.6.4	C147	REBOCO DE 20MM DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	7,59	11,14	84,55		7,59	84,55		0,00	7,59	0,00%	
12.6.5	C4819	REBOCO DE 20MM DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	2,02	60,71	122,60		2,02	122,60		0,00	2,02	0,00%	
12.7. SISTEMA DE COBERTURA						R\$ 1.062,22			R\$ 1.062,22			0,00%		R\$ 0,00
12.7.1	C002	COBERTURA C/ TELHA OCLADA DE FIBRO CIMENTO 6x6mm (1,062.22)	M2	7,04	151,45	1.062,22		7,04	1.062,22		0,00	7,04	0,00%	
12.7.2	C077	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,27	354,84		2,51	354,84		0,00	2,51	0,00%	
12.7.3	C1249	RUPO DE OCHA GALVANIZADA 36 DESENVOLVIMENTO 35cm	M	7,54	45,17	325,50		7,54	325,50		0,00	7,54	0,00%	
12.7.4	C0662	CALH. DE FIBROGLASS ESP= 7mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69		4,14	196,69		0,00	4,14	0,00%	
12.8. BARRIGUEIRAS						R\$ 2.504,08			R\$ 2.504,08			0,00%		R\$ 0,00
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAP. 45x100cm	M2	2,94	724,29	2.129,41		2,94	2.129,41		0,00	2,94	0,00%	
12.8.2	C1361	RECHUBADA COBERTA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	150,59	307,18		2,00	307,18		0,00	2,00	0,00%	
12.8.3	C0804	LOGO ANTOCHUVA (50x50) C/ ARG. CIMENTO E AREIA 1:3	M2	0,64	105,45	67,49		0,64	67,49		0,00	0,64	0,00%	
12.9. PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 1.559,69			R\$ 1.559,69			0,00%		R\$ 0,00
12.9.1	88498	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUS	M2	7,59	17,59	136,54		7,59	136,54		0,00	7,59	0,00%	
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	M2	71,82	15,88	1.140,50		71,82	1.140,50		0,00	71,82	0,00%	
12.9.3	C1279	EMALTE DAS DERMOS ENFLEQUADAS DE FERRO	M2	5,88	47,94	281,65		5,88	281,65		0,00	5,88	0,00%	

LEGENDA:

- QUANT. C/ACRESCIMO
- QUANT. C/DECRESCIMO
- ITEM NOVO (C/Preço E=0)
- ITEM NOVO (Adicional)
- ITEM SUPRIMIDO (E=0 ou 0)
- ITEM SEM VALORES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMBOUÁ E VIZINHO DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

(Handwritten signature)

RICARDO AZEVEDO PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851700

Antônio Eco. Diogenes de Oliveira

(Handwritten notes)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATO: 26.03.02/2023		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				ADITIVO:			
				MEDIÇÃO Nº 11			
				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024			
				VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.090.376,69			
				MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 122.443,92			
				BALDO: R\$ 518.175,83			
				PERC. DE ADITIVO: 3,92%			
				VALORES (R\$)			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO					QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
			QUANT.	P. UNIC. / UNID. R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL					PERCENT. %
12.10																	
12.10.1																	
12.10.1.1																	
	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	1,62	7,09	11,39		11,39		11,39	1,62	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 11,39	
	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (1")	15,80	9,51	150,26		150,26		150,26	15,80	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 161,65	
	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 37mm (1 1/2")	0,64	14,77	9,46		9,46		9,46	0,64	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 19,11	
	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/2")	2,66	21,98	14,51		14,51		14,51	2,66	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 23,77	
	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E RIE. DE MEDIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1	1,00	26,60	26,60		26,60		26,60	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 50,37	
	94704	INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE SUPRIMENTO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE SUPRIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	36,57	36,57		36,57		36,57	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 73,94	
	C2158	REGISTRO DE SAUETA BRUTO D= 25mm (1")	2,00	71,96	143,92		143,92		143,92	2,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 217,86	
	103041	BOBILHOTA 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM	1,00	26,09	26,09		26,09		26,09	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 243,95	
	103947	BUCHA DE MEDIÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, JP, 06/2022	1,00	6,65	6,65		6,65		6,65	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 250,60	
	89409	20x30x10 GALV. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 06/2022	1,00	10,20	10,20		10,20		10,20	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 260,80	
	89358	20x30x10 GALV. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 06/2022	1,00	8,31	8,31		8,31		8,31	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 269,11	
	89362	20x30x10 GALV. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 06/2022	1,00	9,89	9,89		9,89		9,89	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 279,00	
	89367	20x30x10 GALV. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 06/2022	1,00	14,25	14,25		14,25		14,25	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 293,25	
	3615	20x30x10 PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATHO, 30 GALV. 20 MM X 1/2" PARA ÁGUA RUA RREDIAL	1,00	9,39	9,39		9,39		9,39	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 302,64	
	20147	20x30x10 PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATHO, 30 GALV. 25 MM X 1/2" PARA ÁGUA RUA RREDIAL	1,00	7,73	7,73		7,73		7,73	1,00	0,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 310,37	

RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700
 CONTATO: (85) 93968-7608, E-MAIL: COO@REALIZAENGENHARIAECONSTRUCAO.COM.BR
 REALIZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)			
UNID	QUANT.	P. UNIT. C/IBDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANANÓDIA E VÁRZEA DO LAZERO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>															
12.10.1.16	89624	UN	1,00	21,68	21,68			1,00	21,68		0,00	21,68			21,68
12.10.1.17	89440	UN	1,00	12,69	12,69			1,00	12,69		0,00	12,69			12,69
12.10.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS															
12.10.2.1	89711	M	2,54	22,85	57,28			2,54	57,28		0,00	57,28			57,28
12.10.2.2	89796	M	10,94	15,56	170,23			10,94	170,23		0,00	170,23			170,23
12.10.2.3	89714	M	7,64	44,13	337,15			7,64	337,15		0,00	337,15			337,15
12.10.2.4	03586	UN	2,00	61,59	123,18			2,00	123,18		0,00	123,18			123,18
12.10.2.5	03605	M2	1,00	197,61	197,61			1,00	197,61		0,00	197,61			197,61
12.10.2.6	89726	UN	2,00	9,83	19,66			2,00	19,66		0,00	19,66			19,66
12.10.2.7	89724	UN	4,00	13,53	54,12			4,00	54,12		0,00	54,12			54,12
12.10.2.8	89801	UN	6,00	12,94	77,64			6,00	77,64		0,00	77,64			77,64
12.10.2.9	89744	UN	1,00	35,84	35,84			1,00	35,84		0,00	35,84			35,84
12.10.2.10	3659	UN	2,00	23,08	46,18			2,00	46,18		0,00	46,18			46,18
12.10.2.11	C1761	UN	8,00	11,25	90,00			8,00	90,00		0,00	90,00			90,00
12.10.2.12	C1760	UN	4,00	23,63	94,52			4,00	94,52		0,00	94,52			94,52
12.10.2.13	89625	UN	2,00	23,86	47,72			2,00	47,72		0,00	47,72			47,72
12.10.2.14	89796	UN	1,00	57,13	57,13			1,00	57,13		0,00	57,13			57,13
									R\$ 6.629,53	R\$ 0,00	R\$ 6.629,53	R\$ 0,00	R\$ 6.629,53	R\$ 0,00	R\$ 6.629,53

Medição realizada em 05/08/2023

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA - CE: 0601851700

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira

PROFESSOR R. JOSÉ DE SOUZA
RUA JOSÉ DE SOUZA, 100
CEP: 63015-000
JAGUARIBE - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATUAL		P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)				
				QUANT.	P. UNIT. R\$			QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ QUANT. ACRESCIM. (verde) ▲ QUANT. C/ DEBRECIM. (amarelo) ▲ TERMINO (p/ Preço Ess) (laranja) ▲ ITEM SUPRIMIDO (Azul) ▲ ITEM ALTERADO (roxo) 																			
<p>CONTRATO: 20.02.02/2023</p> <p>ADITIVO: R\$ 1.547.912,67</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,85</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.688.554,52</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 32.443,92</p> <p>SALDO: R\$ 1.090.278,69</p> <p>PERC. DE ADITIVO: R\$ 518.175,83 (35,2%)</p>																			
<p>MEDIÇÃO Nº 11</p> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023</p>																			
<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDA E VARZE DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																			
3	MOVIMENTO DE TERRA																		
3.1	9338	RESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 CM.	MG	14,85	84,44	R\$ 0,00	R\$ 2.389,48	14,85	1.263,93	-	14,85	14,85	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.389,48	R\$ 2.389,48			
3.2	9382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AFE. AMPLIA	MG	3,71	37,86	R\$ 0,00	121,87	3,71	121,87	-	3,71	3,71	100,00%	R\$ 0,00	121,87	121,87			
3.3	0398	CORTE E TERRO COMPENSADO APROXIMADO DO GRÁU DE TRANSPORTABILIDADE, EXCETO ROCHA EM CAMPIÃO ATE 8,0M	MG	33,08	9,70	R\$ 0,00	330,88	33,08	330,88	-	33,08	33,08	100,00%	R\$ 0,00	330,88	330,88			
3.4	C333	COMPACTAÇÃO DE ATÉ 15 CM DE CAMPIÃO ATE 8,0M	MG	15,48	30,46	R\$ 0,00	471,52	15,48	471,52	-	15,48	15,48	100,00%	R\$ 0,00	471,52	471,52			
3.5	03146	COMPACTAÇÃO DE ATÉ 10 CM P/N	MG	15,48	4,67	R\$ 0,00	72,29	15,48	72,29	-	15,48	15,48	100,00%	R\$ 0,00	72,29	72,29			
3.6	C329	RESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2x2x2	MG	15,48	9,56	R\$ 0,00	147,99	15,48	147,99	-	15,48	15,48	100,00%	R\$ 0,00	147,99	147,99			
4	FUNDAÇÕES																		
4.1	C054	ALVENARIA DE EMPILHAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	MG	11,14	539,80	R\$ 0,00	5.979,95	11,14	5.979,95	-	11,14	11,14	100,00%	R\$ 0,00	5.979,95	5.979,95			
5	ESTRUTURA																		
5.1	9324	CINTA DE AMBARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	R\$ 0,00	7.356,62	90,80	7.356,62	-	90,80	90,80	100,00%	R\$ 0,00	7.356,62	7.356,62			
5.2	9245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PEDRETO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	56,76	R\$ 0,00	545,29	9,28	545,29	-	9,28	9,28	100,00%	R\$ 0,00	545,29	545,29			
5.3	C026	ARMADURA CASCA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	R\$ 0,00	2.052,20	114,52	2.052,20	-	114,52	114,52	100,00%	R\$ 0,00	2.052,20	2.052,20			
5.4	C027	ARMADURA CA-40 FEM D= 4,8 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	R\$ 0,00	671,77	42,87	671,77	-	42,87	42,87	100,00%	R\$ 0,00	671,77	671,77			
5.5	C082	CONCRETO F/BR. FOC. 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	R\$ 0,00	983,23	1,86	983,23	-	1,86	1,86	100,00%	R\$ 0,00	983,23	983,23			
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	R\$ 0,00	318,13	1,86	318,13	-	1,86	1,86	100,00%	R\$ 0,00	318,13	318,13			
6	MURETA																		
6.1	C024	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm DE CALHIZADA LARGA 20	M2	46,40	131,93	R\$ 0,00	6.167,95	46,40	6.167,95	-	46,40	46,40	100,00%	R\$ 0,00	6.167,95	6.167,95			
6.2	C076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1/3/6	M2	92,80	7,84	R\$ 0,00	727,55	92,80	727,55	-	92,80	92,80	100,00%	R\$ 0,00	727,55	727,55			
6.3	C028	SOMBRILHADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1/3/6, 2x2x2	M2	92,80	54,88	R\$ 0,00	5.092,86	92,80	5.092,86	-	92,80	92,80	100,00%	R\$ 0,00	5.092,86	5.092,86			
7	MURO																		
7.1	C187	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PARA-CINTA) REBOCO, COM BORDA	M2	251,52	350,89	R\$ 0,00	88.259,85	251,52	88.259,85	-	251,52	251,52	100,00%	R\$ 0,00	88.259,85	88.259,85			
7.2	10070	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	8,80	724,29	R\$ 0,00	6.379,75	8,80	6.379,75	-	8,80	8,80	100,00%	R\$ 0,00	6.379,75	6.379,75			
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	R\$ 0,00	323,68	2,00	323,68	-	2,00	2,00	100,00%	R\$ 0,00	323,68	323,68			

PROJETAÇÃO DE OBRAS
 RUA... Nº...
 JAGUARIBE - CE
 0601851700

RICARDO ZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Biogenes de Oliveira

PROJETAÇÃO DE OBRAS
 RUA... Nº...
 JAGUARIBE - CE
 0601851700

ITEM		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO					P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
8 PAVIMENTAÇÃO															
B.1	C264	LAJTO DE PÓ DE PEDRA	M2	24,00	2.732,16	-	-	24,00	2.732,16	90,00%	R\$ 0,00	R\$ 80.975,24	R\$ 0,00	R\$ 79.855,24	
B.2	C148	POLIMENTO BPFISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,48	-	-	480,00	66,48	100,00%	R\$ 0,00	66,48	-	66,48	
B.3	C140	FORMA DE TUBAS DE 1" DE RAJUNÇÕES UTIL 5 X	M2	7,36	617,95	-	-	7,36	617,95	100,00%	R\$ 0,00	617,95	-	617,95	
B.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLUVEL Q-92	M2	576,00	12,44	-	-	576,00	12,44	100,00%	R\$ 0,00	12,44	-	12,44	
B.5	C0842	CONCRETO F/TPR, F02, 20 MPa COM ARGILOSO AQUÍRIDO	M3	38,40	20.299,01	-	-	38,40	20.299,01	100,00%	R\$ 0,00	20.299,01	-	20.299,01	
B.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	6.567,94	-	-	38,40	6.567,94	100,00%	R\$ 0,00	6.567,94	-	6.567,94	
B.7	11316	JANTA PLÁSTICA 1,2MM PARA PISOS	M	640,00	1.120,00	-	-	640,00	1.120,00	0,00%	R\$ 0,00	1.120,00	-	1.120,00	
B.8	91282	CONFABRICAÇÃO DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMÉTRICO DE 350 MM, FIAO DE 3" (H X L) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	30,00	279,90	-	-	30,00	279,90	100,00%	R\$ 0,00	279,90	-	279,90	
B.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOQUINA (200X100X6 CM 50MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	7.168,03	-	-	118,07	7.168,03	100,00%	R\$ 0,00	7.168,03	-	7.168,03	
B.10	C0365	BANQUETE/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	3.115,61	-	-	103,20	3.115,61	100,00%	R\$ 0,00	3.115,61	-	3.115,61	
9 ALAMBRADO															
9.1	C4872	POSTO COM PEPE, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (192,5mm INCL. SERRA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	UN	2,00	4.075,82	-	-	2,00	4.075,82	100,00%	R\$ 0,00	4.075,82	-	4.075,82	
9.2	C0035	ALAMBRADO 7/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PONTA	M2	269,40	90.052,34	-	-	269,40	90.052,34	100,00%	R\$ 0,00	90.052,34	-	90.052,34	
10 PINTURA															
10.1	C1614	LATEX DUS FEMAS EM PAREDES EXTERNAS S/ANSA	M2	92,80	2.446,21	-	-	92,80	2.446,21	0,00%	R\$ 0,00	2.446,21	-	2.446,21	
10.2	102504	PRIMEIRA DE SANCARICAÇÃO DE QUEDA POLIÉSTERICA COM TINTA ACRILICA	M	271,16	2.711,60	-	-	271,16	2.711,60	0,00%	R\$ 0,00	2.711,60	-	2.711,60	

[Handwritten signature]

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

[Handwritten notes and stamps]

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/ÍNDI R\$	P. TOTAL	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	ACUM. ATUAL	
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R\$ 0,00 R\$ 28.244,22 R\$ 28.244,22 R\$ 28.244,22														85,00%	R\$ 23.991,16
11.1	C180	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 500W, DE CONCRETO C/GRANULADO, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 300G, 400G, 500G, 600G, 700G, 800G, 900G, 1000G, 1200G, 1500G, 2000G, 2500G, 3000G, 3500G, 4000G, 4500G, 5000G, 5500G, 6000G, 6500G, 7000G, 7500G, 8000G, 8500G, 9000G, 9500G, 10000G, 11000G, 12000G, 13000G, 14000G, 15000G, 16000G, 17000G, 18000G, 19000G, 20000G, 21000G, 22000G, 23000G, 24000G, 25000G, 26000G, 27000G, 28000G, 29000G, 30000G, 31000G, 32000G, 33000G, 34000G, 35000G, 36000G, 37000G, 38000G, 39000G, 40000G, 41000G, 42000G, 43000G, 44000G, 45000G, 46000G, 47000G, 48000G, 49000G, 50000G, 51000G, 52000G, 53000G, 54000G, 55000G, 56000G, 57000G, 58000G, 59000G, 60000G, 61000G, 62000G, 63000G, 64000G, 65000G, 66000G, 67000G, 68000G, 69000G, 70000G, 71000G, 72000G, 73000G, 74000G, 75000G, 76000G, 77000G, 78000G, 79000G, 80000G, 81000G, 82000G, 83000G, 84000G, 85000G, 86000G, 87000G, 88000G, 89000G, 90000G, 91000G, 92000G, 93000G, 94000G, 95000G, 96000G, 97000G, 98000G, 99000G, 100000G	UN	8,00	970,00	7.760,00			8,00	7.760,00	8,00	0,00	100,00%	7.760,00	
11.2	C5200	200G DE CONCRETO C/GRANULADO, RESISTÊNCIA NOMINAL 200G, 300G, 400G, 500G, 600G, 700G, 800G, 900G, 1000G, 1100G, 1200G, 1300G, 1400G, 1500G, 1600G, 1700G, 1800G, 1900G, 2000G, 2100G, 2200G, 2300G, 2400G, 2500G, 2600G, 2700G, 2800G, 2900G, 3000G, 3100G, 3200G, 3300G, 3400G, 3500G, 3600G, 3700G, 3800G, 3900G, 4000G, 4100G, 4200G, 4300G, 4400G, 4500G, 4600G, 4700G, 4800G, 4900G, 5000G, 5100G, 5200G, 5300G, 5400G, 5500G, 5600G, 5700G, 5800G, 5900G, 6000G, 6100G, 6200G, 6300G, 6400G, 6500G, 6600G, 6700G, 6800G, 6900G, 7000G, 7100G, 7200G, 7300G, 7400G, 7500G, 7600G, 7700G, 7800G, 7900G, 8000G, 8100G, 8200G, 8300G, 8400G, 8500G, 8600G, 8700G, 8800G, 8900G, 9000G, 9100G, 9200G, 9300G, 9400G, 9500G, 9600G, 9700G, 9800G, 9900G, 10000G	UN	4,00	1.125,00	4.500,00			4,00	4.500,00	4,00	0,00	100,00%	4.500,00	
11.3	C1765	TRABALHO COMPLETO C/FAIXA CORRIDA 50X3,40X4	UN	4,00	326,02	1.304,08			4,00	1.304,08	4,00	0,00	100,00%	1.304,08	
11.4	C2072	CURSO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPORTE 30X30X10,00, 30X30X12,00, 30X30X15,00, 30X30X18,00, 30X30X21,00, 30X30X24,00, 30X30X27,00, 30X30X30,00, 30X30X33,00, 30X30X36,00, 30X30X39,00, 30X30X42,00, 30X30X45,00, 30X30X48,00, 30X30X51,00, 30X30X54,00, 30X30X57,00, 30X30X60,00, 30X30X63,00, 30X30X66,00, 30X30X69,00, 30X30X72,00, 30X30X75,00, 30X30X78,00, 30X30X81,00, 30X30X84,00, 30X30X87,00, 30X30X90,00, 30X30X93,00, 30X30X96,00, 30X30X99,00, 30X30X102,00, 30X30X105,00, 30X30X108,00, 30X30X111,00, 30X30X114,00, 30X30X117,00, 30X30X120,00, 30X30X123,00, 30X30X126,00, 30X30X129,00, 30X30X132,00, 30X30X135,00, 30X30X138,00, 30X30X141,00, 30X30X144,00, 30X30X147,00, 30X30X150,00, 30X30X153,00, 30X30X156,00, 30X30X159,00, 30X30X162,00, 30X30X165,00, 30X30X168,00, 30X30X171,00, 30X30X174,00, 30X30X177,00, 30X30X180,00, 30X30X183,00, 30X30X186,00, 30X30X189,00, 30X30X192,00, 30X30X195,00, 30X30X198,00, 30X30X201,00, 30X30X204,00, 30X30X207,00, 30X30X210,00, 30X30X213,00, 30X30X216,00, 30X30X219,00, 30X30X222,00, 30X30X225,00, 30X30X228,00, 30X30X231,00, 30X30X234,00, 30X30X237,00, 30X30X240,00, 30X30X243,00, 30X30X246,00, 30X30X249,00, 30X30X252,00, 30X30X255,00, 30X30X258,00, 30X30X261,00, 30X30X264,00, 30X30X267,00, 30X30X270,00, 30X30X273,00, 30X30X276,00, 30X30X279,00, 30X30X282,00, 30X30X285,00, 30X30X288,00, 30X30X291,00, 30X30X294,00, 30X30X297,00, 30X30X300,00, 30X30X303,00, 30X30X306,00, 30X30X309,00, 30X30X312,00, 30X30X315,00, 30X30X318,00, 30X30X321,00, 30X30X324,00, 30X30X327,00, 30X30X330,00, 30X30X333,00, 30X30X336,00, 30X30X339,00, 30X30X342,00, 30X30X345,00, 30X30X348,00, 30X30X351,00, 30X30X354,00, 30X30X357,00, 30X30X360,00, 30X30X363,00, 30X30X366,00, 30X30X369,00, 30X30X372,00, 30X30X375,00, 30X30X378,00, 30X30X381,00, 30X30X384,00, 30X30X387,00, 30X30X390,00, 30X30X393,00, 30X30X396,00, 30X30X399,00, 30X30X402,00, 30X30X405,00, 30X30X408,00, 30X30X411,00, 30X30X414,00, 30X30X417,00, 30X30X420,00, 30X30X423,00, 30X30X426,00, 30X30X429,00, 30X30X432,00, 30X30X435,00, 30X30X438,00, 30X30X441,00, 30X30X444,00, 30X30X447,00, 30X30X450,00, 30X30X453,00, 30X30X456,00, 30X30X459,00, 30X30X462,00, 30X30X465,00, 30X30X468,00, 30X30X471,00, 30X30X474,00, 30X30X477,00, 30X30X480,00, 30X30X483,00, 30X30X486,00, 30X30X489,00, 30X30X492,00, 30X30X495,00, 30X30X498,00, 30X30X501,00, 30X30X504,00, 30X30X507,00, 30X30X510,00, 30X30X513,00, 30X30X516,00, 30X30X519,00, 30X30X522,00, 30X30X525,00, 30X30X528,00, 30X30X531,00, 30X30X534,00, 30X30X537,00, 30X30X540,00, 30X30X543,00, 30X30X546,00, 30X30X549,00, 30X30X552,00, 30X30X555,00, 30X30X558,00, 30X30X561,00, 30X30X564,00, 30X30X567,00, 30X30X570,00, 30X30X573,00, 30X30X576,00, 30X30X579,00, 30X30X582,00, 30X30X585,00, 30X30X588,00, 30X30X591,00, 30X30X594,00, 30X30X597,00, 30X30X600,00, 30X30X603,00, 30X30X606,00, 30X30X609,00, 30X30X612,00, 30X30X615,00, 30X30X618,00, 30X30X621,00, 30X30X624,00, 30X30X627,00, 30X30X630,00, 30X30X633,00, 30X30X636,00, 30X30X639,00, 30X30X642,00, 30X30X645,00, 30X30X648,00, 30X30X651,00, 30X30X654,00, 30X30X657,00, 30X30X660,00, 30X30X663,00, 30X30X666,00, 30X30X669,00, 30X30X672,00, 30X30X675,00, 30X30X678,00, 30X30X681,00, 30X30X684,00, 30X30X687,00, 30X30X690,00, 30X30X693,00, 30X30X696,00, 30X30X699,00, 30X30X702,00, 30X30X705,00, 30X30X708,00, 30X30X711,00, 30X30X714,00, 30X30X717,00, 30X30X720,00, 30X30X723,00, 30X30X726,00, 30X30X729,00, 30X30X732,00, 30X30X735,00, 30X30X738,00, 30X30X741,00, 30X30X744,00, 30X30X747,00, 30X30X750,00, 30X30X753,00, 30X30X756,00, 30X30X759,00, 30X30X762,00, 30X30X765,00, 30X30X768,00, 30X30X771,00, 30X30X774,00, 30X30X777,00, 30X30X780,00, 30X30X783,00, 30X30X786,00, 30X30X789,00, 30X30X792,00, 30X30X795,00, 30X30X798,00, 30X30X801,00, 30X30X804,00, 30X30X807,00, 30X30X810,00, 30X30X813,00, 30X30X816,00, 30X30X819,00, 30X30X822,00, 30X30X825,00, 30X30X828,00, 30X30X831,00, 30X30X834,00, 30X30X837,00, 30X30X840,00, 30X30X843,00, 30X30X846,00, 30X30X849,00, 30X30X852,00, 30X30X855,00, 30X30X858,00, 30X30X861,00, 30X30X864,00, 30X30X867,00, 30X30X870,00, 30X30X873,00, 30X30X876,00, 30X30X879,00, 30X30X882,00, 30X30X885,00, 30X30X888,00, 30X30X891,00, 30X30X894,00, 30X30X897,00, 30X30X900,00, 30X30X903,00, 30X30X906,00, 30X30X909,00, 30X30X912,00, 30X30X915,00, 30X30X918,00, 30X30X921,00, 30X30X924,00, 30X30X927,00, 30X30X930,00, 30X30X933,00, 30X30X936,00, 30X30X939,00, 30X30X942,00, 30X30X945,00, 30X30X948,00, 30X30X951,00, 30X30X954,00, 30X30X957,00, 30X30X960,00, 30X30X963,00, 30X30X966,00, 30X30X969,00, 30X30X972,00, 30X30X975,00, 30X30X978,00, 30X30X981,00, 30X30X984,00, 30X30X987,00, 30X30X990,00, 30X30X993,00, 30X30X996,00, 30X30X999,00, 100000G	UN	1,00	342,57	342,57			1,00	342,57	1,00	0,00	0,00%	342,57	
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49			1,00	34,49	1,00	0,00%	34,49		
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32			4,00	105,32	4,00	0,00%	105,32		
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33			1,00	26,33	1,00	0,00%	26,33		
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC INSC INCL. COBERTORES D= 25mm (Ø*)	M	61,76	19,77	1.183,94			61,76	1.183,94	61,76	0,00%	1.183,94		
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC INSC INCL. COBERTORES D= 32mm (Ø*)	M	63,08	29,59	1.827,47			63,08	1.827,47	63,08	0,00%	1.827,47		
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC INSC INCL. COBERTORES D= 50mm (Ø*)	M	9,44	39,75	375,05			9,44	375,05	9,44	0,00%	375,05		
11.11	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (Ø*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, JE 172015	M	11,69	12,62	147,53			11,69	147,53	11,69	0,00%	147,53		
11.12	C0934	CABO ISOLADO PVC 750V 25MM²	M	516,00	9,44	4.871,04			516,00	4.871,04	516,00	0,00%	4.871,04		
11.13	C0940	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM²	M	78,60	7,76	611,51			78,60	611,51	78,60	0,00%	611,51		
11.14	C0904	CHUVA ALVURA/TREBOCO / C/TAMPA CONCRETO S/PURDO QUADRO EM PAREDE	UN	7,00	199,62	1.397,34			7,00	1.397,34	7,00	0,00%	1.397,34		
11.15	C0900	QUADRO F/MEDIÇÃO EM PAREDE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05			1,00	1.715,05	1,00	0,00%	1.715,05		
11.16	C1803	MURETA C/TIPOLO MACIÇO REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M²	1,80	426,08	770,54			1,80	770,54	1,80	0,00%	770,54		
11.17	C1657	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 0,00M, PESO 200KG	UN	1,00	933,45	933,45			1,00	933,45	1,00	0,00%	933,45		
11.18	C1486	INTERLUPTOR LAMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	36,52	36,52			1,00	36,52	1,00	0,00%	36,52		
11.19	C1494	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LASE -- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, JE 172015	UN	3,00	19,64	58,92			3,00	58,92	3,00	0,00%	58,92		
11.20	91826	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LASE -- INSTALAÇÃO, JE 172015	UN	3,00	13,42	40,26			3,00	40,26	3,00	0,00%	40,26		

Handwritten signature and notes in blue ink.

RICARDO SZAR P. PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
						QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR				
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ QUANT. C/ADRESCIMO ▲ QUANT. C/DECRESCIMO ▲ ITEM NOVO (p/Preço Exat) ▲ ITEM NOVO (Adequado) ▲ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ▲ ITEM SEM ALTERAÇÕES 															
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023</p> <p>ADITIVO:</p> <p>VALOR TOTAL SERV.:</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO:</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA:</p> <p>SALDO:</p>															
<p>MEDIÇÃO Nº 11</p> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023</p>															
<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</p>															
12.1	1642	CAIXA DE EMPLUTIF. P.C. - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66	-	-	3,00	6,66	0,00	3,00	0,00%	-	-
12.2	1815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO ALVE 05/10V 10MM2	M	100,80	1,99	200,59	-	-	100,80	200,59	0,00	100,80	0,00%	-	-
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.902,02	R\$ 39.902,02	R\$ 0,00	R\$ 39.902,02	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 39.902,02
12.1.1	C150	LOCAÇÃO DA OBRA - SREÇÃO DE GARBATO	M2	9,37	7,73	72,43	-	-	9,37	72,43	0,00	9,37	100,00%	-	72,43
12.2 MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,30	R\$ 518,30	R\$ 0,00	R\$ 518,30	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 518,30
12.2.1	9358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,46	84,44	207,72	-	-	2,46	207,72	0,00	2,46	100,00%	-	207,72
12.2.2	9382	REABTIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	M3	0,69	32,85	22,67	-	-	0,69	22,67	0,00	0,69	100,00%	-	22,67
12.2.3	C030	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AMASSADO	M3	2,43	118,46	287,91	-	-	2,43	287,91	0,00	2,43	100,00%	-	287,91
12.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.434,68	R\$ 8.434,68	R\$ 0,00	R\$ 8.434,68	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.434,68	
12.3.1	9617	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU CERÂMICA	M2	0,64	22,23	14,87	-	-	0,64	14,87	0,00	0,64	100,00%	-	14,87
12.3.2	C026	ARMADURA CASCA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	-	-	101,17	1.812,97	0,00	101,17	100,00%	-	1.812,97
12.3.3	C027	ARMADURA CA-40 FRA D=4,0 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	497,84	-	-	31,77	497,84	0,00	31,77	100,00%	-	497,84
12.3.4	C094	CONCRETO F/BR. FOX 20 MPa COM AGERGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	538,62	1.020,24	-	-	1,93	1.020,24	0,00	1,93	100,00%	-	1.020,24
12.3.5	C168	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	-	-	0,84	143,67	0,00	0,84	100,00%	-	143,67
12.3.6	C163	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60	-	-	1,09	315,60	0,00	1,09	100,00%	-	315,60
12.3.7	C091	FORMA PLANA CHAPA COMPENSA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL-5X	M2	24,83	126,06	3.130,57	-	-	24,83	3.130,57	0,00	24,83	100,00%	-	3.130,57
12.3.8	C461	LAJE PRÉ-FABRICADA TRILHAÇÃO 17/19,0 - VÃO DE 1,81 A 2,80 (P/DEP/ISO)	M2	9,37	159,97	1.498,92	-	-	9,37	1.498,92	0,00	9,37	100,00%	-	1.498,92
12.4 SISTEMA DE TENDÃO VERTICAL						R\$ 4.199,96	R\$ 0,00	R\$ 4.199,96	R\$ 4.199,96	R\$ 0,00	R\$ 4.199,96	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.199,96	
12.4.1	C007	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) RECALIBRADA (ESM=16x11,3x8)	M2	44,71	75,88	3.392,59	-	-	44,71	3.392,59	0,00	44,71	100,00%	-	3.392,59
12.4.2	C492	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍDULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA C/ CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	778,32	807,37	-	-	1,04	807,37	0,00	1,04	100,00%	-	807,37
12.5 REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORS						R\$ 8.187,22	R\$ 0,00	R\$ 8.187,22	R\$ 8.187,22	R\$ 0,00	R\$ 8.187,22	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.187,22	
12.5.1	C446	CERÂMICA ENTAIXADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 3000cm	M2	17,60	114,36	2.013,09	-	-	17,60	2.013,09	0,00	17,60	100,00%	-	2.013,09
12.5.2	C147	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 5cm EM CERÂMICA ACIMA DE 3000cm (900 cm²) E PORCELANTOS (PARDEP/ISO)	M2	17,60	11,14	196,06	-	-	17,60	196,06	0,00	17,60	100,00%	-	196,06

(Handwritten signature)

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851700

Andréio Fco. Rodrigues de Oliveira

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
RUA CARVALHO DE OLIVEIRA, 344, 509
JAGUARIBE - CE
CPF: 0601851700

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										CONTRATO: 20.02.02/2023					
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08										ADITIVO:					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										VALOR TOTAL SERV.:					
LEGENDA:										VALOR DA MEDIÇÃO:					
◀ QUANT. ACRESCIM. (verde) ▶ QUANT. DECRESCIM. (laranja) ◀ ITEM NOVO (Pelo Est) (verde) ▶ ITEM NOVO (Adicional) (laranja) ◀ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) (verde) ▶ ITEM SEM ALTERAÇÕES (verde)										MEDIDA ACUMULADA:					
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024										R\$ 1.000.276,89					
DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023										SALDO:					
										R\$ 518.175,83					
										PERC. DE ADITIVO: 32,2%					
										VALORES (R\$)					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/INDI R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	ACUM. ATUAL
12.5.3	0278	CHARRISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENICILAR COLADO	M2	7,59	15,39		116,81			7,59			116,81	100,00%	116,81
12.5.4	0304	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	7,59	45,95		348,76			7,59			348,76	100,00%	348,76
12.5.5	0276	TRACO 1:3 ESP. + SUMO ELÉTRICO	M2	89,42	7,84		701,05			89,42			701,05	100,00%	701,05
12.5.6	0302	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENICILAR	M2	71,82	54,88		3.941,48			71,82			3.941,48	100,00%	3.941,48
12.5.7	0302	TRACO 1:3	M2	17,60	49,43		869,97			17,60			869,97	100,00%	869,97
12.6	SISTEMA DE PISOS										R\$ 1.700,74	R\$ 1.700,74	100,00%	R\$ 1.700,74	
12.6.1	C1607	LUSTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-ICH	M2	7,59	59,58		452,21			7,59			452,21	100,00%	452,21
12.6.2	C1279	REGULADOR DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	7,59	26,34		215,10			7,59			215,10	100,00%	215,10
12.6.3	C301	CERÂMICA ESMALTADA REFITICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA 30x30	M2	7,59	108,86		826,25			7,59			826,25	100,00%	826,25
12.6.4	C1427	ACIMA DE 30x30 (100cmx100cm) - 2mm E 6mm EM ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE PARALELOS	M2	7,59	11,14		84,55			7,59			84,55	100,00%	84,55
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDUNHO (20x10x6 CM) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	2,02	60,71		122,63			2,02			122,63	100,00%	122,63
12.7	SISTEMA DE COBERTURA										R\$ 1.962,25	R\$ 1.962,25	100,00%	R\$ 1.962,25	
12.7.1	C0802	COBERTURA C/TELA OCUCLUDA DE FIBRO-CONCRETO E-1mm	M2	7,04	151,15		1.065,22			7,04			1.065,22	100,00%	1.065,22
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37		354,84			2,51			354,84	100,00%	354,84
12.7.3	C1246	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 30cm	M	7,54	45,17		339,50			7,54			339,50	100,00%	339,50
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBROGLAS ESP. 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51		196,69			4,14			196,69	100,00%	196,69
12.8	ESQUADRIAS										R\$ 2.504,08	R\$ 2.504,08	100,00%	R\$ 2.504,08	
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	729,29		2.129,41			2,94			2.129,41	100,00%	2.129,41
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59		307,18			2,00			307,18	100,00%	307,18
12.8.3	C0804	COBRO ANTI-CHUVA (30x40) CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,84	105,45		87,49			0,84			87,49	100,00%	87,49

PROF. EDUARDO PINHEIRO BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
P.O. Caixa Postal 1603-449
Jaguaribe - CE

PROFESSOR RICARDO PINHEIRO
RICARDO PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL		P. TOTAL R\$		QUANT. ADICIONADO		P. TOTAL		QUANT. DEFINITIVO		P. TOTAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %		VALORES (R\$)			
						P. UNIT. C/BDI R\$																		CONTRATO: 20.03.02/2023			
																								ADITIVO:			
																								VALOR TOTAL SERV.			
																								VALOR DA MEDIÇÃO			
																								MEDIÇÃO ACUMULADA:			
																								SALDO:			
																								PERC. DE ADITIVO:			
																								VALORES (R\$)			
																								ACUM. ANTERIOR			
																								ACUM. ATUAL			
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 QUANT. C/ ACRESCIMO 4 QUANT. C/ DECREMENTO 4 ITEM NOVO (P. Prop. E=1) 4 ITEM NOVO (Medicando) 4 ITEM SUPRIMIDO (E=Adultr) 4 ITEM SEVALTERAÇÕES <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																											
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS																										
12.9.1	8948	M2	7,59	17,99	136,54	-	-	7,59	-	136,54	-	-	7,59	-	136,54	-	-	7,59	-	136,54	-	-	100,00%	R\$ 1.539,69	R\$ 1.539,69		
12.9.2	8949	M2	71,82	15,86	1.140,50	-	-	71,82	-	1.140,50	-	-	71,82	-	1.140,50	-	-	71,82	-	1.140,50	-	-	100,00%	1.140,50	1.140,50		
12.9.3	1179	M2	5,86	47,50	281,65	-	-	5,86	-	281,65	-	-	5,86	-	281,65	-	-	5,86	-	281,65	-	-	100,00%	281,65	281,65		
12.10	INSTALAÇÕES HIDROALIMENTÁRIAS																										
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																										
12.10.1.1	C265	M	1,62	7,03	11,29	-	-	1,62	-	11,29	-	-	1,62	-	11,29	-	-	1,62	-	11,29	-	-	100,00%	11,29	11,29		
12.10.1.2	C266	M	15,80	9,51	150,26	-	-	15,80	-	150,26	-	-	15,80	-	150,26	-	-	15,80	-	150,26	-	-	100,00%	150,26	150,26		
12.10.1.3	C267	M	0,64	14,77	9,46	-	-	0,64	-	9,46	-	-	0,64	-	9,46	-	-	0,64	-	9,46	-	-	100,00%	9,46	9,46		
12.10.1.4	C268	M	0,66	21,98	14,51	-	-	0,66	-	14,51	-	-	0,66	-	14,51	-	-	0,66	-	14,51	-	-	100,00%	14,51	14,51		
12.10.1.5	9473	UN	1,00	26,50	26,50	-	-	1,00	-	26,50	-	-	1,00	-	26,50	-	-	1,00	-	26,50	-	-	100,00%	26,50	26,50		
12.10.1.6	9474	UN	1,00	35,57	35,57	-	-	1,00	-	35,57	-	-	1,00	-	35,57	-	-	1,00	-	35,57	-	-	100,00%	35,57	35,57		
12.10.1.7	C258	UN	2,00	71,96	143,92	-	-	2,00	-	143,92	-	-	2,00	-	143,92	-	-	2,00	-	143,92	-	-	100,00%	143,92	143,92		
12.10.1.8	10341	UN	1,00	26,09	26,09	-	-	1,00	-	26,09	-	-	1,00	-	26,09	-	-	1,00	-	26,09	-	-	100,00%	26,09	26,09		
12.10.1.9	10347	UN	1,00	6,65	6,65	-	-	1,00	-	6,65	-	-	1,00	-	6,65	-	-	1,00	-	6,65	-	-	100,00%	6,65	6,65		
12.10.1.10	8949	UN	1,00	10,20	10,20	-	-	1,00	-	10,20	-	-	1,00	-	10,20	-	-	1,00	-	10,20	-	-	100,00%	10,20	10,20		
12.10.1.11	8956	UN	1,00	8,31	8,31	-	-	1,00	-	8,31	-	-	1,00	-	8,31	-	-	1,00	-	8,31	-	-	100,00%	8,31	8,31		

[Handwritten signature]

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851700

Andrônio Eco. Biogenes de Oliveira

[Handwritten signature]

PROFESSOR: 10/03/2023
PROFESSOR: 10/03/2023
PROFESSOR: 10/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				MEDIÇÃO Nº 11										CONTRATO: 26.03.02/2023					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024										ADITIVO:					
				DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023										VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,83					
				LEGENDA:										VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 32.439,92					
				<ul style="list-style-type: none"> ◀ QUANT. C/ACRÉSCIMO ◀ QUANT. C/DECRÉSCIMO ◀ ITEM NOVO (el Prep. E=el) ◀ ITEM NOVO (adicionando) ◀ ITEM SUPRIMIDO (E=eluar) ◀ ITEM SEMALTERAÇÕES 										MEDIDA ACUMULADA: R\$ 1.090.376,69					
				<ul style="list-style-type: none"> ◀ QUANT. DEFINITIVO ◀ QUANT. REDUZIDO ◀ QUANT. ADICIONADO ◀ QUANT. C/BDI R\$ 										PERC. DE ADITIVO: R\$ 518.175,83					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.10.1.12	8932	XELOHO 90 GRALS. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB. RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	9,89	9,89					1,00	9,89			100,00%	1,00	9,89	9,89	9,89
11.10.1.13	89267	XELOHO 90 GRALS. PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB. RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	14,25	14,25					1,00	14,25			100,00%	1,00	14,25	14,25	34,25
11.10.1.14	3535	XELOHO PVC, SOLDAVEL, COM BLOCO DE LATAO, 90 GRALS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,39	9,39					1,00	9,39			100,00%	1,00	9,39	9,39	9,39
11.10.1.15	20147	XELOHO PVC, SOLDAVEL, COM BLOCO DE LATAO, 90 GRALS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,73	7,73					1,00	7,73			100,00%	1,00	7,73	7,73	17,73
11.10.1.16	89674	SE DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB. RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	21,68	21,68					1,00	21,68			100,00%	1,00	21,68	21,68	49,41
11.10.1.17	89440	SE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	12,69	12,69					1,00	12,69			100,00%	1,00	12,69	12,69	62,10
11.10.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 6.034,53		R\$ 0,00		R\$ 6.034,53		R\$ 6.034,53			100,00%		R\$ 6.034,53	R\$ 6.034,53	78,14
11.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	M	2,54	27,55	69,98					2,54	69,98			100,00%	2,54	69,98	69,98	139,12
11.10.2.2	89796	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	M	10,94	15,56	169,99					10,94	169,99			100,00%	10,94	169,99	170,23	340,35
11.10.2.3	89714	MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	7,64	44,13	337,15					7,64	337,15			100,00%	7,64	337,15	370,90	701,80
11.10.2.4	03986	CAIXA DE INSPEÇÃO 150X150X150CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	61,59	123,18					2,00	123,18			100,00%	2,00	123,18	123,18	246,36
11.10.2.5	03606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COMUM	ME	1,00	197,61	197,61					1,00	197,61			100,00%	1,00	197,61	197,61	394,57
11.10.2.6	89726	XELOHO 90 GRALS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	2,00	9,83	19,66					2,00	19,66			100,00%	2,00	19,66	19,66	394,57
11.10.2.7	89724	XELOHO 90 GRALS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	4,00	13,55	54,12					4,00	54,12			100,00%	4,00	54,12	54,12	394,57
11.10.2.8	89801	XELOHO 90 GRALS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO. AF. 06/2022	UN	6,00	12,94	77,64					6,00	77,64			100,00%	6,00	77,64	77,64	394,57

518.175,83
 32.439,92
 1.090.376,69
 518.175,83
 32.439,92
 1.090.376,69



RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700
 R. PROFIETADA 7 - LOTEAMENTO VOLTADO BOM FIM - JAGUARIBE - CE
 CONTATO: (85) 33988-7600, E-MAIL: RCPINHEIRO@GMAIL.COM
 WhatsApp: (85) 99651-1534

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira
 011 111 111 111

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ QUANT. ACRESCIM. ◀ QUANT. C/DECRESCIM. ◀ ITEM NOVO (p/Preço Est.) ◀ ITEM NOVO (p/Item Novo) ◀ ITEM SUPRIMIDO (E=Elim.) ◀ ITEM SUPRIMIDO (E=Elim.) ◀ ITEM SUPRIMIDO (E=Elim.) 													<p>CONTRATO: 20.03.02/2023</p> <p>ADITIVO:</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.915,67</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 60.641,85</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.608.557,52</p> <p>SALDO: R\$ 122.432,92</p> <p>PERC. DE ADITIVO: R\$ 518.175,83</p> <p>VALORES (R\$)</p>		
<p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: sábado, 5 de agosto de 2023</p>															
<p>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEAO DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>															
12.10.2.9	89744	10x40x30 GALHAS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, 1000MM DE COMPRIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	LN	1,00	35,84			1,00			1,00	100,00%		35,84	35,84
12.10.2.10	9659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	LN	2,00	23,09			2,00			2,00	100,00%		46,18	46,18
12.10.2.11	C1961	LULA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	LN	8,00	11,25			8,00			8,00	100,00%		90,00	90,00
12.10.2.12	C1798	LULA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	LN	4,00	23,65			4,00			4,00	100,00%		94,52	94,52
12.10.2.13	96825	TE. PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA BLÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PULMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU SANITÁRIO AF. 08/2022	LN	2,00	23,86			2,00			2,00	100,00%		47,72	47,72
12.10.2.14	89796	TE. PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA BLÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	LN	1,00	57,13			1,00			1,00	100,00%		57,13	57,13
12.10.2.15	C282	POSSA SÉPTICA E SANIDCÃO EM ALVENARIA	LN	1,00	5.226,27			1,00			1,00	100,00%		5.226,27	5.226,27
12.10.3 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.226,27	R\$ 5.226,27	100,00%	R\$ 5.226,27	R\$ 5.226,27		
12.10.3.1	10285	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 800 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	1,00	361,34			1,00			1,00	100,00%		361,34	361,34
12.10.3.2	0398	SACIA DE LOÇA BRANCA C/CAIXA ACRILADA DE 180X220	LN	2,00	940,50			2,00			2,00	100,00%		1.881,00	1.881,00
12.10.3.3	10049	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	2,00	56,89			2,00			2,00	100,00%		113,78	113,78
12.10.3.4	C1619	AVATÓRIO DE LOÇA BRANCA 3/4"X1/4"X1/4" E ACESSÓRIOS	LN	2,00	574,85			2,00			2,00	100,00%		1.149,70	1.149,70
12.11 SERVIÇOS FINAIS						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,74	R\$ 104,74	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4124	C1628	LIMPZA GERAL	M2	7,59	13,80			7,59			7,59	0,00%		104,74	104,74
13 DIVISÓRIOS						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.894,08	R\$ 11.894,08	40,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.447,94		
13.1	C1349	CONJUNTO PARA BUSTA COM TUBOS OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 MM TUBO DE ALUMINUM 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" - PINTURA EM PRIMEIRO CONJUNTO ESMALTE SINTÉTICO E REDES	C	1,00	4.447,94			1,00			1,00	100,00%		4.447,94	4.447,94
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"-H = 455" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO REDEFINIÇÃO COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E INTERNOS OFICIAIS	C	1,00	2.700,29			1,00			1,00	0,00%		2.700,29	2.700,29

RICARDO ZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851780

Antônio Eco. Biogênes de Oliveira

RICARDO ZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851780

PROFESSOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
PROFESSOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
PROFESSOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)				
			UNID.	QUANT.	P. UNID. C/BDI R\$	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			LEGENDA: ◀ QUANT. C/ ACRESCIMO ▶ QUANT. C/ DECRESCIMO ◀ ITEM NOVO (P/ Preço Estim.) ▶ ITEM NOVO (Adicionado) ◀ ITEM SUPRIMIDO (E-414/6) ▶ ITEM SEM ALTERAÇÕES			MEDIÇÃO Nº 11 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 28/06/2024 A 17/07/2024 DATA DE EMISSÃO: 5 de agosto de 2023			CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 12.145,92 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.090.379,69 SALDO: R\$ 518.175,83 PERC. DE ADITIVO: 0,75% VALORES (R\$)							
13	C1347	CONJUNTO PARA BASILETE COM TUBOS EM CONCRETO CANAL, MODELO OFICIAL, 10X14,00 CM, COM INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1" DE DIAM. E DE 1" ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA EM PÓ, TINTA VINÍLICA, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇADA, TIRE DE 2,30M	C	1,00	4.035,85						0,00	0,00	0,00%			
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 912,63								0,00%			
14.1	C247	IMPRESA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	619,64	1,46	912,63					619,64	0,00	6,16%		R\$ 912,63	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL				R\$ 384.363,77		VALOR ADICIONADO - VALOR REDUZIDO	R\$ 26.291,07		R\$ 410.654,84		VALOR MEDIÇÃO C/ BDI		VALOR ACUMULADO C/ BDI		ACUMULADO	96,41%
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM				R\$ 387.879,39		VALOR ADICIONADO - VALOR REDUZIDO	R\$ 18.236,59		R\$ 406.115,98		VALOR MEDIÇÃO C/ BDI		VALOR ACUMULADO C/ BDI		ACUMULADO	98,41%
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANQUÁ				R\$ 381.362,27		VALOR ADICIONADO - VALOR REDUZIDO	R\$ 16.114,19		R\$ 397.476,76		VALOR MEDIÇÃO C/ BDI		VALOR ACUMULADO C/ BDI		ACUMULADO	98,42%
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO				R\$ 394.306,94		VALOR ADICIONADO - VALOR REDUZIDO	R\$ -		R\$ 394.306,94		VALOR MEDIÇÃO C/ BDI		VALOR ACUMULADO C/ BDI		ACUMULADO	95,38%
				R\$ 1.547.912,67			R\$ 1.608.554,52		R\$ 1.608.554,52		R\$ 1.090.379,69		R\$ 1.090.379,69		ACUMULADO	67,79%
													TOTAL GERAL DO BOLETIM C/ BDI (26,85%) 14,8	R\$ 12.145,92	R\$ 1.079.234,77	R\$ 1.090.379,69
													PERC. GERAL DOS SERV. CONCLUÍDOS	0,75%	67,03%	67,79%


 CARANTE CORRADO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 06018517an


 RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 06018517an

Antônio Fco. Otiogenes de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 06018517an

CARANTE CORRADO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 06018517an

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTADO PARA...
 CONTATO (81) 5.9088-7606, E MAIL COM...

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 28/06/2024 A 17/07/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 11

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL

8.7. H1316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (M)

		QTD
QUANTIDADE DE JUNTAS = LARGURA * COMPRIMENTO/ ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS + COMPRIMENTO * LARGURA/ ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS	$(18 \cdot (30/1,5)) + (30 \cdot (16/1,5))$	640,00
		640,00

10.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		QTD
ÁREA DE PINTURA DA MURETA = PERÍMETRO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	$((30,2 \cdot 2) + (16,2 \cdot 2)) \cdot 0,5 \cdot 2$	92,80
		92,80

10.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

		QTD
DEMARCAÇÃO DA QUADRA = COMPRIMENTO DAS FAIXAS	$(28 \cdot 2) + (14 \cdot 3) + (18,3 \cdot 2) + (8,1 \cdot 4) + (19,16) + (15 \cdot 2) + (11 \cdot 3) + (5,5 \cdot 4)$	271,16
		271,16

11.3. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

		QTD
QUANTIDADE	4	4,00
		4,00

11.15. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

11.17. C4967 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG (UN)

		QTD
POSTE DA MURETA	1	1,00
		1,00

12.7.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

		QTD
CHAPIM = PERÍMETRO DAS PAREDES EXTERNAS * LARGURA	$(4,38 + 1,9 + 4,38 + 1,9) \cdot 0,2$	2,51
		2,51

12.9.1. 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD
PINTURA DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	$2,28 + 2,28 + 3,03$	7,59
		7,59

12.9.2. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD
PINTURA = ÁREA DE REBOCO	71,82	71,82
		71,82

12.9.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		QTD
PINTURA DAS PORTAS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES *	$0,7 \cdot 2,1 \cdot 2 \cdot 2$	5,88
		5,88

RECIBO DE RECEBIMENTO PAROISO
Secretaria de Educação e Cultura
P.O. BOX 111 - JAGUARIBE/CE
CPF: 14.1.47.803-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 11ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 05/08/24	FISCAL: YUKIO DIÓGENES BEZERRA		
Nº DO CONTRATO: 20.03.02/2023	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA		PRAZO AO CONTRATO:
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 27/10/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 31/07/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO 28/06/2024 A 17/07/2024	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL	98,41%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM	2,42%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ	75,58%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO	95,36%	<input type="checkbox"/> MAU	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	
		67,79%	

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 05 de agosto de 2024.

(Handwritten signature)
 Eng. Civil RICARDO BARROSO
 R. 19 - 19000000/CE
 P. 19000000/CE
 CPF: 043.047.805-49

(Handwritten signature)
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

(Handwritten signature)
RICARDO AZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

(Handwritten signature)
Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


F. PROJ. 2024.03.02/2023
Secretaria de Educação e Cultura
Ponto Central - Jaguaribe-CE
CPF: 72.220.4102-59


R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors early on. By conducting these checks frequently, the organization can prevent small mistakes from escalating into larger financial issues.

In conclusion, the document stresses that a robust record-keeping system is the foundation of sound financial management. It provides a clear path for tracking income and expenses, which is crucial for making informed business decisions.



The final section of the document provides a summary of the key points discussed. It reiterates the need for consistency and accuracy in all financial reporting. The document ends with a note of appreciation for the reader's attention and a signature line.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.

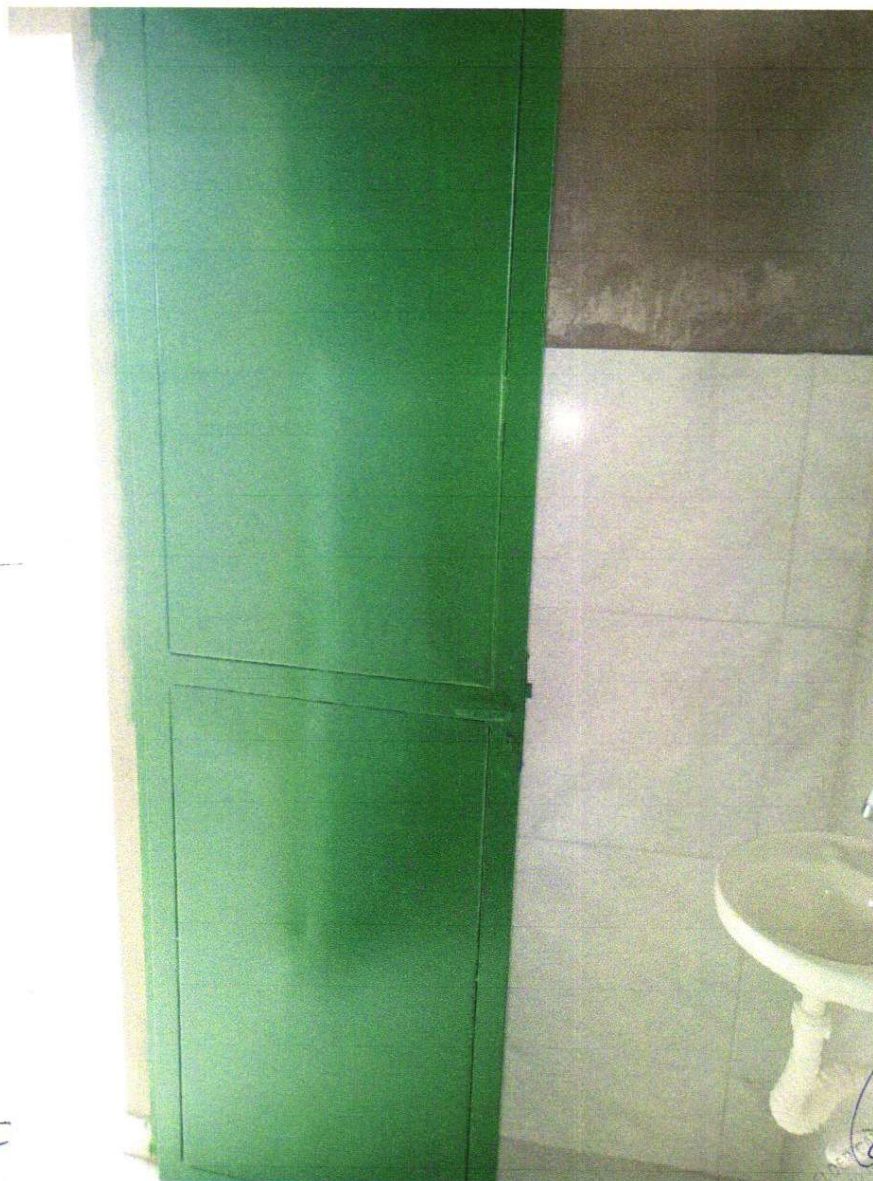

Eng.º Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
C.R.E.A. - CE: 02.34.988
INF. Nº 18517904


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Realiza Construtora Ltda
Rua ... nº ...
Jaguaribe - CE

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



11/06/2024 10:00:00
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
TEL: (88) 3415522
TEL: (88) 3415844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


11/06/2024 10:00:00
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
TEL: (88) 3415522
TEL: (88) 3415844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.





Antônio Fc. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


2024/07/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



ANTÔNIO F. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Nº 0601851790


Antônio F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LIZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


RICARDO LIZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO EZZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


ANTÔNIO FCO. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.

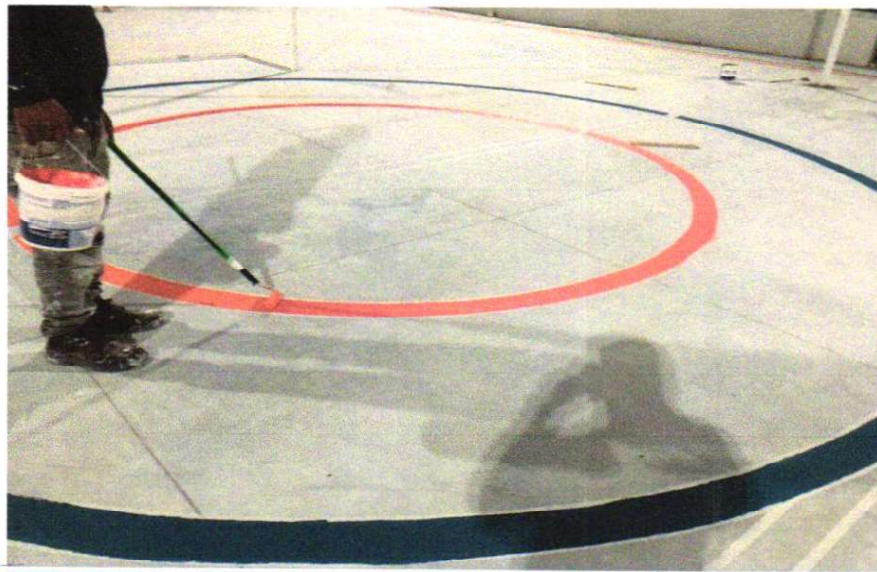

Proj. Civil: 01/04/2023
Tel: 18713944



Antônio Fc. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Proj. Civil: 01/04/2023
Tel: 18713944

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



RECIBO DE RECEBIMENTO
Data: 06/07/2024
N.º: 18519940


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RECIBO DE RECEBIMENTO
Data: 06/07/2024
N.º: 18519940

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



CPF: 914.201.213-91
CPF: 02.341.929
CPF: 061.501.9844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



Eng. Civil
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTAL DO MUNICÍPIO
CPF: 06.000.000/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



ANTÔNIO FCO. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

ANTÔNIO FCO. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
CPF: 0601851790

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.

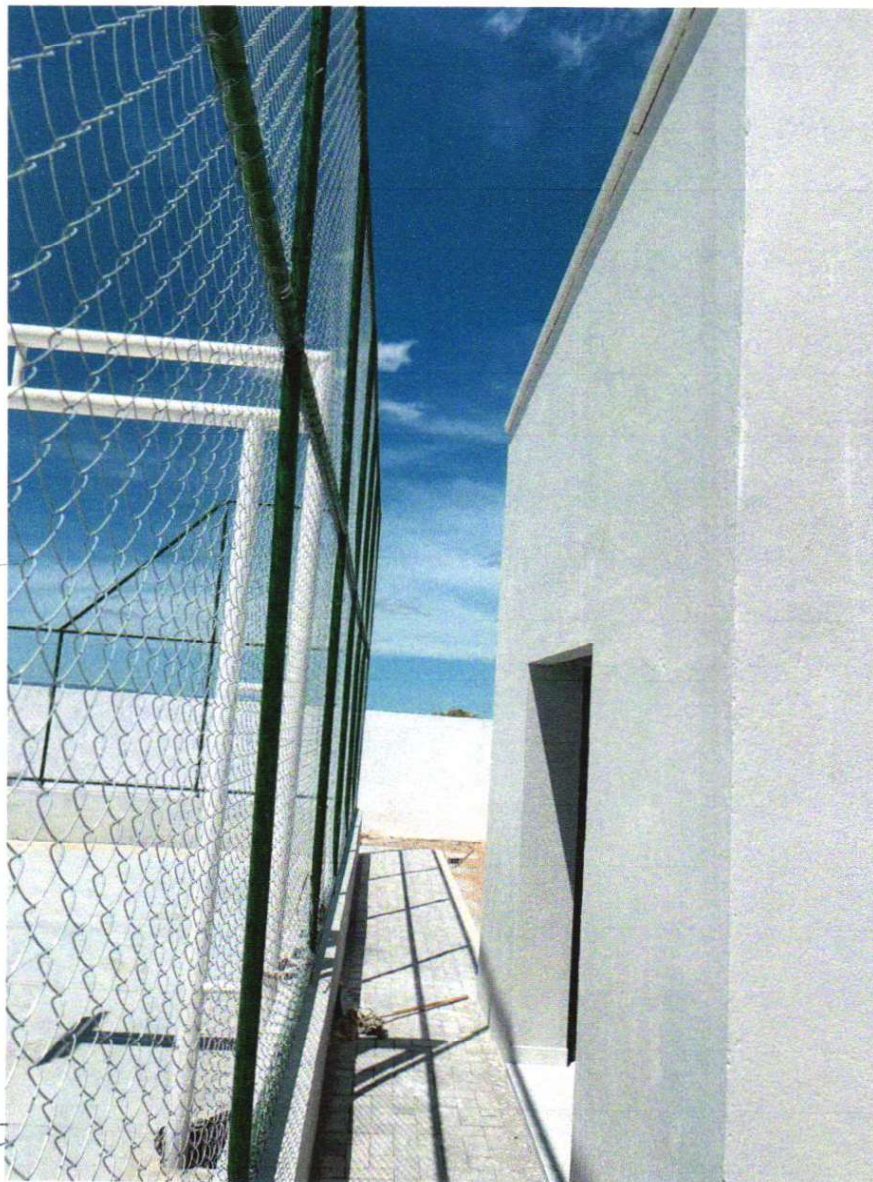

RECIBO DE RECEBIMENTO
Nº 02/2024
Data: 17/07/2024


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RECIBO DE RECEBIMENTO
Nº 02/2024
Data: 17/07/2024

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.

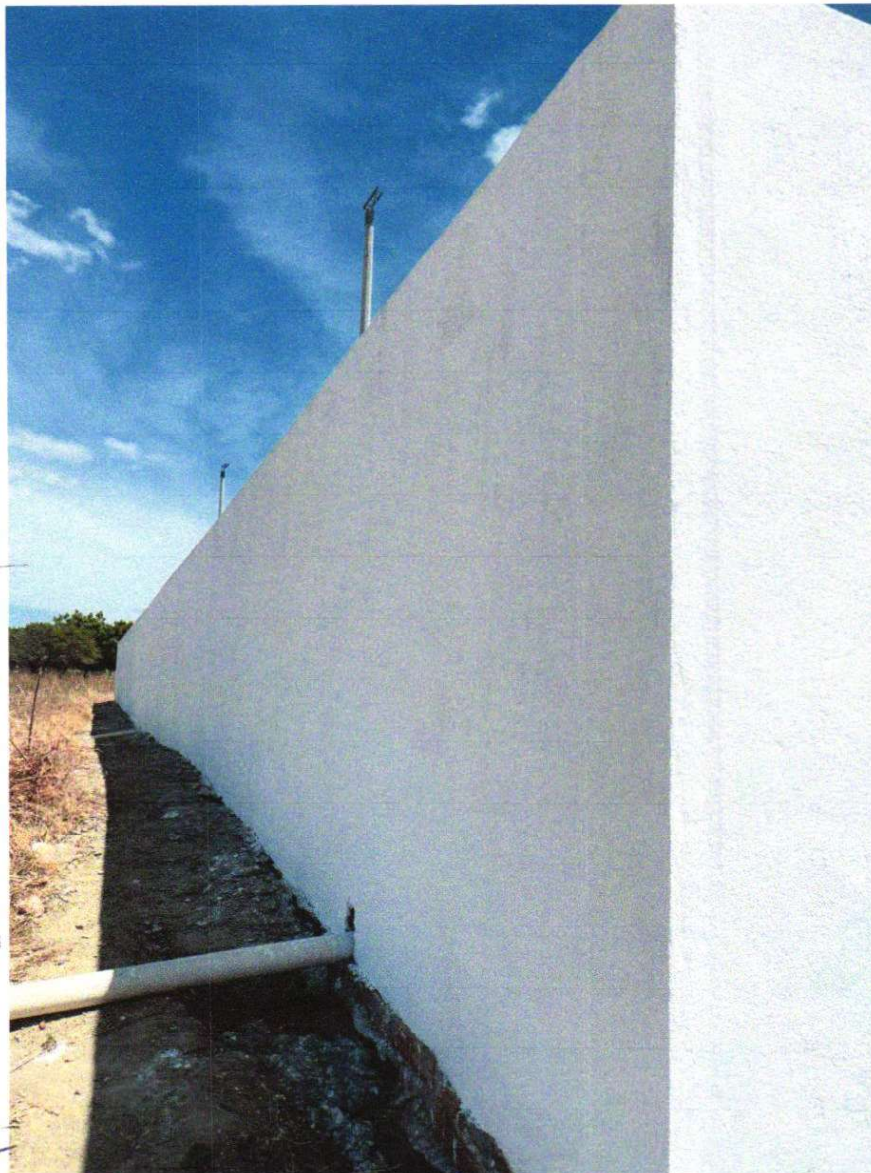

Eng. Civil nº 02.941.922
Insc. nº 16515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Eng. Civil nº 02.941.922
Insc. nº 16515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



REALIZA CONSTRUTORA LTDA
RUA JOÃO VILHANOVA, 490 - JAGUARIBE-CE
TEL: (88) 9998-7606


Antônio Fca. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


S. M. SILVA
C. M. SILVA
P. M. SILVA
R. M. SILVA

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.

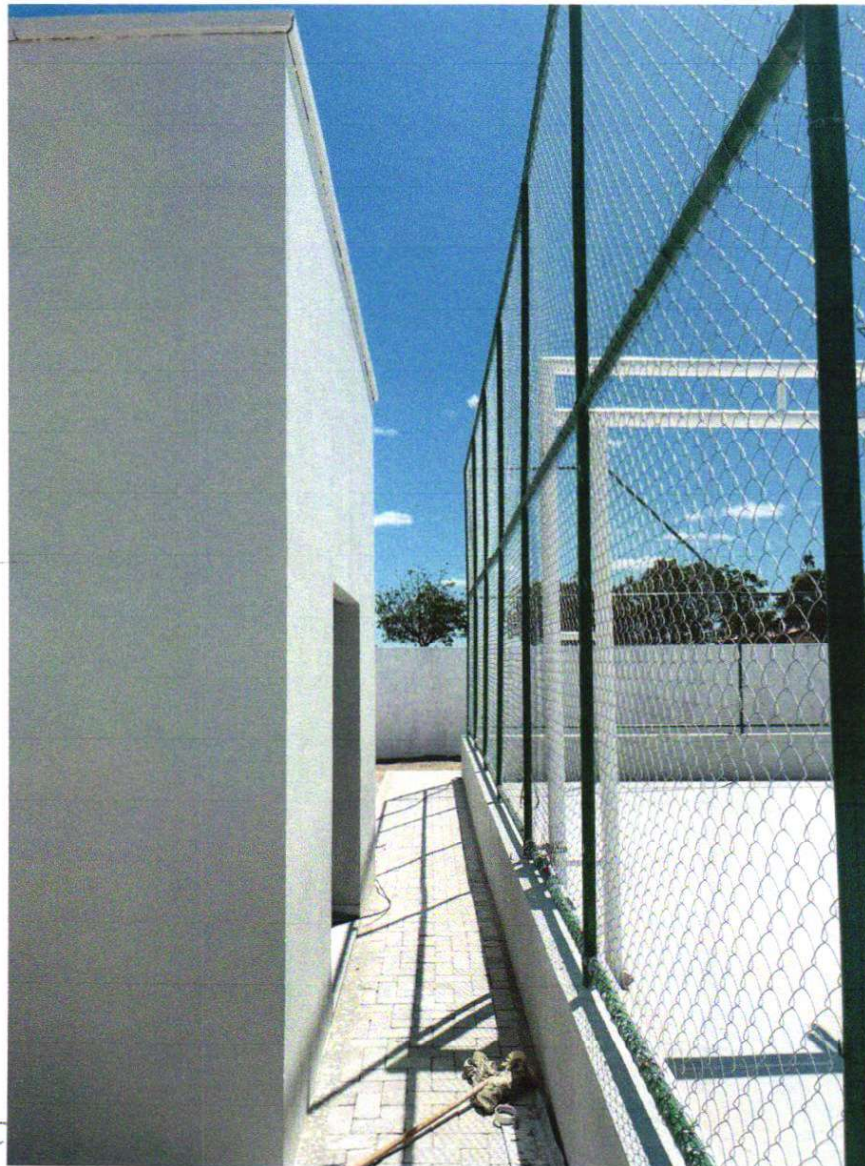

ANTÔNIO F. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
TÍT. 158315944



Antônio F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
CPF: 914.201.213-91
TÍT. 158315944

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



Av. 08 - JAGUARIBE - 56600-000
R. 01 - JAGUARIBE - 56600-000
CEL: (33) 3315-8888
WH: (33) 9915-8888


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


R. 01 - JAGUARIBE - 56600-000
CEL: (33) 3315-8888
WH: (33) 9915-8888

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



REALIZA CONSTRUTORA LTDA
RUA JOÃO VIÇOSO, 190 - JARDIM
CENTRAL - JAGUARIBE - CE 041.900
FONE: (88) 9.9908-7606

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
RUA JOÃO VIÇOSO, 190 - JARDIM
CENTRAL - JAGUARIBE - CE 041.900
FONE: (88) 9.9908-7606

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



CPF: 914.201.213-91
02 34 824
18519344



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

CPF: 914.201.213-91
02 34 824
18519344

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



Telefone: (88) 9908-7606
E-mail: contato@realiza.com.br
CNPJ: 16.511.984/0001-01


Antônio Fcê. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


REALIZA CONSTRUTORA LTDA
R. PROJ. 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CNPJ: 16.511.984/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




ANTÔNIO F. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


Antônio F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZZER P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

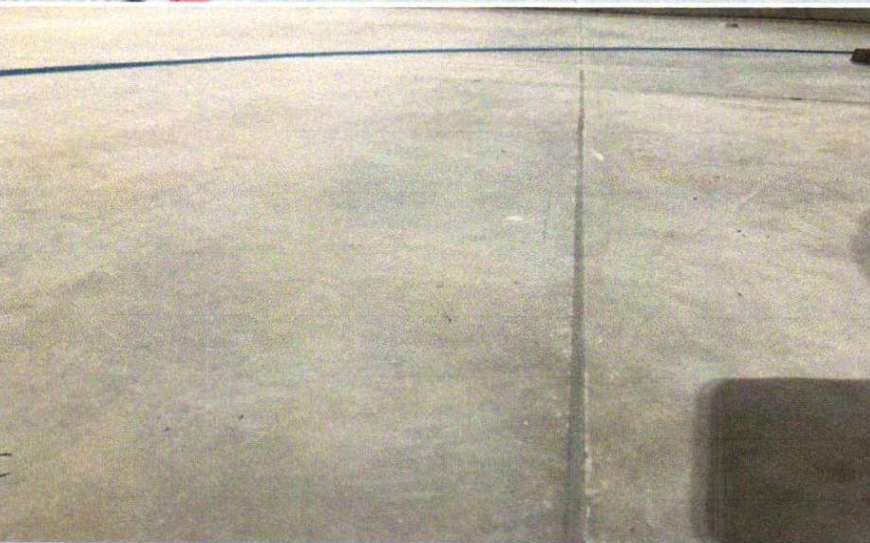


ANTÔNIO F. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 11ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 28/06/2024 – 17/07/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE CHAPIM
- EXECUÇÃO DE PINTURA LÁTEX
- EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO
- EXECUÇÃO DE PINTURA ESQUADRIAS DE FERRO
- APLICAÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO EM PU
- INSTALAÇÃO DE POSTE COM PADRÃO DE ENTRADA
- INSTALAÇÃO DOS KITS DOS BANHEIROS (BACIA SANITÁRIA, PIA, ASSENTO)

ANTONIO FCA. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


ANTONIO FCA. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO EZZAR P. PINHEIRO
CPF: 0601851790
Engenheiro Civil


RICARDO EZZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



TED

G3320716320357411
07/08/2024 16:36:49

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	260	NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1	
Conta corrente (com DV)	639262589	
Conta Pagamento	0000	
CNPJ	35.851.118/0001-08	
Nome favorecido	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Valor	11.779,60	
Data transferência	07/08/2024	

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **345953286**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.851.118/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Certidão nº: 54128740/2024

Expedição: 07/08/2024, às 10:28:57

Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.851.118/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Roberto
07/08/24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **35.851.118/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:29:51 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **DC78.6BF8.42A8.DB21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and date:
07/08/2024



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Código de Controle: DC78.6BF8.42A8.DB21

Data da Emissão: 04/06/2024

Hora da Emissão: 08:29:51

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/06/2024, com validade até 01/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202409975350

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061249394
CNPJ / CPF: 35851118000108
RAZÃO SOCIAL: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/08/2024 ÀS 10:25:14
VÁLIDA ATÉ 06/10/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Roberto
07/08/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202409975350

- CPF (pessoas físicas)
 CNPJ (pessoas jurídicas)
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
35851118000108

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202409975350	35851118000108	07/08/2024	10:25:14

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 000000261

Razão Social

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000859379

C.N.P.J.: 35851118000108

Bairro

JOAO PAULO II

CEP

63475000

Localizado R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 SALA 1

Documento

C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

000000261/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 04 DE JUNHO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 01/09/2024

COD. VALIDAÇÃO 000000261



Liberta
07/08/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000261

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/09/24
JAGUARIBE-CE, 04 DE JUNHO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 07/08/24 às 10:27:41

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.851.118/0001-08
Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2024 a 23/08/2024

Certificação Número: 2024072509505436235810

Informação obtida em 07/08/2024 10:30:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Roberto
07/08/24



REALIZA

CONSTRUTORA LTDA

REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE** – CNPJ: **07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 12.143,92 (DOZE MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**, REFERENTE REF. A 11º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

NFSe.0022	VALOR (R\$)
Valor Bruto	12.143,92
ISS Retido	364,32
VALOR LÍQUIDO	11.779,60

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: NUBANK

AG: 0001

CONTA: 63926258-9

CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, _____ de Agosto de 2024.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:3585111
8000108

Assinado de forma
digital por REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Dados: 2024.08.07
11:43:00 -03'00'



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.02/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
Contratado		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Endereço		
RUA PROJETADA 2 – LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
35.851.118/0001-08		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.10.27 16:32:01
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)



Jaguaribe - CE, 27 de outubro de 2023.

À

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

END: Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/Ce.

CNPJ sob o nº: 35.851.118/0001-08

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato **20.03.02/2023**, decorrente do **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 20.03.02/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura

CIENTE EM: 27 / 10 / 2023

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91



CONTRATO Nº 20.03.02/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, COM A EMPRESA REALIZA
CONSTRUTORA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, de acordo com o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº **20.03.02/2023**, Processo nº **20.03.02/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 1.547.912,67 (Hum milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **31 de janeiro de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;
- 5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

- 6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

- 7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária FUNDEB – 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 44.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 27 de outubro de 2023.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CONTRATANTE**

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
**REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)**

TESTEMUNHAS:

01. Mateus Diniz
NOME:

CPF/MF: 06 292345319

02. Joselyne Lemos Nequeira de Lima
NOME:

CPF/MF 04491368333



**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Julho de 2024 até o dia 31 de Outubro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Julho de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01

CPF: 06292345399

02

CPF: 044913683331



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.97166/78	Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Data do cadastramento 09/11/2023 17:28		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231308320	RRT	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 27/10/2023	CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 27/10/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000	
Bairro ZONA RURAL	Logradouro SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO			Número SN

Responsável

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ 35.851.118/0001-08	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 27/10/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	0,01 m ²	0,01 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 0,01 m ²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

594

DATA APROVAÇÃO

27/10/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO

SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN

COORDENADAS

LONGITUDE:
LATITUDE:

BAIRRO

ZONA RURAL

NATUREZA DA OBRA

CONSTRUÇÃO

USO

INSTITUCIONAL

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR

CREA/CAU

00A1062301

ART

RRT 12883184

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

CREA/CAU

RNP 0601851790

ART

CE 20231308320

CPF:

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
594	616,64 m ²	616,64 m ²	0,00 %	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL
					0000000000

VALOR DA OBRA

1.547.912,67

DATA DO INÍCIO DA OBRA

06/11/2023

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBRA

30/04/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 04 DE Março DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361W3070000594



Scanei para validar este documento


Rafael Gomes Diógenes
Secretário de Inf. Transportes e Urbanismo
PORTARIA 275/2023 (PP 601.211.063-00)

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**

Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASILÉIA**

UF: **AC**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/03/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: SEXTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

Documento assinado digitalmente
gov.br YUKIO DIOGENES BEZERRA
 Data: 15/03/2024 17:24:03-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 15/03/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy
 Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: . ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





REALIZA

CONSTRUTORA LTDA

REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 35.851.118/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 07 de Agosto de 2024.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Dados: 2024.08.07 10:48:28
-03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA
Sócio – Administrador
CPF: 914.201.213-91

Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 1

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2024

Emissão: 01/08/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<u>DIOGO RIBEIRO DE BARROS</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<u>Francisco Barros Junior</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<u>Francisco Willian dos Santos</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<u>Jose Leandro Tome Barros</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		5.901,62	
		310 INSS			446,42
				5.901,62	446,42
			FGTS: 472,12	Líquido a receber:	5.455,20
			BC-INSS: 5.901,62	BC-FGTS: 5.901,62	

Fim

Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08
 Mês/Ano: 07/2024
 Emissão: 01/08/2024

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
		FGTS: 112,96	Líquido a receber:		1.306,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR				
Cargo: Pedreiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		117,31
				1.538,81	117,31
		FGTS: 123,10	Líquido a receber:		1.421,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
		FGTS: 112,96	Líquido a receber:		1.306,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS				
Cargo: Pedreiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		117,31
				1.538,81	117,31
		FGTS: 123,10	Líquido a receber:		1.421,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		5.901,62	
		310 INSS			446,42
				5.901,62	446,42
		FGTS: 472,12	Líquido a receber:		5.455,20
		BC-INSS: 5.901,62	BC-FGTS: 5.901,62		

CPF/CNPJ do Empregador 35.851.118	Nome/Razão Social do Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA	Pagar este documento até 09/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080722247563-0	Tag 07/08/2024 12:03
Observações	Valor a recolher 498,03	

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	4	448,51	0,00	0,00	49,52	498,03
Total Geral:		448,51	0,00	0,00	49,52	498,03

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 12:03:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 35.851.118/0001-08	Razão Social REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24220.2185098-1	Pagar este documento até 09/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245069329			Valor Total do Documento 2.121,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	444,51	27,87	4,44	476,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.426,22	89,42	14,26	1.529,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:00.016.97166/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	106,96	6,70	1,06	114,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:00.016.97166/78				
Totais		1.977,69	123,99	19,76	2.121,44

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/08/2024 12:00:49

85890000021 2 21440385242 3 22071624220 3 21850981741 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2	21440385242 3	22071624220 3	21850981741 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 35.851.118/0001-08
Número: 07.16.24220.2185098-1
Pagar até: 09/08/2024
Valor: 2.121,44

Pague com o PIX



MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	35.851.118/0001-08
Nome	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27160385033 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 446,42	R\$ 446,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.268,84	R\$ 1.268,84
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.715,26	R\$ 1.715,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	914.201.213-91
Telefone	9720-3435

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/08/2024 15:02:51
Nº do recibo de entrega	0000050000251734271

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000251734271
Data/Hora da Transmissão	01/08/2024 15:02:51	Identificação da Apuração de Débitos	27160385033 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	490
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	JOAO PAULO II
Município	JAGUARIBE	UF	CE
CEP	63475000	Telefone	8899087606
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	97203435		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	88,52		
Saldo a Pagar	88,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.180,32		
Saldo a Pagar	1.180,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	446,42		
Saldo a Pagar	446,42		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000251734271
Data/Hora da Transmissão	01/08/2024 15:02:51	Identificação da Apuração de Débitos	27160385033 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	446,42	0,00	446,42

Obra: 90.016.97166/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.180,32	0,00	1.180,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	88,52	0,00	88,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/08/2024 Número da Guia: 0124080722247563-0 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 07/08/2024 12:03:45 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.97166/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,13	0,05	11,30	125,44
06/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	19/07/2024	Mensal	1.538,81	123,10	1,23	0,05	12,31	136,69
06/2024		FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	19/07/2024	Mensal	1.270,80	101,66	1,01	0,04	10,17	112,88
06/2024		JOSE LEANDRO TOME BARROS	02206816350101040620240101	022.068.163-50	101	19/07/2024	Mensal	1.384,93	110,79	1,10	0,05	11,08	123,02
Total do Tomador									448,51	4,47	0,19	44,86	488,03
Total do Estabelecimento									448,51	4,47	0,19	44,86	488,03
Total da Guia									448,51	4,47	0,19	44,86	488,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722247563-0 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 07/08/2024 12:03:45 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03
	Total da Guia		5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público estatutário em cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercência de mandato eletivo
- 304 - Servidor público estatutário de mandato eletivo, inclusive em exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou órgão de fato, em exercício de cargo em comissão, governo, órgão ou entidade de administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Conservo
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Profissional autônomo
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam remuneração
- 751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam remuneração
- 751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam remuneração
- 751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam remuneração
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de curso público, sem vínculo de empregatistário
- 906 - Atleta não profissional em formação em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722247563-0 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 07/08/2024 12:03:45 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FOTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	90.016.97166/78	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03
	Total da Guia		5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722247563-0 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 07/08/2024 12:03:45 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.97166/78	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024			11 - FGTS mensal	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03
				Total da Guia	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722247563-0 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 07/08/2024 12:03:45 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		06/2024	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03
			Total da Guia	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,19	44,86	498,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080121053108-5 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 01/08/2024 15:08:58 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuratório	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	20/08/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
07/2024		FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JOSE LEANDRO TOMÉ BARRIOS	02206816350101040620240101	022.068.163-50	101	20/08/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
Total do Tomador								5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
Total do Estabelecimento								5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
Total da Guia								5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080121053108-5 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 01/08/2024 15:08:58 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
		Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.180/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
- 106 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Indeterminista
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Indeterminista
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Indeterminista
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho Indeterminista
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Amarelo, Juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/serviço em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo estabelecimento
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador adon�o de carga
- 703 - Contribuinte individual - Transportador adon�o de carga
- 704 - Contribuinte individual - Diretor n o empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor n o empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Cooperado que presta servi os por interm dio de cooperativa de trabalho
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta servi os por interm dio de cooperativa de trabalho
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produ o
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produ o
- 710 - Contribuinte individual - Magistrado assistente tempor rio da Justi a do Trabalho ou da Justi a Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenci rio
- 711 - Contribuinte individual - Associado eleito para dire o de cooperativa, associa o ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o s ndico ou administrador eleito para exercer atividade de dire o condominial, desde que recebam remunera o
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congrega o ou de ordem religiosa
- 802 - M dico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.669/1994
- 804 - Participante de curso de forma o, como etapa de concurso p blico, sem v nculo de empregado estatut rio
- 805 - Al ta n o profissional em forma o que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080121053108-5 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 01/08/2024 15:08:58 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	90.016.97166/78	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
Total da Guia			5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080121053108-5 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 01/08/2024 15:08:58 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Com. Apuração	Estabelecimento:	90.016.97166/78	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
			Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080121053108-5 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 01/08/2024 15:08:58 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		07/2024	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
			Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yvone Lopes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP - 0618515844

jun/24

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
28/06/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
243	-153	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE POSTE P/ QUADRO DE MEDIÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Ricardo César P. Pinheiro
Eng. Civil - CREA-CE 341929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
29/06/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
244	-154	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil RCP - CE 341929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
30/06/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
245	-155					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



Eng. Civil
RNP 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

jul/24


Yvone Lopes Bezerra
Eng. Civil R. 0001 - CE 341829
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/07/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
246	-156	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yvone Tereza Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP 0618515344

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
02/07/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
247	-157					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE CHAPIM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Ricardo Cezar P. Pinheiro
Eng. Civil - CREA-CE 341929
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
03/07/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
248	-158					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Vivian Rodrigues Bezerra
Eng. Civil - CREA-CE 341929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
04/07/2024	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
249	-159					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
05/07/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
250	-160	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
06/07/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
251	-161					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil - CREA-CE 341929
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/07/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
252	-162				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNF - 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/07/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
253	-163				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yair Lopes Bezerra
Eng. Civil - CREA-CE 341929
RNF: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
09/07/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
254	-164					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Viviane Lopes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
10/07/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
255	-165					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil - CREA-CE 341929
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
11/07/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
256	-166	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil - CREA-CE 341929
RNP 0618515344

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
12/07/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
257	-167				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil CREA - CE 341929
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/07/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
258	-168	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil RCP - CE 341929
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
14/07/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
259	-169					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yvair Lopes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNF - 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/07/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
260	-170					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA PISO QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil 0601851790 - CE 341929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
16/07/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
261	-171					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA PISO QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yáskio Lopes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 17/07/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 262	DIAS RESTANTES: -172	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA PISO QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Civil - CE 341829
RNP 0618515844

STATE OF TEXAS
COUNTY OF []

BEFORE ME, the undersigned authority, on this _____ day of _____, 20____, personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

Given under my hand and seal of office this _____ day of _____, 20____.

NOTARY PUBLIC

NAME	ADDRESS	CITY	COUNTY	STATE

My commission expires on _____, 20____.

NOTARY PUBLIC

STATE OF TEXAS

COUNTY OF []

NOTARY PUBLIC

STATE OF TEXAS

COUNTY OF []

NOTARY PUBLIC
