

ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício:2020

Credor: MATOS ALMEIDA LTDA.

Documento Caixa: 30110219

Empenho: 25110008


Valor: 31911,88

Código Orgão: 06

Código Unidade Orç: 01

Ged SESCOINTI

Emissão em 21/03/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE




TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO


O Secretário da Cidade e Infraestrutura do município de Jaguaribe, o Sr. Geraldo Targino da Silva, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, vem, **HOMOLOGAR e ADJUDICAR** o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade **Tomada de Preços nº 08.07.01/2020**, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.

Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO e ADJUDICADO** em favor da Empresa: **MATOS & ALMEIDA LTDA – ME** pelo valor global de **R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)**.

Ao setor competente para providências cabíveis.

Jaguaribe–CE, 09 de setembro de 2020.


Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



CONTRATO Nº 08.07.01/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA – ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à na Pç Senador Fernandes Távora, SN, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, representada por seu Secretário o Sr. Geraldo Targino da Silva, infrafirmado, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA – ME**, com endereço à Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador(a) do CPF nº 027.052.643-96, ao fim assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o edital de **Tomada de Preços nº 08.07.01/2020**, Processo nº 08.07.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços nº 08.07.01/2020, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, **até 150 (cento e cinquenta) dias**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLAÚSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC – Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS


7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0601.15.813.0025.1.026, elemento de despesa nº 44.90.51.00, oriundos da Secretaria Estadual das Cidades.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;


11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;


11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, e encaminhados à Comissão de Licitação.


CLAÚSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.


Jaguaribe-CE, 09 de setembro de 2020.



Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 
Nome: _____
CPF/MF: 09.790.313-47

02. 
Nome: _____
CPF/MF: 148.694.348-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE


ORDEM DE SERVIÇO



Nº da Ordem de Serviço 08.07.01/2020	Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
Nº da Licitação 08.07.01/2020	Data do Contrato 09 de setembro de 2020
Contratado(a) MATOS & ALMEIDA LTDA – ME	
Endereço Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE.	
Nº do CNPJ / CPF. 01.816.139/0001-70	Nº do Telefone/E-mail (88) 3522-3044 / 99827-2375 matosealmeida@outlook.com
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTESSE PROCESSO.	
Valor Global R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 150 (cento e cinquenta) dias

Jaguaribe-CE, 09 de setembro de 2020.


Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA – ME
CONTRATADA

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo sefioutubro2020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/10/2020 às 05:56:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8B63097003E8C08.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	10/2020
NRA:	BSyGHk7X3M100000
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/10/2020
HORA: 05:54:23
PÁG: 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 10/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900045396873	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	1.078,38
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	156,74
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	921,64

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/10/2020
 HORA: 05:54:23
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 N° ARQUIVO: BSYGHK7X3M10000-0
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 620 744 779
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-35221138
 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 111201
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL 4120400

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	156,74	0,00	0,00	0,00	156,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	156,74	0,00	0,00	0,00	156,74
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000014 672001802017 107646180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 N° ARQUIVO: BSYGHK7X3MI0000-0
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 N° CONTROLE: MZ1nDBjyxfb0000-5
 FPAS: 515
 OUTRAS ENTID: MATOS E ALMEIDA LTDA
 SIMPLES: 2
 ALIQ RAT: 0,0
 FAP: 0,50
 RAT AJUSTADO: 0,00
 COD REC: 150
 COMP: 10/2020
 TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 N° CONTROLE: KSBsmISeeoP0000-5
 LOGRADOURO BAIRO
 CIDADE CEP
 RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342
 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000
 UF CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 167,20
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 156,74
 VAL DEVIDO PREV SOC 156,74
 TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%
 REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 167,20
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000014 62001802017 107646180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: BSYGHK7X3M10000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020
N° CONTROLE: MZ1nDBJYxPb0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 156,74
VAL DEVIDO PREV SOC 156,74

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 167,20
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL A RECOLHER 167,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/10/2020
HORA: 05:54:23
PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000014 672001802017 107646180995 000453968732

EMPRESAMATOS E ALMEIDA LTDA INSCRICAO: 900045396873
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRAMATOS E ALMEIDA LTDA INSCRICAO: 900045396873

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
DAMIAO SARAFIM NOGUEIRA	1.045,00	0,00	160.72380 79-0 0,00	01/09/2020 78,37	01	83,60	07170	0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	1.045,00	0,00	137.20925 45-4 0,00	01/09/2020 78,37	01	83,60	07170	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.090,00 0,00 0,00 156,74 167,20 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/10/2020
HORA: 05:54:23
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000014 672001802017 107646180995 000453968732

EMPRESA MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP 10/2020 COD REC: 150
TOMADOR/OBRA MATOS E ALMEIDA LTDA

Nº DE CONTROLE:
OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT 0,0
Nº DE CONTROLE: KSbSmlSseeoP0000-5

Nº ARQUIVO: BSyGHk7X3M10000-0
INSCRIÇÃO: 900045396873
INSCRIÇÃO: 900045396873

LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMAR BARREIRA
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
TOTAIS	2	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/10/2020
HORA: 05:54:23
PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESMATOS E ALMEIDA LTDA Nº DE CONTROLE No DE CONTROLE Nº ARQUIVO: BSyGHk7X3M10000-0
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES 2 RAT 0,0 INSCRICAO: 900045396873
TOMADOR/OBRAMATOS E ALMEIDA LTDA Nº DE CONTROLE: KSbSmiSeeoP0000-5 INSCRICAO: 900045396873

LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	156,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	156,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	156,74	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	921,64
VALOR INFORMADO	1.078,38				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41 0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/10/2020
HORA: 05:54:23
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000014 672001802017 107646180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA Nº DE CONTROLE: MZ1nDBjYx Fb0000-5 Nº ARQUIVO: BSyGHk7X3M10000-0
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
TOTAIS:	2	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/10/2020
HORA: 05:54:23
PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000014 672001802017 107646180995 000453968732

EMPRESA MATOS E ALMEIDA LTDA

Nº DE CONTROLE: MZ1nDBjYxYFb0000-5

Nº ARQUIVO: BSYGHk7X3M10000-0

INSCRIÇÃO: 900045396873

COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342

BAIRRO: EDMAR BARREIRA

CNAE PREPONDERANTE: 0111201

CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475-000

CNAE: 4120400

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

2.090,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

167,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

167,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41 0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 23/10/2020
HORA: 05:54:23
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA Nº DE CONTROLE: MZ1nDBjYxFb0000-5 Nº ARQUIVO: BSYGHk7X3M10000-0
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	156,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	156,74
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	1.078,38	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	156,74	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	921,64

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA ME RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CE CEP 6347500		PERÍODO out/20		SEÇÃO Único	
		Pessoal Jaguaribe Ceará		DEPTO.		SEÇÃO	
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS		DEDUÇÕES INSS	SALÁRIO À RECEBER	CPF	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	S. FAMÍLIA				
1	DAMIAO SARAFIM NOGUEIRA	R\$ 1.045,00		R\$ 76,35	R\$ 921,65	161841593-81	<i>Damiao Sarafim Nogueira</i>
2	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	R\$ 1.045,00		R\$ 79,94	R\$ 965,06	023568983-12	<i>Francisco J. dos Santos</i>
3							
TOTAL SALÁRIOS:		R\$ 2.090,00	R\$ -	R\$ 159,89	R\$ 1.930,12		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2020 - 05:54:23

UNIDADE ATENDIMENTO - AG. JAGUARIBE
DATA: 23/10/2020 HORA: 08:49:02
TERMINAL: 07491012 CONTROLE: 074910120111

AGÊNCIA : 0749
UNIDADE : 003.00001753-9
CLIENTE: JDW CONSTRUCOES EMPR LOC E EVENT

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CEI : 90004539687-3

INVENIO : 0180
DATA DE VALIDADE : 07/11/20
COMPETENCIA : 10/2020

VALOR TOTAL : 167,20

Representação Numérica do Código de Barras


858700000014 672001802017
107646180995 000453968732

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

05-REMUNERAÇÃO		06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
2.090,00		2	8
10-INSCRIÇÃO/TIPO (9)		11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
900045396873		10/2020	07/11/2020
14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER	
167,20		0,00 167,20	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

07646180995 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2020 - 05:54:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
MATOS E ALMEIDA LTDA			(0088)35221138	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	2.090,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018090-2	900045396873	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167,20		0,00	167,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858700000014 672001802017 107646180995 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo sefipnovembro2020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2020 às 11:25:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8DFF7A15473CE08.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS.17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	11/2020
NRA:	AfzIn74Hhj00007
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS41.0 (01/03/2020)

DATA: 25/11/2020
HORA: 12:22:41
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 11/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900045396873	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 3.568,14

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 156,74

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 3.411,40

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFAAS EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: Afnzln74Hh30000-7
 COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FFAAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: NK7dq0119h20000-0 INSCRIÇÃO: 900045396873
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNABE PREPONDERANTE: 111201
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 CNABE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000018 672001802017 207647180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 N° ARQUIVO: Afnzin74HhJ0000-7
 FPAS: 515 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2020
 N° CONTROLE: NK7dq0It9n20000-0
 TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° CONTROLE: KHNwp1DNF130000-3
 LOGRADOURO BAIRO CEP JAGUARIBE
 RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA 63475000

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 DEPOSITO 167,20
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

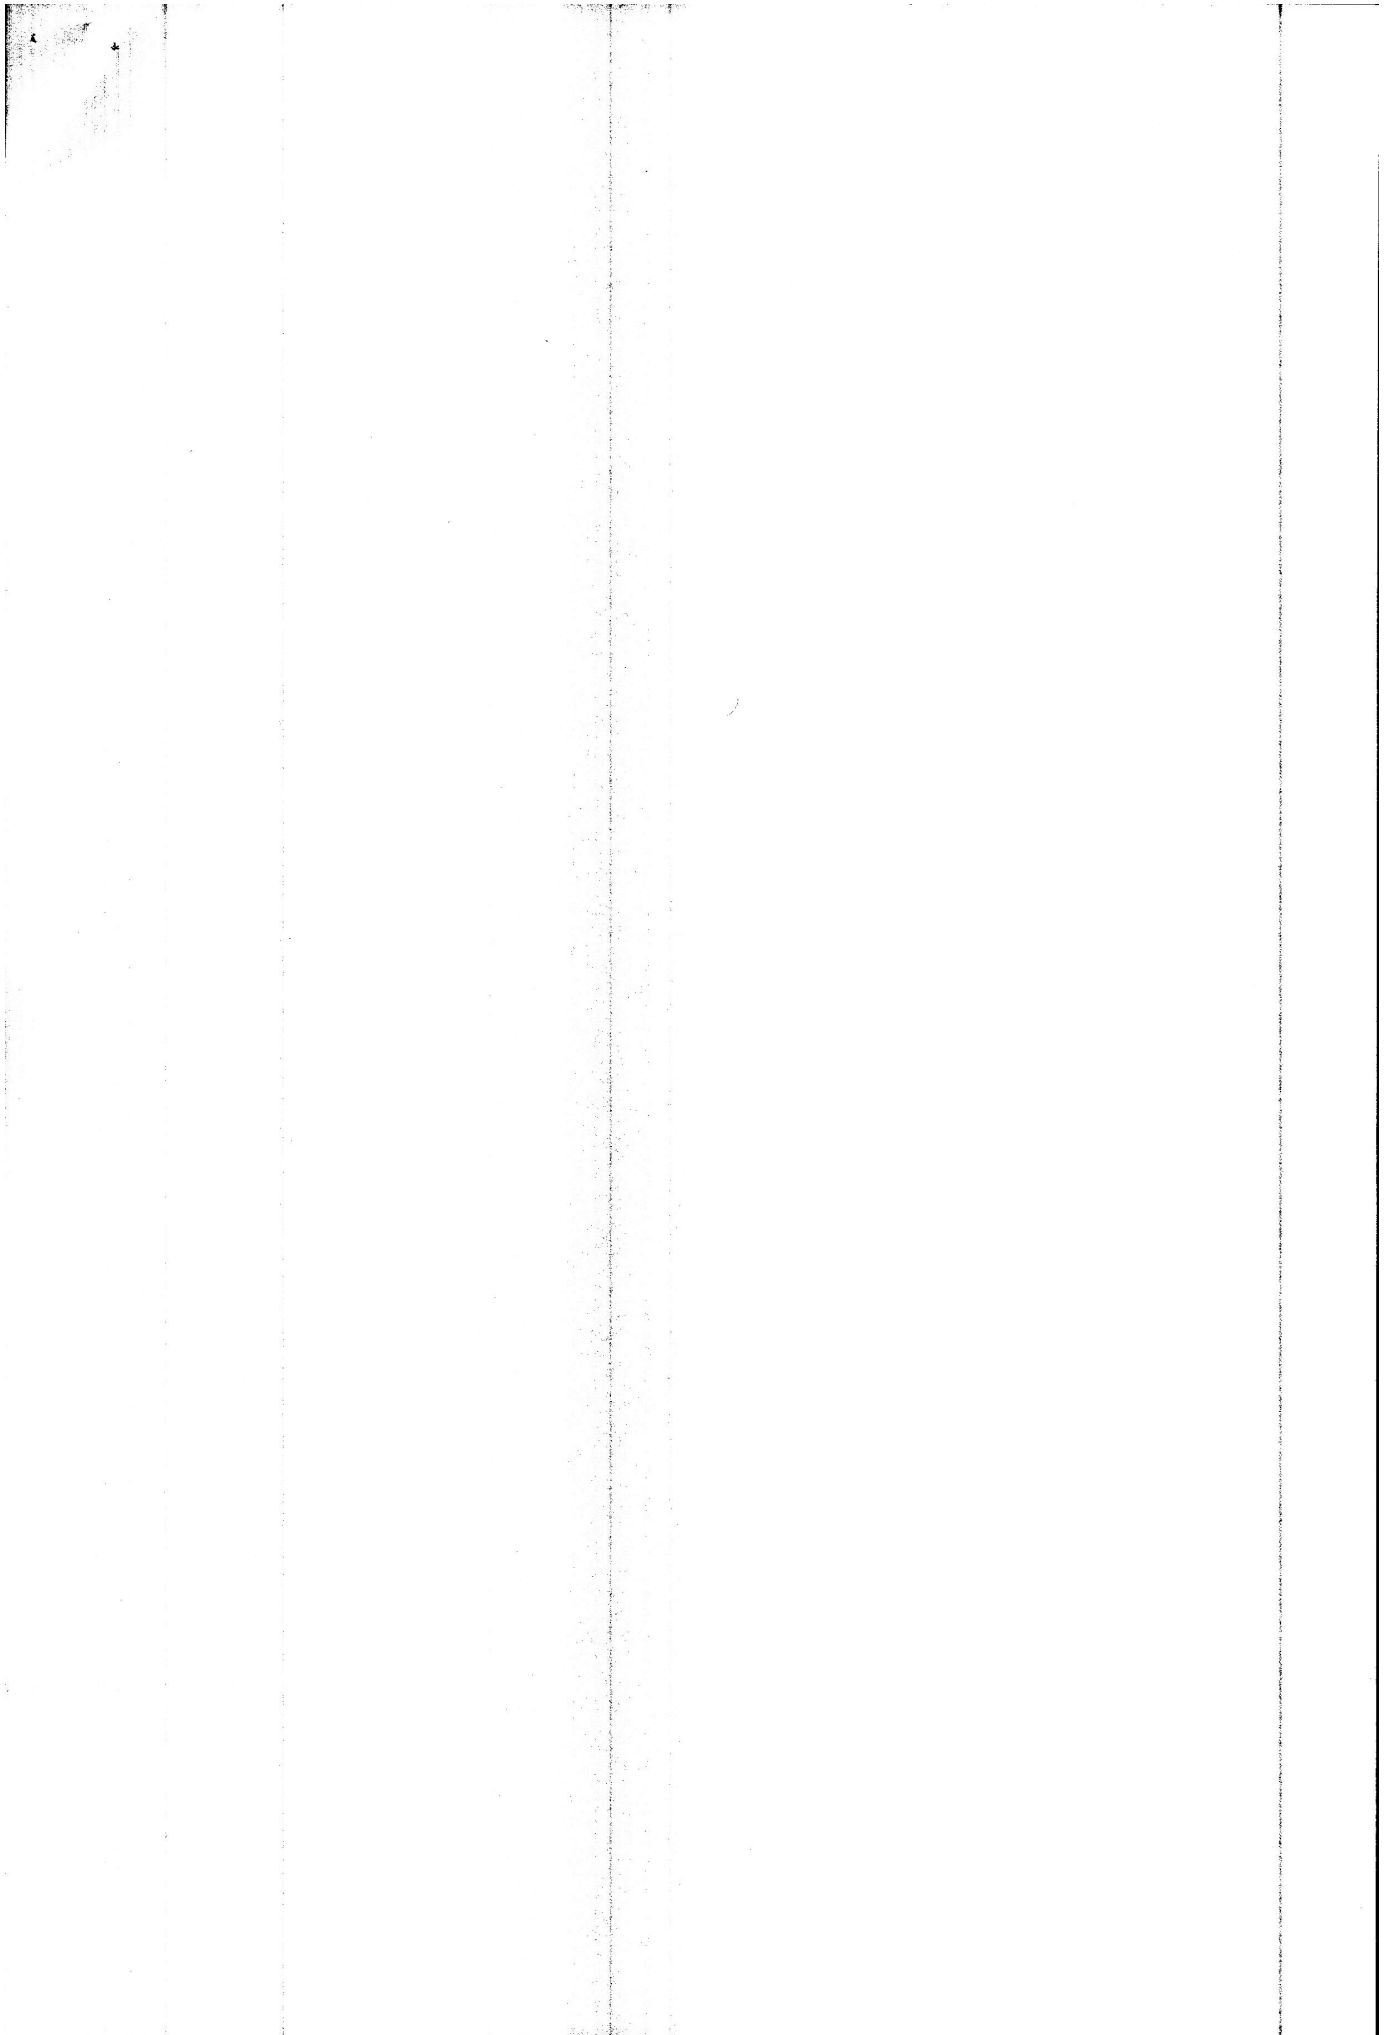
REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPOSITO 167,20
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 156,74
 VAL DEVIDO PREV SOC 156,74
 TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPOSITO 167,20
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000018 672001802017 207647180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: AEnzIn74Hhj0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 N° CONTROLE: NK\dqoit9h:z0000-0
COMP: 11/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 156,74
VAL DEVIDO PREV SOC 156,74
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.090,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 167,20
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL A RECOLHER 167,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8 40 (29/03/2020)

TABELAS 41 0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 25/11/2020
HORA 12:22:41
PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000018 672001802017 207647180995 000453968732

EMPRESA/TOMADOR		COD GPS: 2003		FPAS: 515	OUTRAS ENT	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRICAO: 900045396873
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	OCBO
REM SEM 13º SAL					CONTRIB SEG DEVIDA					JAM
DAMIAO SARAFIM NOGUEIRA			160.72390,79-0		01/09/2020	01				07170
1 045,00		0,00	0,00		78,37		83,60			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS			137 20925 45-4		01/09/2020	01				07170
1 045,00		0,00	0,00		78,37		83,60			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.090,00

0,00

0,00

156,74

167,20

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41 0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2020
HORA: 12 22 41
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000016 672001802017 207647180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR: OBRA MATOS E ALMEIDA LTDA
LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
TOTAIS	2	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41 0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 25/11/2020
HORA 12 22 41
PAG 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA Nº DE CONTROLE: Afnzn74Hh0000-7
COMP 11/2020 COD REC 150 COD GPS 2003 FPAS 515 OUTRAS ENT SIMPLES 2 RAT 0.0 FAP 0.50 RAT AJUSTADO 0.00
TOMADOR: OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA Nº DE CONTROLE: KHnwpIDNF130000-3 INSCRIÇÃO: 900045396873
LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP	156,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	156,74
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL	0,00	13º SALARIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 15 ANOS	0,00	COM PRODUÇÃO PJ	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 20 ANOS	0,00	COM PRODUÇÃO PF	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 25 ANOS	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO	0,00
PERÍODO INICIAL		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO	0,00		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO	3.568,14	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	156,74	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	3.411,40

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS	0,00
QUANTIDADE	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H	0 I1	0 I2	0 I3	0 I4	0 J	0 K	0 L	0 M	0 N1	0
N2	0 N3	0 O1	0 O2	0 O3	0 P1	0 P2	0 P3	0 Q1	0 Q2	0
Q3	0 Q4	0 Q5	0 Q6	0 Q7	0 R	0 S2	0 S3	0 U1	0 U2	0
U3	0 V3	0 W	0 X	0 Y	0 Z1	0 Z2	0 Z3	0 Z4	0 Z5	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 25/11/2020
HORA 12:22:41
PÁG 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

85890000018 672001802017 207647180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP 11/2020 COD REC 150 COD GPS 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 0111201
CIDADE JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
TOTAIS	2	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8 40 (29/03/2020) TABELAS 41 0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2020
HORA: 12 22 41
PAG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000018 672001802017 207647180995 000453968732

EMPRESA MATOS E ALMEIDA LTDA

Nº DE CONTROLE NK7dq0H9hZ0000-0

Nº ARQUIVO: Afznzn74Hh0000-7

INSCRIÇÃO: 900045396873

COMP 11/2020 COD REC: 150 COD GPS 2003 FPAS 515 OUTRAS ENT SIMPLES 2 RAT 0.0
TOMADOR/OBRA

FAP 0.50 RAT AJUSTADO 0.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMAR BARREIRA

CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE 4120400

MODALIDADE "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

2.090,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

167,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

167,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 25/11/2020
HORA 12 22 41
PAG 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA MATOS E ALMEIDA LTDA Nº DE CONTROLE NK7dq0H9hZ0000-0 Nº ARQUIVO Afznln74Hh0000-7
COMP 11/2020 COD REC 150 COD GPS 2003 FPAS 515 OUTRAS ENT SIMPLES 2 RAT 0.0 INSCRICAO 900045396873
TOMADOR/OBRA INSCRICAO

LOGRADOURO: RAU ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 0111201
CIDADE JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP	156,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	156,74
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 15 ANOS	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 20 ANOS	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 25 ANOS	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL	VALOR SOLICITADO	0,00
PERÍODO INICIAL			VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%	0,00
VALOR ABATIDO	0,00	VALOR A COMPENSAR	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9 711/98)				
VALOR INFORMADO	3.568,14	VALOR ABATIDO PELO SEFIP	156,74	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR 3.411,40

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS	0,00	20 ANOS	0,00	25 ANOS	0,00
QUANTIDADE	0	QUANTIDADE	0	QUANTIDADE	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:		PERÍODO		SEÇÃO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		MATOS & ALMEIDA LTDA ME RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CE CEP 6347500		nov/20		Único		
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS		DEDUÇÕES		CPF	SALÁRIO A RECEBER	
		SALÁRIO	S. FAMÍLIA	TOTAL	INSS			
1	DAMIAO SARAFIM NOGUEIRA	R\$ 1.045,00		R\$ 988,00	R\$ 76,35	161841593-81	R\$ 921,65	<i>Damiao Sarafim Nogueira</i>
2	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	R\$ 1.045,00		R\$ 1.045,00	R\$ 79,94	023568983-12	R\$ 965,06	<i>Francisco J. dos Santos</i>
3								
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 2.090,00	R\$ -	R\$ 2.090,00	R\$ 159,89		R\$ 1.930,12	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2020 - 12:22:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.090,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018090-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 900045396873	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

85890000018 672001802017 207647180995 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 330-522003051-9
 25/NOV/2020
 LOT. 05.005811-8 HORA DE 13:17:49
 LOCALIDADE: JAGUARIBE TERM 010876
 AG. VINCULADA: 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
 CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 90.004.53968/73
 CÓDIGO DO CONVENIO: 0180
 DATA DE VENCIMENTO: 07/12/2020
 COMPETENCIA: 11/2020
 VALOR TOTAL: 167,20

85890000018 672001802017
 207647180995 000453968732
 330-522003051-9

1ª VIA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

DIARIO DE OBRA


À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020
ART Nº. CE20200687457

2ª MEDIÇÃO:

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N. BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

DIARIO Nº 002 /2020



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.


RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com


DIARIO DE OBRA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

OUTUBRO 21 A 31 DE 2020

PAINAS Nº 01 A 11


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO N° 08.07.01/2020 ART N° . CE20200687457 Mês de OUTUBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 21/10/2020	FOLHA: 42	LIVRO: 02	CONDIÇÃO DO TEMPO		
	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 108				
	TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PEDEIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
PEDREIRO TRABALHANDO NA, LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, SERVENTES TRABALHANDO FAZENDO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) NA BETONEIRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM, CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO,
- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  <small>Eng Civil Reg. nº 9689643485 CREA-CE 332132CE</small>	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	OUTUBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	22/10/2020	FOLHA:	43	CONDIÇÃO DO TEMPO		
			LIVRO:	02			
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	107	MANHÃ	TARDE	NOITE
					BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
PEDREIRO TRABALHANDO NA, LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, SERVENTES TRABALHANDO FAZENDO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL
HIDRATADA (1:2:8) NA BETONEIRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM, CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM
AGREGADO ADQUIRIDO,
- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5009643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO N° 08.07.01/2020		ART N° . CE20200687457		Mês de OUTUBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
	23/10/2020	44	02				
	TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 106	MANHÃ	TARDE	NOITE	
	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>		
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
PEDREIRO TRABALHANDO NA, LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, SERVENTES TRABALHANDO FAZENDO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) NA BETONEIRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM, CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO,
- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS: 	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 
Eng Civil Reg. SP n° 5069643485 CREA-CE 332132CE	

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO Nº	08.07.01/2020	ART Nº	CE20200687457	Mês de	OUTUBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	24/10/2020	FOLHA:	45	CONDIÇÃO DO TEMPO		
			LIVRO:	02			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	105	MANHÃ	TARDE	NOITE
					BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
	DIAS DA SEMANA: SABADO				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PREZIDENTE	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

• FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, SERVENTES TRABALHANDO FAZENDO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) NA BETONEIRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM, CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO,


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO
RNP: 2614807907
Registro: 332132CE

ASS: _____



Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

ASS: _____



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de OUTUBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 25/10/2020	FOLHA: 46	LIVRO: 02	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 104					
DIAS DA SEMANA: DOMINGO			MANHÃ			TARDE	NOITE
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>		
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
REIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- SEM ATIVIDADES

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP n° 5069643485 CREA-CE 332132CF	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETA DA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de OUTUBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 27/10/2020	FOLHA: 48	LIVRO: 02	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 102	MANHÃ			TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PFDRREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- MOVIMENTO DE TERRA**

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO
 RNP: 2614807907
 Registro: 332132CE

ASS: _____


 Pedro Gomes de Melo Neto
 Eng Civil Reg. SP n° 5069643485
 CREA-CE 332132CE

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
 RNP: 0615727611
 Registro: 0615727611CE

ASS: _____

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 Mês de OUTUBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 28/10/2020	FOLHA: 49	LIVRO: 02	CONDIÇÃO DO TEMPO		
	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 101				
	TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
FERRATEIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- MOVIMENTO DE TERRA**

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM



- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**


CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5089643485 CREA - CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de OUTUBRO																	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 29/10/2020	FOLHA: 50	LIVRO: 02	CONDIÇÃO DO TEMPO																		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 100	<table border="1"> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> <tr> <td>BOM <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>BOM <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>BOM <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/></td> <td>S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/></td> <td>S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		
MANHÃ	TARDE	NOITE																				
BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>																				
INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>																				
CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>																				
S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>																				
DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA																						

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PEÇEIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- MOVIMENTO DE TERRA**

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM



- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA
D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. CP n° 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de OUTUBRO						
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	30/10/2020	FOLHA:	51	LIVRO:	02	CONDIÇÃO DO TEMPO				
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	99	MANHÃ	TARDE	NOITE				
	DIAS DA SEMANA:	SEXTA – FEIRA				BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	
					CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	
					S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PAZIEIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- MOVIMENTO DE TERRA**

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO

RNP: 2614807907

Registro: 332132CE

ASS: _____


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Rg. SP n° 5069643485
CREA-CE 332132CE


RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-

RNP: 0615727611

Registro: 0615727611CE

ASS: _____



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

DIARIO DE OBRA**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	OUTUBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 31/10/2020	FOLHA: 52	LIVRO: 02	CONDIÇÃO DO TEMPO				
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 98	MANHÃ				TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: SABADO	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>			
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>			
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>			

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEÇEIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- MOVIMENTO DE TERRA**

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM



- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA
D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 



Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

DIARIO Nº 002/2020



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

DIARIO DE OBRA


À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020
ART Nº. CE20200687457

2ª MEDIÇÃO:

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

DIARIO Nº 003 /2020



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com


DIARIO DE OBRA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

NOVEMBRO 01 A 24 DE 2020


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. nº 5069643485
CREA-CE 832132CE

PAINAS Nº 01 A 24

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 01/11/2020	FOLHA: 53	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 97	MANHÃ				TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: DOMINGO	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>			
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>			
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>			

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
COFREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA****RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO
 RNP: 2614807907
 Registro: 332132CE

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
 RNP: 0615727611
 Registro: 0615727611CE

ASS: 
 Eng Civil Reg/SP nº 5069643485
 CREA-CE 332132CE

ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVENBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
	02/11/2020	54	03				
	TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 96		MANHÃ	TARDE	NOITE
	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
REIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES FERIADO DIA DE FINADOS


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO
 RNP: 2614807907
 Registro: 332132CE

ASS: _____



 Pedro Gomes de Melo Neto
 Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
 CREA-CE 332132CE

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
 RNP: 0615727611
 Registro: 0615727611CE

ASS: _____



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

DIARIO DE OBRA**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO Nº	08.07.01/2020	ART Nº	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	03/11/2020	FOLHA:	55	LIVRO:	03
	CONDIÇÃO DO TEMPO					
	TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	95	
DIAS DA SEMANA:		TERÇA - FEIRA		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
REIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm
- PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE
ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. CP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO N° 08.07.01/2020		ART N° CE20200687457		Mês de NOVENBRO				
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 04/11/2020	FOLHA: 56	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO					
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 94					MANHÃ	TARDE	NOITE
		DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA		BOM <input checked="" type="checkbox"/>				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>				
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>				
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
REIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm



- PAREDES E PAINÉIS**

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil, Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2020

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 25.11.0008

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
25/11/2020	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 08.07.01/2020	0807012020	
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
233	32.911,88	31.911,88	1.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC. MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, PROCESSO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 08.07.01/2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SEC. CIDADES - ESTADUAL - Nº INSTRUMENTO: 1116377. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.

Eu, **GERALDO TARGINO DA SILVA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **25110008**. A(os) **25 de Novembro de 2020**



Responsável pelo Setor



GERALDO TARGINO DA SILVA
ORDENADOR

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2020

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008578

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
25/11/2020	25.11.0008	31.911,88	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC. MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 26/11/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 31.911,88	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA DO PADRÃO NACIC	Nº DA NOTA FISCAL: 220	Nº DOS FORMULÁRIOS: 220
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 25/11/2020	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 25/11/2020	SÉRIE DA NOTA: E	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 232011018161390001705501000000220000002206		CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 12055307F	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, PROCESSO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 08.07.01/2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SEC. CIDADES - ESTADUAL - Nº INSTRUMENTO: 1116377. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.

Jaguaribe, 26 de Novembro de 2020


GERALDO TARGINO DA SILVA
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2020

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 30.11.0219

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
25110008	25/11/2020	GLOBAL	31.911,88	08.07.01/2020	0807012020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
30110219	31.911,88	31.911,88	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
30/11/2020	31.911,88	2.996,52	28.915,36

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.106,18
1000.60.00.0.	ISS	890,34
Total da Retenção: (R\$)		2.996,52

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, PROCESSO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 08.07.01/2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SEC. CIDADES - ESTADUAL - Nº INSTRUMENTO: 1116377. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. NF 220

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **KAMILA PEIXOTO GUEDES BATISTA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **GERALDO TARGINO DA SILVA**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)	OUTROS	452480	28.915,36

Jaguaribe, 30 de Novembro de 2020


GERALDO TARGINO DA SILVA
GESTOR(A)



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ
CONVÊNIO 105/CIDADES/2019
PROGRAMA: SEE. DAS CIDADES

Recibo:.....R\$ 31.911,88

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N – Centro, CEP: 63475-000, inscrito no CNPJ sob n. 07.443.708/0001-66, quantia de **R\$ 31.911,88. (Trinta e Um Mil, Novecentos e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos.)** referente à 02ª medição da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE., conforme Tomada de Preço Nº 08.07.01/2020, conforme convênio nº 105/CIDADES/2019 – SECR, contrato nº 08.07.01/2020, CNO: 90.004.53968/73, valor do imposto Retido do ISS **R\$ 890,34 (Oitocentos e Noventa reais, trinta e Quatro Centavos)**, valor do imposto do INSS **R\$ 2.106,18 (Dois Mil, Cento e Seis Reais e Dezoito Centavos)**, valor liquido **R\$ 28.915,36 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Seis centavos.)**, conforme Nota Fiscal Nº 000220.

Pelo que Firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito. .

Jaguaribe 30 de novembro de 2020.

Denis Weima Silva Cardoso
Procurador Legal
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
CPF: 027.052.643-96

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Atesto que as despesas constante do presente documento foram realmente realizadas em proveito desta Municipalidade
Ao setor de SEINFRA

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

Agencia: 0749

OP: 003

Conta: 00001699-0

Favorecido: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, CNPJ: 01.816.139/0001-70. .

PAGA-SE
POR CONTA DE VERBA RESPECTIVA
Em 30 de 11 de 20 20

Geraldo Targino da Silva
Geraldo Targino da Silva
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA
CPF: 330.103.743-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000220	Data e Hora da Emissão 25/11/20 11:38	Período de Competência 11/20
Código de Verificação 12055307F	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 01.816.139/0001-70 Inscrição Municipal: 3535
Nome/Razão Social: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342, TERREO - EDMAR BARREIRA PINHEIRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail: MATOSEALMEIDA@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Endereço: PC SENADOR FERNANDES TAVORA, sn, - CENTRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 08.07.01/2020. CONFORME CONVÊNIO N° 105/CIDADES/2019 – SECR Qtd: 1 Valor Unitário: 31.911,88 Valor Total: 31.911,88 | Serviço: INSS 11% (BASE DE CALCULO 60%) Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00 | Serviço: UTILIZAÇÃO DA DEDUÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ISS: BASE DE CALCULO 60% Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00 | Serviço: CNO: 90.004.53968/73 Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00 | Serviço: DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00

VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 28.915,36

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 2.106,18	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 31.911,88	Deduções(R\$) 12.764,75	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 19.147,13	Alíquota(%) 4,65
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 890,34	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 28.915,36	Valor Total da Nota(R\$) 31.911,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 12055307F78ADDC31BD7442C0C29AE488B14E8C0BFD654E9
Atesto que as despesas constantes do presente documento foram realmente realizadas em proveito desta Municipalidade
Ao setor de SEINFRA

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572781-1

26/11/2020

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONVÊNIO 105/CIDADES/2019
PROGRAMA: SER. DAS CIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000220	Data e Hora da Emissão 25/11/20 11:38	Período de Competência 11/20
Código de Verificação 12055307F	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 01.816.139/0001-70 Inscrição Municipal: 3535
Nome/Razão Social: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342, TERREO - EDMAR BARREIRA PINHEIRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail: MATOSEALMEIDA@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Endereço: PC SENADOR FERNANDES TAVORA, sn, - CENTRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 08.07.01/2020. CONFORME CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR Qtd: 1 Valor Unitário: 31.911,88 Valor Total: 31.911,88 | Serviço: INSS 11% (BASE DE CALCULO 60%) Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00 | Serviço: UTILIZAÇÃO DA DEDUÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ISS: BASE DE CALCULO 60% Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00 | Serviço: CNO: 90.004.53968/73 Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00 | Serviço: DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00

VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 28.915,36

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 2.106,18	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 31.911,88	Deduções(R\$) 12.764,75	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 19.147,13	Alíquota(%) 4,65
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 890,34	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 28.915,36	Valor Total da Nota(R\$) 31.911,88


OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 12055307F78ADDC31BD7442C0C29AE488B14E8C0BFD654E9
Atesto que as despesas constantes do presente documento foram realmente realizadas em proveito desta Municipalidade
Ao setor de SEINFRA

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 031572751-1

26/11/2020

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONVÊNIO 105/CIDADES/2019
PROGRAMA: SEC. DAS CIDADES



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600001

0749/006/00071051-4

MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2020	445028	DB OBT CE	2.999,38D	2.999,38D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.999,38C	0,00
30/11/2020	452480	DB OBT CE	28.915,36D	28.915,36D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	28.915,36C	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600001

0749/006/00071051-4

MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

de: 01/12/2020 até: 09/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	454260	DB OBT CE	2.996,52D	2.996,52D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.996,52C	0,00
09/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G335040747058679010
04/12/2020 08:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS
Período do extrato de 03 / 12 / 2020 até 03 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 5541428000165 SICONVCE TED	888.984.529	4.252,38 C	
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 5541428000165 SICONVCE TED	888.985.144	2.996,52 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.248,90 D	
03/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							137.973,10 C
Saldo							137.973,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							137.973,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONVÊNIO:

MEDIÇÃO No. 02

VALORES (R\$)

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BARRIO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70
CONTRATO Nº: 08.07.01/2020

PERÍODO:
21/10/2020 a 23/11/2020
DATA:
segunda-feira, 23 de novembro de 2020

CONTRATO:
ADITIVO:
TOTAL:
MEDIÇÃO ACUMULADO:
SALDO:
VALOR DA MEDIÇÃO:
VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	PERÍODO	VALORES (R\$)											
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$		P. TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			ACUM. ATUAL	SALDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL								
1	SERVÇOS PRELIMINARES																				
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 255,53	6.436,79																
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	228,55	R\$ 4,82	3.066,36	12,00	12,00	100,00%	-	-	6.436,79										
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.447,57	1.101,61	228,55	228,55	100,00%	-	-	3.066,36										
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 821,25	1.447,57	1,00	1,00	100,00%	-	-	1.101,61										
2	MOVIMENTO DE TERRA																				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	35,68	R\$ 32,00	3.672,79	-	-	100,00%	-	-	1.916,11										
2.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	9,05	R\$ 20,51	1.141,76	35,68	35,68	100,00%	-	-	1.141,76										
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	25,74	R\$ 63,60	1.637,06	18,99	9,05	100,00%	-	-	1.207,26										
2.4	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,63	R\$ 2,69	71,63	6,75	25,74	100,00%	-	-	429,30										
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	26,63	R\$ 23,91	636,72	26,63	26,63	100,00%	-	-	71,63										
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA																				
3.1	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M3	19,35	R\$ 336,32	48.940,98	-	-	42,30%	-	-	20.701,22										
3.2	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TUDOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,84	R\$ 393,40	6.507,79	19,35	19,35	100,00%	-	-	20.701,22										
3.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM	M2	13,61	R\$ 29,67	403,81	13,61	13,61	100,00%	-	-	403,81										
3.4	CONCRETO P/VER., FCC 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	24,61	R\$ 328,99	8.096,44	7,30	7,30	29,66%	-	-	2.401,63										
3.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.202,60	R\$ 7,23	8.694,80	703,90	703,90	58,53%	-	-	5.089,20										
3.6	ARMADURA CA-50A FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	338,00	R\$ 7,14	2.413,32	227,30	227,30	67,25%	-	-	1.622,92										
3.7	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm UTIL. 5X	M2	54,71	R\$ 80,74	4.417,29	28,25	28,25	51,64%	-	-	2.280,91										
3.8	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	27,19	R\$ 71,16	1.934,84	-	-	0,00%	-	-	-										
3.9	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	7,87	R\$ 78,94	616,54	-	-	0,00%	-	-	-										
3.10	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	48,46	R\$ 80,28	3.890,37	-	-	0,00%	-	-	-										
3.11	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	116,76	R\$ 81,97	9.570,82	-	-	0,00%	-	-	-										
3.12	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASPÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	22,79	R\$ 21,54	490,90	22,79	22,79	100,00%	-	-	490,90										
4	PAREDES E PAINÉIS																				
4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	316,80	R\$ 24,44	7.742,59	-	-	50,33%	-	-	26.891,10										
4.2	ALVENARIA DE TUDOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	M2	10,04	R\$ 120,51	1.209,92	-	-	0,00%	-	-	10,04										
4.3	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,66	R\$ 1.138,85	751,64	-	-	100,00%	-	-	751,64										
4.4	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	14,40	R\$ 54,75	788,40	-	-	0,00%	-	-	14,40										
4.5	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3,90	R\$ 74,65	291,14	-	-	0,00%	-	-	3,90										
4.6	PRATEIIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	22,70	R\$ 126,46	2.870,64	-	-	0,00%	-	-	22,70										
4.7	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	15,66	R\$ 93,92	1.470,79	-	-	0,00%	-	-	15,66										
4.8	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR-CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	109,53	R\$ 203,07	22.242,26	-	-	100,00%	-	-	22.242,26										
5	COBERTURA																				
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	187,47	R\$ 55,04	10.318,35	-	-	0,00%	-	-	187,47										
5.2	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	187,47	R\$ 46,58	8.732,35	-	-	0,00%	-	-	187,47										
5.3	RIFU DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	56,80	R\$ 45,30	2.573,04	-	-	0,00%	-	-	56,80										
6	ESQUADRIAS																				
6.1	PORTA TIPO ANODIZADO COMPACTA	M2	8,70	R\$ 356,80	3.104,16	-	-	0,00%	-	-	8,70										
6.2	PORTA TIPO FICHA EMRUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	M2	9,87	R\$ 282,32	2.786,50	-	-	0,00%	-	-	9,87										
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	3,06	R\$ 326,78	999,95	-	-	0,00%	-	-	3,06										
6.4	DOBRADILHA CROMADA 3 X 2 1/2	UN	30,00	R\$ 26,19	785,70	-	-	0,00%	-	-	30,00										
6.5	FORNAMENTO OU BASTENTE DE MADEIRA	M	34,70	R\$ 33,55	1.164,19	-	-	0,00%	-	-	34,70										
6.6	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	69,40	R\$ 6,28	435,83	-	-	0,00%	-	-	69,40										

Psaul Gomes de Melo Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081972761-1

Abson: Cervantes Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081972761-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NA RUA PROJETADA 04, S/N, BARRIO EXPEDITO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70
CONTRATO Nº: 08.07.01/2020

CONVÊNTO:
105/CIDADES/2019
MEDICÃO No. 02
PERÍODO:
21/10/2020 a 23/11/2020
DATA:
segunda-feira, 23 de novembro de 2020

VALORES (R\$)
CONTRATO: 311.479,83
ADITIVO:
TOTAL: 311.479,83
MEDICÃO ACUMULADO: 63.155,40
SALDO: 248.324,43
VALOR DA MEDICÃO: 31.911,88

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR
6.7	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 107,02	107,02	-	-	1,00	0,00%	-	-
6.8	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	6,00	R\$ 101,09	606,54	-	-	6,00	0,00%	-	-
6.9	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-Ocupada)	UN	3,00	R\$ 64,40	193,20	-	-	3,00	0,00%	-	-
6.10	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO. DE CORRER. SEM BANDEIROLA E/OU PETITROL. SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,55	R\$ 223,32	1.686,07	-	-	7,55	0,00%	-	-
6.11	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 3mm COLADO	M2	7,55	R\$ 134,96	1.018,95	-	-	7,55	0,00%	-	-
6.12	GUARDA CORPO C/ CONRILHO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	1,60	R\$ 183,53	293,65	-	-	1,60	0,00%	-	-
7	REVESTIMENTO DE PAREDES				33.198,03				2,28%	755,84	755,84
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	316,80	R\$ 4,74	1.501,63	159,46	159,46	157,34	50,33%	755,84	755,84
7.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRACO 1:3	M2	316,80	R\$ 23,00	7.286,40	-	-	316,80	0,00%	-	-
7.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRACO 1:3	M2	150,93	R\$ 33,31	5.027,48	-	-	150,93	0,00%	-	-
7.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	165,87	R\$ 74,60	12.373,90	-	-	165,87	0,00%	-	-
7.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	165,87	R\$ 6,76	1.121,28	-	-	165,87	0,00%	-	-
7.6	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	84,54	R\$ 58,08	4.910,08	-	-	84,54	0,00%	-	-
7.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	84,54	R\$ 10,85	917,26	-	-	84,54	0,00%	-	-
8	ARGAMASSAS PARA TETOS				6.973,43				0,00%		
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	183,85	R\$ 9,36	1.720,84	-	-	183,85	0,00%	-	-
8.2	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA S/ PENERAR, TRACO 1:2:8. ESP=20 mm P/ TETO	M2	183,85	R\$ 28,57	5.252,59	-	-	183,85	0,00%	-	-
9	PISOS INTERIORS				27.132,59				0,00%		
9.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6cm	M2	183,85	R\$ 40,08	7.368,71	-	-	183,85	0,00%	-	-
9.2	REGULAGEM DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	M2	183,85	R\$ 18,52	3.404,90	-	-	183,85	0,00%	-	-
9.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,80	R\$ 71,20	982,56	-	-	13,80	0,00%	-	-
9.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	13,80	R\$ 7,43	102,53	-	-	13,80	0,00%	-	-
10	PISOS EXTERIORS E URBANIZAÇÃO				170,05			170,05	0,00%		
10.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	62,95	R\$ 39,84	2.507,93	-	-	62,95	0,00%	-	-
10.2	LASTRO DE AREIA ADOURADA	M3	19,48	R\$ 73,47	1.431,20	-	-	19,48	0,00%	-	-
10.3	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	324,65	R\$ 29,99	9.736,25	-	-	324,65	0,00%	-	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				16.065,98				0,00%		
11.1	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 5,70	11,40	-	-	2,00	0,00%	-	-
11.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (OCTOGONAL)	UN	47,00	R\$ 6,70	314,90	-	-	47,00	0,00%	-	-
11.3	QUILVA PELETRUDO PVC ROSC. D = 32mm (1")	UN	2,00	R\$ 6,18	12,36	-	-	2,00	0,00%	-	-
11.4	LUIVA PELETRUDO PVC ROSC. D = 32mm (1")	UN	6,00	R\$ 2,47	14,82	-	-	6,00	0,00%	-	-
11.5	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	M	314,65	R\$ 3,69	1.161,06	-	-	314,65	0,00%	-	-
11.6	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	64,50	R\$ 4,63	298,64	-	-	64,50	0,00%	-	-
11.7	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	547,05	R\$ 5,45	2.981,42	-	-	547,05	0,00%	-	-
11.8	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	43,50	R\$ 8,96	389,76	-	-	43,50	0,00%	-	-

Eng.º Pedro Gabriel de Jesus Neto
Eng Civil Reg. SF nº 5069643485
CREA-CE 332132CE

Ass: Eng.º Pedro Gabriel de Jesus Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572761-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CONTRATO Nº 08.07.01/2020
CONVENIÃO: 105/CIDADES/2019
MEDIÇÃO Nº. 02
PERÍODO: 21/10/2020 a 23/11/2020
DATA: segunda-feira, 23 de novembro de 2020
VALORES (R\$)

OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETA DA 04, S/N, BARRIO EXPEDITO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
CNPJ: 01.816.139/0001-70
CONTRATO Nº 08.07.01/2020
VALOR DA MEDIÇÃO: VALORES (R\$)
ADITIVO: 311.479,83
TOTAL: 311.479,83
MEDIÇÃO ACUMULADO: 63.155,40
SALDO: 248.324,43
VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: 31.911,88

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.9	CAXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	R\$ 299,57	2.396,56	-	-	8,00	0,00%	-	-
11.10	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	46,00	R\$ 3,88	178,48	-	-	46,00	0,00%	-	-
11.11	INTERRUPTOR UMA TELA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	R\$ 13,19	105,52	-	-	8,00	0,00%	-	-
11.12	INTERRUPTOR DUAS TELAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	R\$ 20,96	62,88	-	-	3,00	0,00%	-	-
11.13	TOMADA 2 POLOS MAIS TERÇA 20A 250V	UN	31,00	R\$ 14,97	464,07	-	-	31,00	0,00%	-	-
11.14	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	R\$ 12,61	50,44	-	-	4,00	0,00%	-	-
11.15	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	7,00	R\$ 66,37	464,59	-	-	7,00	0,00%	-	-
11.16	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	11,00	R\$ 66,37	730,07	-	-	11,00	0,00%	-	-
11.17	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 75,65	75,65	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/40V	UN	4,00	R\$ 108,77	435,08	-	-	4,00	0,00%	-	-
11.19	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 126,93	126,93	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.20	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	202,60	R\$ 12,18	2.467,67	-	-	202,60	0,00%	-	-
11.21	ELETRÓDUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1/2")	M	1,00	R\$ 7,09	7,09	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.22	ELETRÓDUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1/2")	M	27,20	R\$ 24,99	679,73	-	-	27,20	0,00%	-	-
11.23	ELETRÓDUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,00	R\$ 17,66	17,66	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.24	ELETRÓDUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	1,00	R\$ 23,95	23,95	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUIR ATE 24 DIVISORES 33X33X295mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 273,92	273,92	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.26	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COLEGE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 70,68	70,68	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.27	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 50W	UN	22,00	R\$ 74,75	1.644,50	-	-	22,00	0,00%	-	-
11.28	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	3,00	R\$ 40,60	121,80	-	-	3,00	0,00%	-	-
11.29	ABANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETRÓSTATICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	3,00	R\$ 161,45	484,35	-	-	3,00	0,00%	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				60.999,68				0,00%		
12.1	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	58,26	R\$ 5,71	332,06	-	-	58,26	0,00%	-	-
12.2	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1")	M	40,42	R\$ 8,70	351,65	-	-	40,42	0,00%	-	-
12.3	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	4,45	R\$ 12,96	57,67	-	-	4,45	0,00%	-	-
12.4	TE REDUÇÃO PVC SOLID. MARRON D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	2,00	R\$ 12,27	24,54	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.5	TE PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	UN	39,00	R\$ 6,99	272,61	-	-	39,00	0,00%	-	-
12.6	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	2,00	R\$ 3,44	6,88	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.7	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	R\$ 4,17	8,34	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.8	CAP PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1")	UN	1,00	R\$ 2,87	2,87	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.9	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	7,00	R\$ 3,45	24,15	-	-	7,00	0,00%	-	-
12.10	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	9,00	R\$ 4,15	37,35	-	-	9,00	0,00%	-	-
12.11	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	1,00	R\$ 6,99	6,99	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.12	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLID./ROSCA. D= 25mmX1/2"	UN	10,00	R\$ 7,73	77,30	-	-	10,00	0,00%	-	-
12.13	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	40,00	R\$ 8,30	332,00	-	-	40,00	0,00%	-	-
12.14	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	1,00	R\$ 8,59	8,59	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.15	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 1" (32mm)	UN	1,00	R\$ 9,96	9,96	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.16	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 1 1/4" (40mm)	UN	1,00	R\$ 18,67	18,67	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.17	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 25mmX3/4"	UN	3,00	R\$ 5,77	17,31	-	-	3,00	0,00%	-	-
12.18	TUBETE GEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA	UN	2,00	R\$ 5,87	11,74	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.19	TUBO PVC BRANCO P/REGISTRO D=40mm (1 1/2")	M	45,01	R\$ 0,86	38,71	-	-	45,01	0,00%	-	-
12.20	TUBO PVC BRANCO P/REGISTRO D=50mm (2")	M	56,73	R\$ 14,30	811,53	-	-	56,73	0,00%	-	-
12.21	TUBO PVC BRANCO P/REGISTRO D= 25mm (1")	M	33,29	R\$ 22,59	752,02	-	-	33,29	0,00%	-	-
12.22	TUBO PVC BRANCO P/REGISTRO D= 100mm (4")	M	121,09	R\$ 25,41	3.076,90	-	-	121,09	0,00%	-	-
12.24	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESSGOTO D=150mm (6")	M	4,12	R\$ 37,85	155,94	-	-	4,12	0,00%	-	-

Eng.º Absolon Cavalcante Mota Neto
CREA-CE 332132CE

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 CONTRATO Nº: 08.07.01/2020

CONVENIO: 105/CIDADES/2019

MEDIÇÃO No. 02
 PERÍODO: 21/10/2020 a 23/11/2020
 DATA: segunda-feira, 23 de novembro de 2020

CONTRATO: 311.479,83
 ADITIVO: -
 TOTAL: 311.479,83
 MEDIÇÃO ACUMULADO: 63.155,40
 SALDO: 248.324,43
 VALOR DA MEDIÇÃO: VALORES (R\$)
 ANTERIOR: 31.911,88

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	PERÍODO	VALORES (R\$)	
				P. UNIT R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.25	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1,1/4")	UN	82,00	R\$ 11,78	965,96	-	-	82,00	-	0,00%	-	-	-
12.26	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	21,00	R\$ 13,10	275,10	-	-	21,00	-	0,00%	-	-	-
12.27	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	R\$ 17,47	34,94	-	-	2,00	-	0,00%	-	-	-
12.28	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	R\$ 20,31	81,24	-	-	4,00	-	0,00%	-	-	-
12.29	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1,1/2")	UN	88,00	R\$ 10,59	931,22	-	-	88,00	-	0,00%	-	-	-
12.30	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	R\$ 11,25	292,50	-	-	26,00	-	0,00%	-	-	-
12.31	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	8,00	R\$ 17,25	138,00	-	-	8,00	-	0,00%	-	-	-
12.32	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	R\$ 22,92	91,68	-	-	4,00	-	0,00%	-	-	-
12.34	LULA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	30,00	R\$ 6,13	183,90	-	-	30,00	-	0,00%	-	-	-
12.35	LULA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	8,00	R\$ 11,10	88,80	-	-	8,00	-	0,00%	-	-	-
12.36	LULA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	22,00	R\$ 14,50	319,00	-	-	22,00	-	0,00%	-	-	-
12.37	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75x50mm (3"x2")	UN	8,00	R\$ 23,85	190,80	-	-	8,00	-	0,00%	-	-	-
12.38	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm (4"x2")	UN	16,00	R\$ 29,25	468,00	-	-	16,00	-	0,00%	-	-	-
12.39	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x50mm (3"x2")	UN	2,00	R\$ 17,53	35,06	-	-	2,00	-	0,00%	-	-	-
12.40	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75x50mm (3"x2")	UN	4,00	R\$ 13,24	52,96	-	-	4,00	-	0,00%	-	-	-
12.41	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1,1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	4,00	R\$ 12,47	49,88	-	-	4,00	-	0,00%	-	-	-
12.42	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-JUNTAS SOLD.	UN	5,00	R\$ 15,51	77,55	-	-	5,00	-	0,00%	-	-	-
12.43	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIÇA ACOPIADA	UN	3,00	R\$ 541,45	1.624,35	-	-	3,00	-	0,00%	-	-	-
12.45	BANQUADA DE GRANITO CINZA F=2cm	M2	0,88	R\$ 216,52	190,54	-	-	0,88	-	0,00%	-	-	-
12.46	COUBA DE INOX PARA BANQUADA COMPLETA	M2	1,00	R\$ 262,53	262,53	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.47	TORNEIRA DE PRESSÃO GROMADA LONÇA P/PIPA	UN	1,00	R\$ 86,84	86,84	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.48	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	UN	1,00	R\$ 48,22	48,22	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.50	REGISTRO DE GAVETA C/CAIÇA GROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00	R\$ 88,68	354,72	-	-	4,00	-	0,00%	-	-	-
12.51	REGISTRO DE GAVETA C/CAIÇA GROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	R\$ 79,74	239,22	-	-	3,00	-	0,00%	-	-	-
12.52	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X115cm)	UN	3,00	R\$ 51,41	154,23	-	-	3,00	-	0,00%	-	-	-
12.53	PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO BRANCA	UN	2,00	R\$ 34,54	69,08	-	-	2,00	-	0,00%	-	-	-
12.54	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	R\$ 61,95	61,95	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.55	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX P/WCS	M	1,60	R\$ 185,40	296,64	-	-	1,60	-	0,00%	-	-	-
12.56	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 10,06	10,06	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.57	REGISTRO DE PRESSÃO C/CAIÇA GROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 72,47	72,47	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.58	TORNEIRA DE PRESSÃO GROMADA USO GERAL	UN	3,00	R\$ 44,89	134,67	-	-	3,00	-	0,00%	-	-	-
12.59	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.000x50)cm COMPLETA C/ TORNEIRA DE	UN	40,00	R\$ 142,24	5.689,60	-	-	40,00	-	0,00%	-	-	-
12.60	RATO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	R\$ 35,15	35,15	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.61	DUCHA P/ WIC GROMADO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$ 56,99	170,97	-	-	3,00	-	0,00%	-	-	-
12.62	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA GROMADA	UN	24,00	R\$ 57,60	1.382,40	-	-	24,00	-	0,00%	-	-	-
12.63	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TÍPOLO COMUM, VÁSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00	R\$ 459,93	5.979,09	-	-	13,00	-	0,00%	-	-	-
12.64	FOSSA SÉPTICA E SUMIDURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 2.953,80	2.953,80	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
12.65	RESERVATÓRIO EM ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA-CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FLISTE 6,20m	UN	1,00	R\$ 29.104,62	29.104,62	-	-	1,00	-	0,00%	-	-	-
1.3	PINTURA				8.595,90					0,00%			
13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAS/MASSA DE PVA	M2	183,85	R\$ 11,10	2.040,74	-	-	183,85	-	0,00%	-	-	-
13.2	LATEX AGRILADO TRÊS DEMAS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	334,78	R\$ 18,63	6.236,95	-	-	334,78	-	0,00%	-	-	-
13.3	ESMALTE DUAS DEMAS EM ESQUADRILHAS DE MADEIRA	M2	19,74	R\$ 16,12	318,21	-	-	19,74	-	0,00%	-	-	-
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.931,25					0,00%			
14.1	LIPEZA GERAL	M2	228,55	R\$ 8,45	1.931,25	-	-	228,55	-	0,00%	-	-	-

Pedro Soares de Melo Neto
 Eng Civil Reg. Sp nº 5069643485
 CREA-CE 332132CE

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

JAGUARIBE
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
EMPRESA EXECUTORA:
CNPJ: 01.816.139/0001-70
CONTRATO Nº: 08.07.01/2020
CONVENIO: 105/CIDADES/2019
MEDIÇÃO No. 02
PERÍODO: 21/10/2020 a 23/11/2020
DATA: segunda-feira, 23 de novembro de 2020
CONTRATO: 311.479,83
ADITIVO:
TOTAL: 311.479,83
MEDIÇÃO ACUMULADO: 63.159,40
SALDO: 248.324,43
VALOR DA MEDIÇÃO: 31.911,88
VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	VALORES (R\$)		
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				11.744,15							2.348,83	2.348,83	4.697,66
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5,00	R\$ 2.348,83	11.744,15	1,00	-	2,00	-	3,00	40,00%	2.348,83	2.348,83	4.697,66
				TOTAL GERAL R\$							20,28%	31.911,88	31.243,52	63.155,40


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
EMPRESA EXECUTORA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

2 MOVIMENTO DE TERRA

02.03 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO)

Área dos Ambientantes:

Copa = 7,70 m²
D.M.L = 2,10 m²
Dep. de roupa suja = 18,10 m²
Dep. de roupa limpa = 18,10 m²
W.C. = 8,81 m²
W.C. PNE = 2,89 m²
Área de engomação = 64,50 m²
Área de lavagem de roupas = 49,65 m²
Área de tanques elétricos = 12,00 m²

Área total = 183,85 m²

Altura média do aterro (até o nível da regularização) = 0,14 m


Volume = 25,74 m³

02.04 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

(+) Volume da escavação = - m³
(-) Reaterro = - m³
Volume = - m³

02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL

(+) Volume da escavação = - m³
(-) Reaterro = - m³


Pedro Salles de Azevedo Neto
Eng Civil - CRP nº 306964/3485
CREA/CE 33213/2CE


6/9


Nota Neto
RNP: 008107791-4

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
EMPRESA EXECUTORA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

04	PAREDES E PAINÉIS		
04.01	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm		
	PAREDES INTERNAS		
	Perímetro das paredes na vertical =	35,75	m
	Perímetro das paredes na horizontal=	42,10	m
	Altura =	2,80	m
	Área das paredes dos tanques=	-	m
	Área parcial =	217,98	m ²
	ALVENARIA DAS PLATIBANDAS		
	Área parcial =	-	m ²
	BURACOS, PORTAS E JANELAS		
	Desconto de área =	58,52	m ²
	Área total =	159,46	m²
04.03	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		
	Comprimento =	40,30	m
	Altura =	0,15	m
	Largura da base =	0,11	m
	Volume =	0,66	m³
04.08	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA		
	PAREDES EXTERNAS		
	Perímetro das paredes na vertical (fachadas frontal e posterior)=	26,45	m
	Perímetro das paredes na horizontal (fachada lateral)=	28,00	m


Pedro Romão de Melo Neto
Eng Civil Reg.º 5086643485
CREA-CE 332132CE


7/9



Absorvente Responsável Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572791-1

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
EMPRESA EXECUTORA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

Altura =	2,20	m
Subtotal =	119,79	m ²
(-) Descontos - (Cobogós da fachada)	10,26	m ²
Área Total =	109,53	m²
07 REVESTIMENTO DE PAREDES		
07.01 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm		
Idem item anterior 04.01 =	159,46	m²
15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
15.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	MÊS


Pedro Gomes da Mota Neto
Eng Civil Reg. Prof. 1089643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 091572731-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 23/11/20
FISCAL: ABSOLON MOTA CAVALCANTE
CÓDIGO DA OBRA:


Nº DO CONTRATO: 08.07.01/2020
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA
INÍCIO DA OBRA: 09/09/2020
PREVISÃO DE TÉRMINO: 09/02/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	42,30%	<input type="checkbox"/> MAU	
PAREDES E PAINÉIS	71,96%		
COBERTURA	0,00%		
ESQUADRIAS	0,00%	PREVISTO:	
REVESTIMENTO DE PAREDES	2,28%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	20,28%
ARGAMASSAS PARA TETOS	0,00%		
PISOS INTERNOS	0,00%		
PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO	0,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%		
PINTURA	0,00%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40,00%		

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 23 de novembro de 2020.


 Pedro Gomes de Melo Neto
 Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
 CREA-CE 332132CE


Geraldo Targino da Silva
 SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA
 CPF: 330.103.743-72


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 051572761-1

22/07/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:05:40 do dia 22/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2021.

Código de controle da certidão: **01F2.3449.E26B.9A82**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202011810480

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067614590
CNPJ / CPF: 01816139000170
RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/09/2020 ÀS 19:03:56
VÁLIDA ATÉ 29/11/2020

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202014375873

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.761.459-0
CNPJ / CPF: 01.816.139/0001-70
RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2020 ÀS 14:09:43
VÁLIDA ATÉ 25/01/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.816.139/0001-70

Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA /
JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2020 a 30/11/2020

Certificação Número: 2020110101070149250349

Informação obtida em 19/11/2020 11:19:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.816.139/0001-70

Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA /
JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2020 a 19/12/2020

Certificação Número: 2020112001281723192113

Informação obtida em 26/11/2020 14:08:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.816.139/0001-70
Certidão n°: 28817133/2020
Expedição: 07/11/2020, às 15:01:31
Validade: 05/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000
Tel.: (88) 3522-1092 CNPJ: 07.443.708/0001-66

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Município

Jaguaribe

Estado

CE

CNPJ/CPF

01.816.139/0001-70

Inscrição Municipal

3535

Data Emissão

19/11/2020

Código de controle da certidão: **465192AB36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até **19/12/2020**.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atividade CNAE Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Certificação Digital: 465192AB36

(Para validar esta certidão acesse <https://siam.imap.org.br/ce/jaguaribe/> --> Validação de Certidões)

Data da consulta: 26/10/2020 09:35:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

24/11/2020

FIC



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.761459-0

RAZÃO SOCIAL

MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

ENDEREÇO COMPLETO

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342
Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000
Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE

C.N.P.J.

01.816.139/0001-70

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

204.0400-0

C.N.A.E. PRINCIPAL

4120400

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4120400

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

4213800

REGIME DE RECOLHIMENTO

OUTROS

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

4299501

NATUREZA JURÍDICA

3

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2020 ÀS 09:58:56

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.816.139/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342	COMPLEMENTO : TERREO;
---	----------------------	---------------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR	TELEFONE (88) 3522-1138/ (88) 9957-3228
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/11/2020 às 12:43:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.004.53968/73	Nome da obra construção de lavanderia pública municipal	Data do cadastramento 22/09/2020 14:55
Origem do cadastramento e-CAC		
Data do início da obra 09/09/2020	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 09/09/2020
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro expedito diogenes	Logradouro RUA projetada 04	Número s/n	Complemento terreo

Responsável

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ 01.816.139/0001-70	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 09/09/2020	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	316,80 m ²


Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Estacionamento Térreo	316,80 m ²	0,00 m ²	316,80 m ²

ALVARA DE CONSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ Nº:000561/2020	REQUERIDO EM:10/09/2020	VÁLIDO ATÉ:31/12/2020
Dados do Imóvel		
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE CPF/CNPJ:07.443.708/0001-66 Endereço:RUA PROJETADA 04 LMP Nº 53 - BAIRRO : EXPEDITO DIÓGENES - Jaguaribe ce		
Dados da Obra: Área Total do Imóvel: 560,00 m2 Área de Ampliação: 0,00 Área de Reforma:0,00 Área de Demolição: 0,00 Área da Obra Construída:316,80 m2 Responsável Técnico pela execução: PEDRO GOMES DE MELO NETO ART Nº: 20200687457 CREA: 2614807907		
ESPECIFICAÇÃO DA OBRA Natureza da Obra:EXECUÇÃO DS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04		
Observação:O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO SE FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURAESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO.		
Local:Jaguaribe Data de emissão:10/09/2020	 Responsável Secretaria da Cidade e Infraestrutura CERALDO TARCINO DA SILVA SECRETÁRIO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA CPF: 000.102.743-72	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 96.870-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Saneiros - João Pessoa/PB - CEP 53035-900 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: (33) 3344-5444 - Fax: (33) 3344-5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º Inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 36730403201019360031-1; Data: 04/03/2020 10:23:36

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV74290-06A2;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valter Azevedo de Miranda Cavalcante
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ALVARÁ DE LICENÇA

PARA FUNCIONAMENTO

Alvará Nº: 000162/2020	Exercício: 2020	Inscrição Municipal: 3535	Válido Até: 31/12/2020
------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

Nome / Razão Social

Nome / Razão Social..... MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 Documento..... 01.816.139/0001-70

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia..... CONSTRUTORA MATOS
 Endereço..... RUA ANTONIO GOMES DA SILVA,342 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO
 Complemento TERREO

Atividade(s) Econômica(s)

4120-4/00 Construção de edifícios

Área: 8,48M²
 Horário de Funcionamento De 07:00 às 18:00

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA.

<p>Local <input type="checkbox"/> JAGUARIBE-CE</p> <p>Data da emissão 03/03/2020</p>	<p><i>Alcides da Silva Melo</i></p> <p>Secretaria de Planejamento e Gestão</p> <p><i>Valdeci de Freitas Araújo</i></p> <p>Setor de Tributação</p>
--	---

05/03/2020

<https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/36730403201019360031>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **MATOS e ALMEIDA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **MATOS e ALMEIDA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/03/2020 11:10:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MATOS e ALMEIDA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1476028

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/03/2021 12:06:13 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 36730403201019360031-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdbb5ba3785a31b0c48dc03533e9b2980ed51d952ac530d54b5fc7536c4b0d9ad740a02d0786a4239a62076f650cd26da9e0af689a50ef9c709dd94626f2f71bd





CAU/BR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 000006618855
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: TAYRONE JOSÉ GONÇALVES

Registro Nacional: A124289-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 07.443.708/0001-66

Contrato: 2018/002

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 01/02/2018

Data de Início: 01/12/2017

Previsão de término: 28/02/2018

Situação: BAIXA

Data Situação: 30/06/2018

Data de término da atividade: 22/06/2018

Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA TRAVESSA 4

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIÓGENES

UF: CE CEP: 63475000 Cidade: JAGUARIBE

Coordenadas Geográficas: Latitude: -5.886952560090001

Longitude: -38.60919069699932

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS

Atividade: 1.10.3 - Orçamento

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

RRT SIMPLES
Nº 000006618855
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, COM AS COORDENADAS EM UTM VIA (GOOGLE EARTH): 544007.64 m E; 9349336.06 m N.

6. VALOR

Valor do RRT:

R\$ 91,50

Pago em: 02/02/2018


Total Pago:

R\$ 91,50


7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Jaguaribe, 02 de fevereiro de 2018
Local Dia Mês Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
CNPJ: 07.443.708/0001-66



TAYRONE JOSÉ GONÇALVES
CPF: 044.889.083-65



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200687457

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO GOMES DE MELO NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2614807907

Registro: 332132CE

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: 08.07.01/2020

Celebrado em: 09/09/2020

Valor: R\$ 311.479,83

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: 09/09/2020

Previsão de término: 09/02/2021

Coordenadas Geográficas: 6.251949, 39.197745

Finalidade:

Código: 44.90.51.00

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	35,68	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	9,05	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	25,74	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	19,35	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	13,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	316,80	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe/CE, 22 de *setembro* de *2020*
Local data

Pedro Gomes de Melo Neto
Eng. Civil Reg. SP nº 5069643485
PEDRO GOMES DE MELO NETO 0332432CE 0347530.063-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: , ip: 187.19.226.219

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200687457

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **22/09/2020** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8214243197**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ca.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: , ip: 187.19.226.219

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200688000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **0615727611CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro: **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 36.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA projetada

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Expedito Diógenes**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **09/09/2020**

Previsão de término: **31/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-5.885955, -38.607483**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

19 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	35,68	m3
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	9,05	m3
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	25,74	m3
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	13,61	m3
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	316,80	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaripe, 25 de setembro de 2020

Local

data

de
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **25/09/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**


Nosso Número: **8214244310**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bWb54
 Impresso em: 21/10/2020 às 16:17:02 por: moveel, ip: 187.19.224.60

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PORTARIA Nº 015/PMJ/INFRA/2020.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA**, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência do Excelentíssimo Senhor José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, Prefeito Municipal através da Portaria de nº 010, de 03/01/2013, publicada no Boletim Oficial do município na mesma data, resolve:

Art. 1º **DESIGNAR** o servidor abaixo relacionado para, com observância da legislação vigente, atuar como Fiscal do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, e a empresa: **MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**, através da **Secretaria da Cidade e Infraestrutura**, no município de Jaguaribe. Processo Nº **08.07.01/2020**, Contrato nº **08.07.01/2020**;

- a) Fiscal Titular: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**, Engenheiro Civil, **CREA-CE Nº 061572761-1**.

Art. 2º O Fiscal será responsável para supervisionar, fiscalizar e acompanhar o andamento e a execução dos serviços prestados, efetuando medições dos serviços realizados e no final da obra, firmar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a" do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.


Art. 3º O objeto do referido contrato é **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE**.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo publicada no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Jaguaribe – CE.

Jaguaribe CE, 09 de Setembro de 2020.


GERALDO TARGINO DA SILVA
Secretário da Cidade e Infraestrutura

GERALDO TARGINO DA SILVA
SECRETÁRIO DA CIDADE E
INFRAESTRUTURA
CPF: 838.103.743-72

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO				
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 05/11/2020	FOLHA: 57	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO					
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 93					MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA				BOM <input checked="" type="checkbox"/>				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>				
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>				
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
REIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm
- PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETA DA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO Nº	08.07.01/2020	ART Nº	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	06/11/2020	FOLHA:	58	LIVRO:	03	
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	92	CONDIÇÃO DO TEMPO		
	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA		MANHÃ	TARDE	NOITE		
	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm
- PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO N° 08.07.01/2020		ART N° . CE20200687457		Mês de NOVENBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 07/11/2020	FOLHA: 59	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 91				
		DIAS DA SEMANA: SABADO		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS• **PAREDES E PAINÉIS**


ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP n° 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	08/11/2020	FOLHA:	60	LIVRO:	03
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	90	CONDIÇÃO DO TEMPO	
	DIAS DA SEMANA: DOMINGO		MANHÃ	TARDE	NOITE	
	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>
INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	
CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	
S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


• SEM ATIVIDADES

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 09/11/2020	FOLHA: 61	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO				
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 89	MANHÃ				TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
REIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS• **PAREDES E PAINÉIS**


ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, COMEÇAMOS A CONSTRUÇÃO DO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng. Civil Reg. SP n° 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO Nº	08.07.01/2020	ART Nº	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	10/11/2020	FOLHA:	62	LIVRO:	03
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	88	CONDIÇÃO DO TEMPO	
	DIAS DA SEMANA:	TERÇA – FEIRA		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
REI	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


• **PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, COMEÇAMOS A CONSTRUÇÃO DO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg SP nº 5069643485 CREA/CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
	11/11/2020	63	03				
	TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 87		MANHÃ	TARDE	NOITE
	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
REIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, COMEÇAMOS A CONSTRUÇÃO DO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA)
- MOVIMENTO DE TERRA**
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	12/11/2020	FOLHA:	64	LIVRO:	03
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:		DIAS RESTANTES:		CONDIÇÃO DO TEMPO	
	150		86		MANHÃ	TARDE
	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	NOITE
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
						CHUVOSO <input type="checkbox"/>
						S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
REIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- PAREDES E PAINÉIS**

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, COMEÇAMOS A CONSTRUÇÃO DO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA)

- MOVIMENTO DE TERRA**

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**


NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO
RNP: 2614807907
Registro: 332132CE

ASS: 
Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	13/11/2020	FOLHA:	65	LIVRO:	03	CONDIÇÃO DO TEMPO
	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	85			
	DIAS DA SEMANA:	SEXTA - FEIRA					
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021			MANHÃ		TARDE	NOITE	
		BOM <input checked="" type="checkbox"/>		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>		
		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		
		CHUVOSO <input type="checkbox"/>		CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
		S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>		S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
FURTEIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, COMEÇAMOS A CONSTRUÇÃO DO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA)
- MOVIMENTO DE TERRA**
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**



CNPJ:01.816.139/0001-70.


DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		Mês de NOVEMBRO				
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 14/11/2020	FOLHA: 66	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO					
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 84					MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: SABADO		BOM <input checked="" type="checkbox"/>		BOM <input checked="" type="checkbox"/>				BOM <input type="checkbox"/>		
		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>					
		CHUVOSO <input type="checkbox"/>		CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>					
		S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>		S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>					
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS						
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO						
PREZIDENTE	03	TÉCNICO		05 PICARETES						
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA						
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO						
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG						
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS										
<ul style="list-style-type: none"> PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, COMEÇAMOS A CONSTRUÇÃO DO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA) MOVIMENTO DE TERRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 										
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO										
NADA DE ACIDENTES										
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO										
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO						
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE				NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 						

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**



CNPJ: 01.816.139/0001-70.


DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO N° 08.07.01/2020		ART N° . CE20200687457		Mês de NOVENBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
	15/11/2020	67	03				
	TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 83	MANHÃ		TARDE	NOITE
	DIAS DA SEMANA: DOMINGO		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>		
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS			
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO			
REIRO		TÉCNICO		05 PICARETES			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		03 ENVHADA			
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO			
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG			
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS							
• SEM ATIVIDADES							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO							
NADA DE ACIDENTES							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE				NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE			
ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. nº 3069043485 CREA-CE 332132CE				ASS: 			

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 16/11/2020	FOLHA: 68	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO		
	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 82				
	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEÇEIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


• **PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, CHAPISCANDO O MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS: 	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 17/11/2020	FOLHA: 69	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO				
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 81	MANHÃ				TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PEDEIREIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, CHAPISCANDO O MURO CONTO RNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil, Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 18/11/2020	FOLHA: 70	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO				
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 80	MANHÃ				TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PEDEIREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- PAREDES E PAINÉIS**



ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO NO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA)


- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO Nº	08.07.01/2020	ART Nº	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	19/11/2020	FOLHA:	71	CONDIÇÃO DO TEMPO		
	LIVRO:			03			
	TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	150	DIAS RESTANTES:	79	MANHÃ	TARDE
	DIAS DA SEMANA:	QUINTA – FEIRA			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- **PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO NO O MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA)
- **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 20/11/2020	FOLHA: 72	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO			
	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 78					
	TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA - FEIRA		MANHÃ	TARDE	NOITE	
BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>		
INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>		
CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>		
S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
ALFARFEIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO NO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA)
- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CE	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO N° 08.07.01/2020		ART N° . CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
	21/11/2020	73	03				
	TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 77		MANHÃ	TARDE	NOITE
	DIAS DA SEMANA: SABADO			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
REIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L
PINTOR	02			



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


PINTURA DE DUAS DE MÃOS DE SURPER CAL COR.BRANCA NO MURO DA LAVANDERIA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA-CE 332132CF	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70	CONTRATO N°	08.07.01/2020	ART N°	CE20200687457	Mês de	NOVEMBRO		
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 22/11/2020	FOLHA: 74	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO				
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 76	MANHÃ				TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: DOMINGO	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

• SEM ATIVIDADES


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


--

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: PEDRO GOMES DE MELO NETO
RNP: 2614807907
Registro: 332132CE
ASS: 
Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP n° 5069643485
CREA-CE 332132CE

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE
ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000,

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº CE20200687457		Mês de NOVEMBRO				
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 23/11/2020	FOLHA: 75	LIVRO: 03	CONDIÇÃO DO TEMPO					
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 150	DIAS RESTANTES: 75					MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DA SEMANA: SEGUNDA - FEIRA			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>				BOM <input type="checkbox"/>		
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>					
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>					
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>					

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	03	ENGENHEIRO RESIDENTE	01	06 CARROS DE MAO
PREZIDENTE	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	01	03 ENVHADA
ARMADOR	01	ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L
PINTOR	01			



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **PAREDES E PAINÉIS**
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO NO MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA) E PINTURA DE DUAS DE MÃOS DE SURPER CAL COR.BRANCA
- **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
- **REVESTIMENTO DE PAREDES**
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR ESP.= 5mm NAS PAREDES DOS QUATOS EXTERNO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>PEDRO GOMES DE MELO NETO</u> RNP: 2614807907 Registro: 332132CE ASS:  Pedro Gomes de Melo Neto Eng Civil Reg. SP nº 5069643485 CREA/CE 332132CE	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 



Pedro Gomes de Melo Neto
Eng. Civil Reg. SP n° 5069643485
CREA-CE 332132CE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

DIARIO Nº 003/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 2ª MEDIÇÃO -**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA


CONTRATO N.º 08.07.01/2020

ART. N.º CE20200687457

CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL.



FOTO 1 – PLACA DA OBRA


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP n.º 5069643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

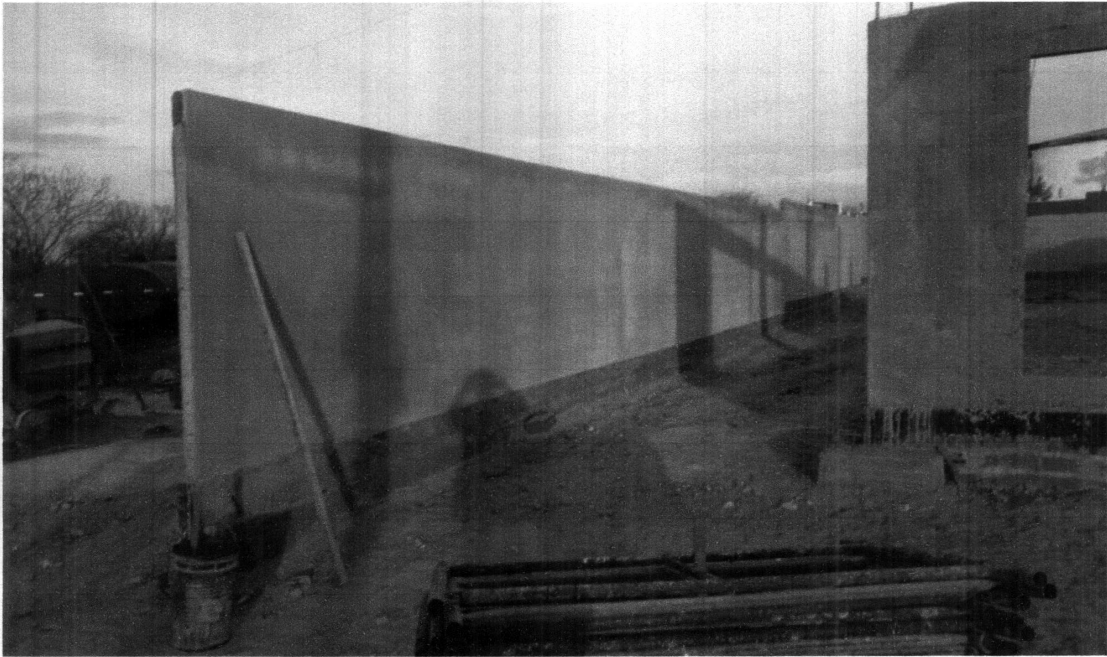


FOTO - 02

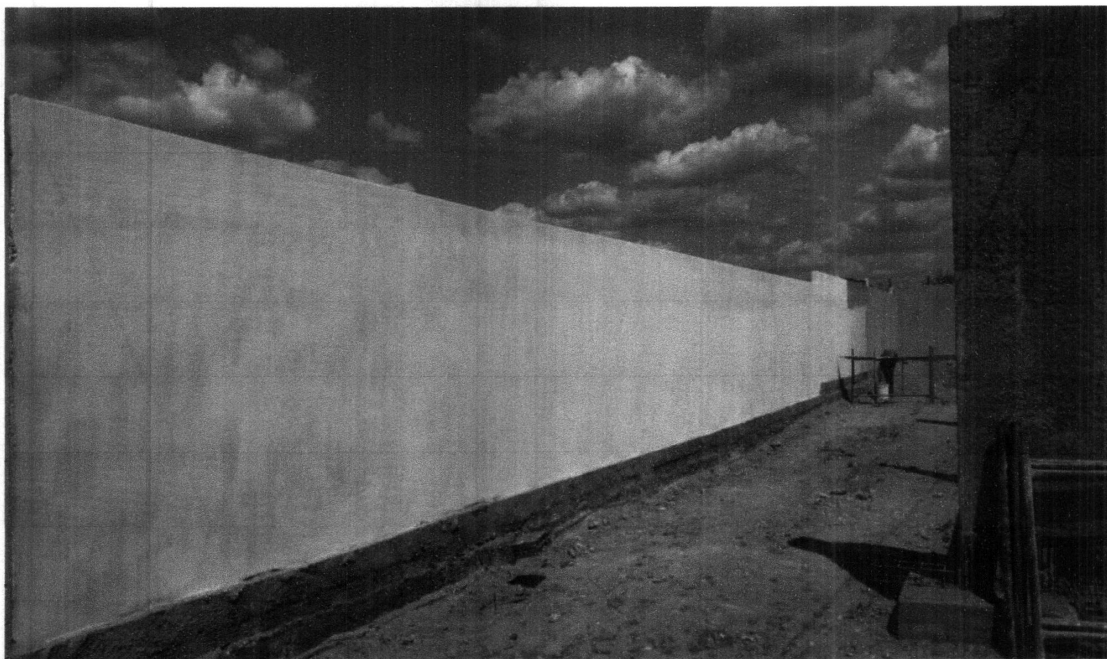


FOTO - 03


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP n° 5069643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572751-1

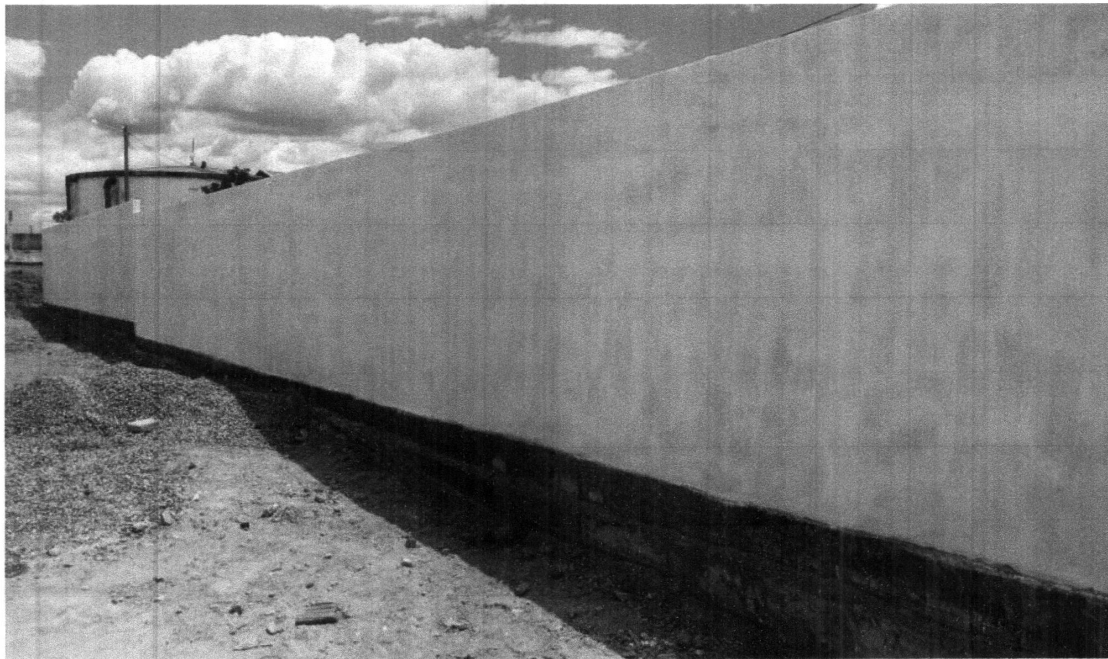


FOTO 04 -

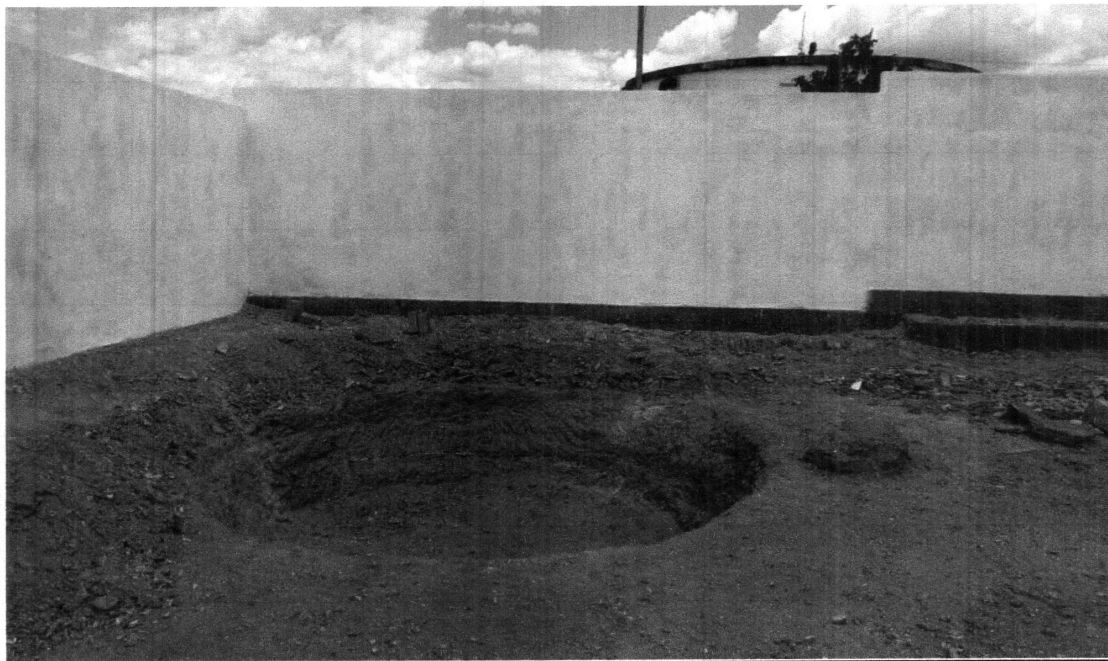


FOTO 05 -


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP n° 5069643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1

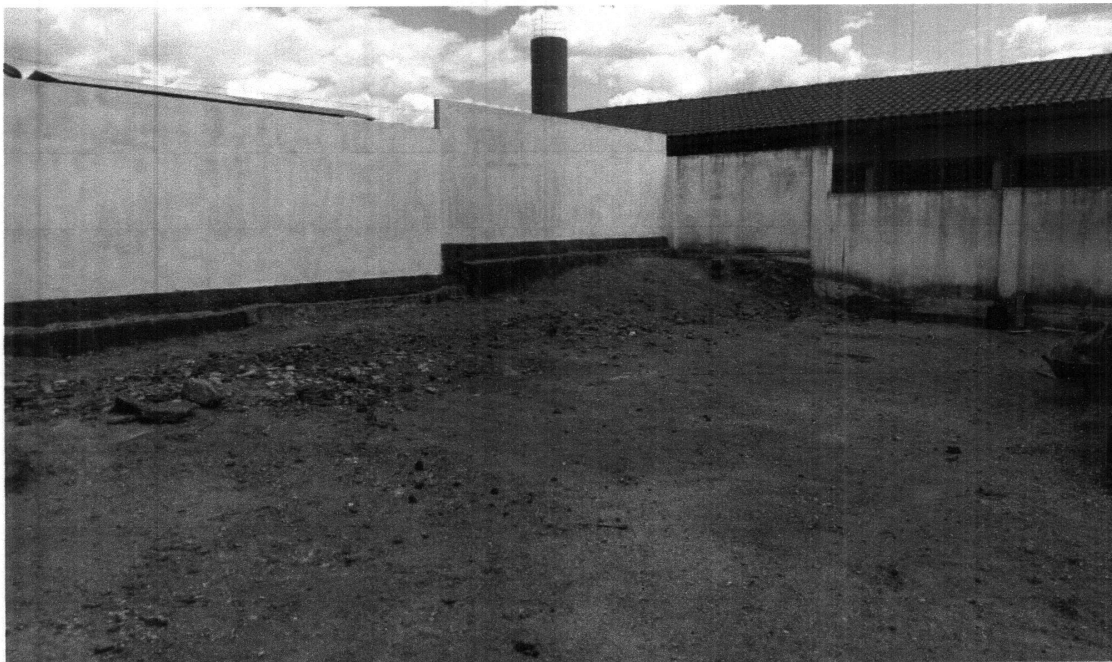


FOTO 06 -



FOTO 07 -


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572791-1

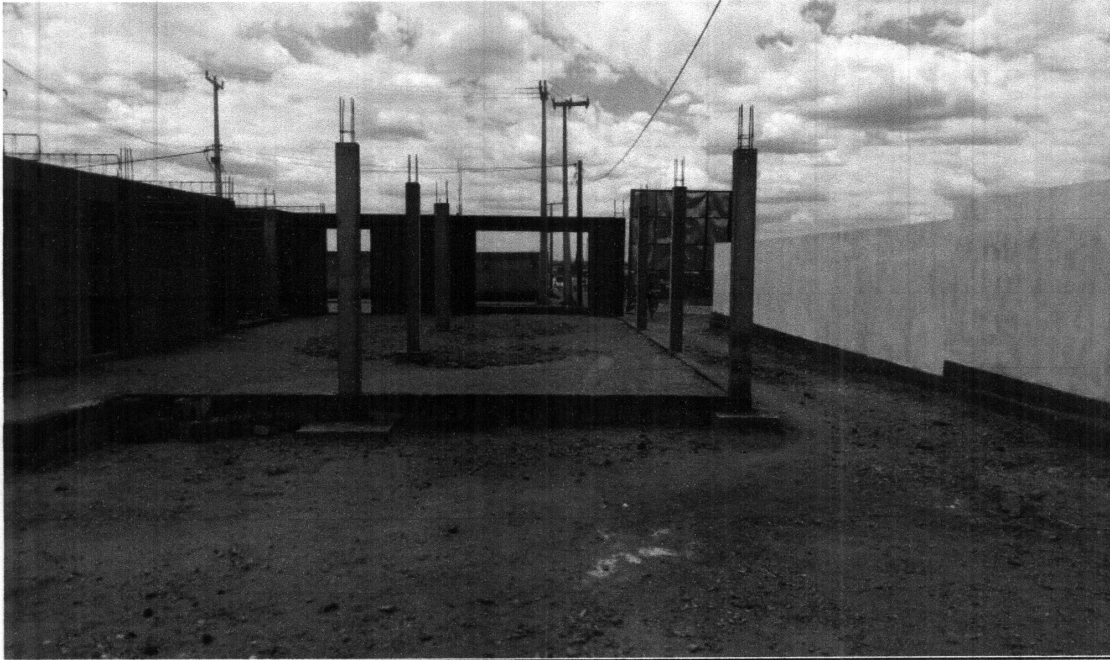



FOTO 08 -



FOTO 09 -


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572781-1



FOTO 10-



FOTO 11-


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 091572761-1

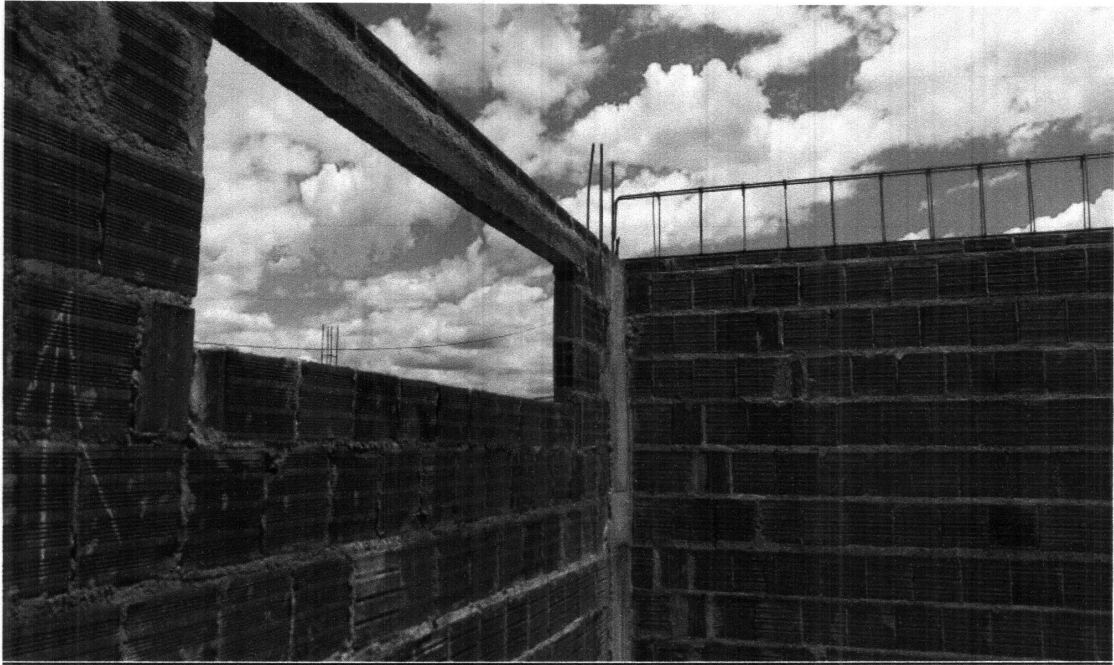


FOTO 12 -



FOTO 13 -


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CF


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 091572761-1

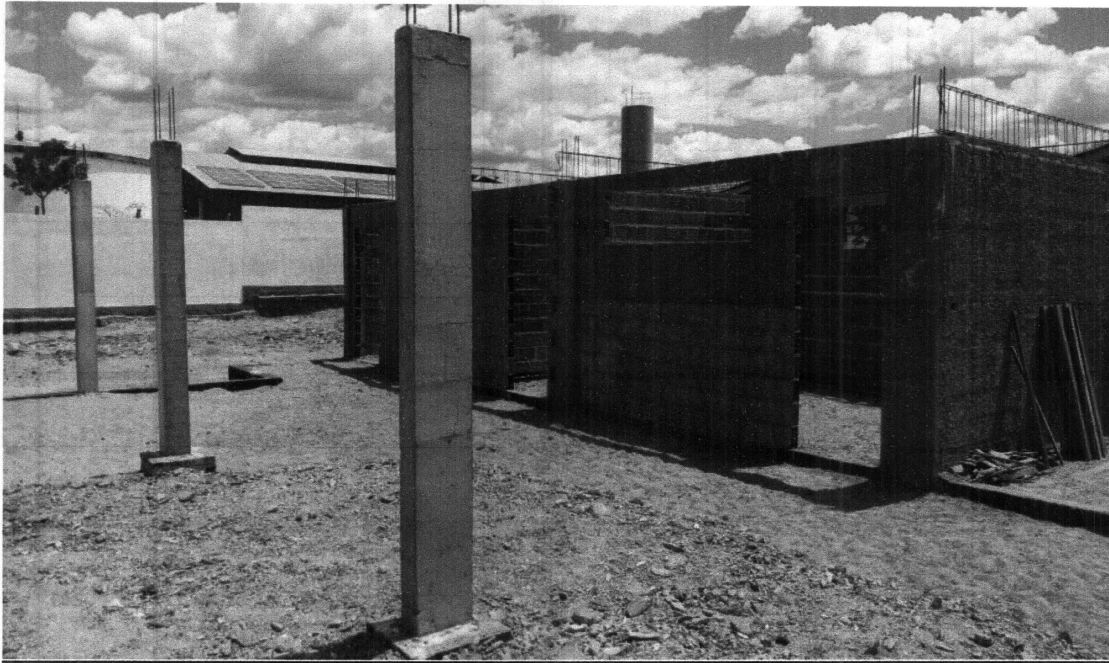


FOTO 14 -

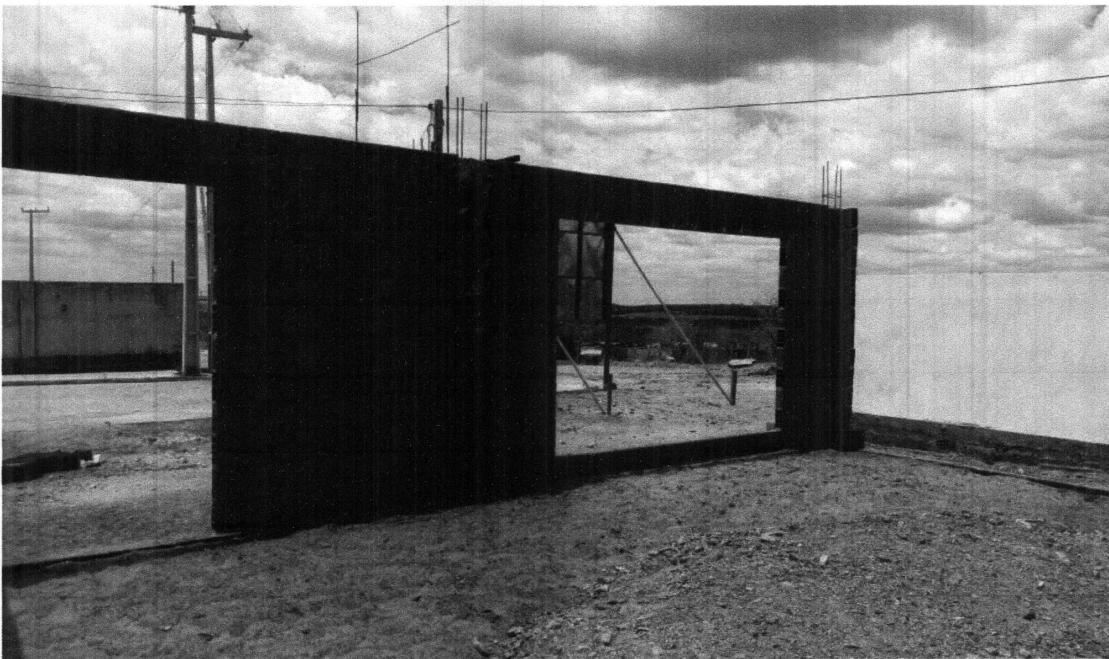


FOTO 15 -


Pedro Gomes de Mero Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CF


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1

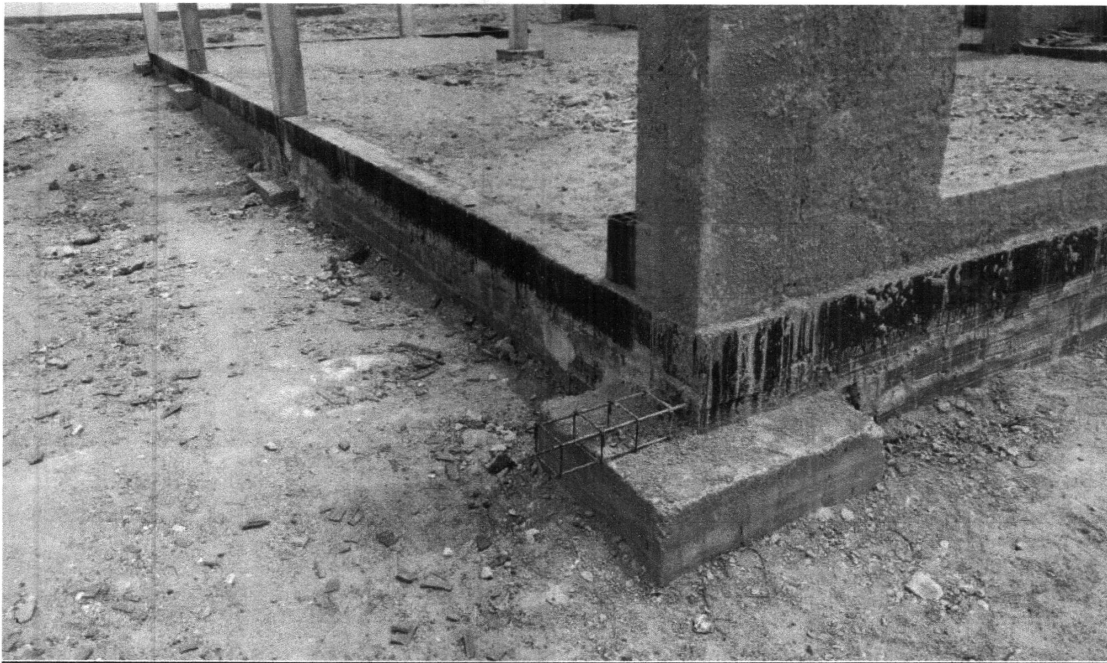



FOTO 16 -



FOTO 17 -


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP n° 5069643485
CREA-CE 332132CE

Absoion Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 091572761-1

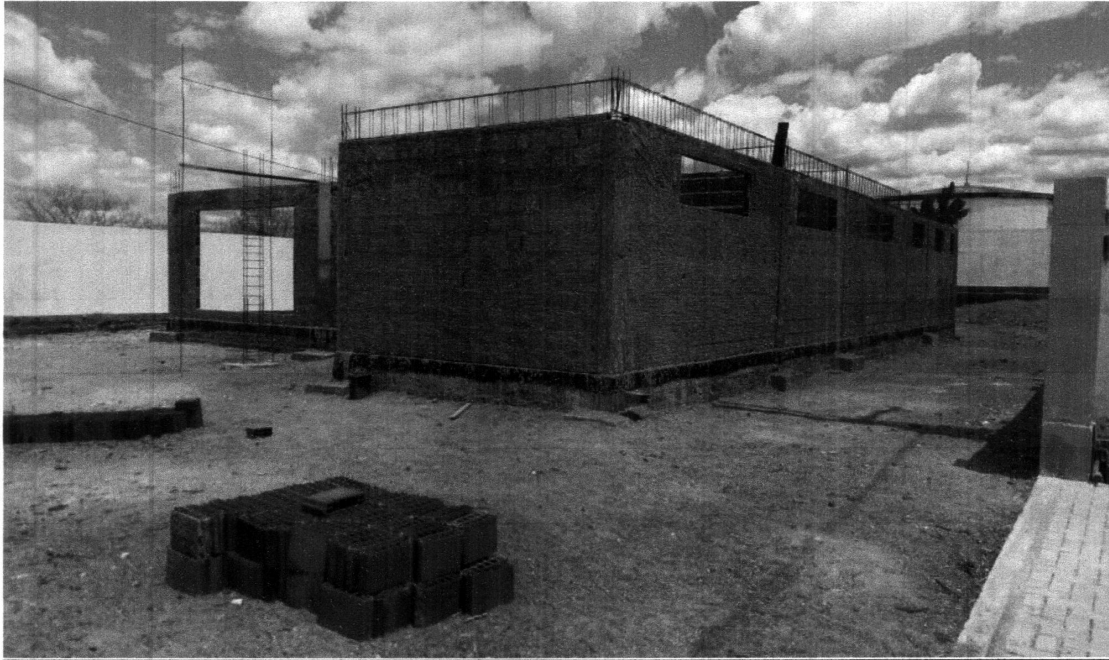



FOTO 18 -



FOTO 19 -


Pedro Gomes de Melo Neto
Eng Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572781-1
